

# FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

## 1. DATOS GENERALES

**A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:** Patricia Elizabeth Prieto Rivera

**B. CARGO:** secretario (a) de despacho de infraestructura

**C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL):** Alcaldía Municipal de Sopó

**D. CIUDAD Y FECHA:** Sopó, Cundinamarca – 31 de diciembre de 2023

**E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:** enero 01 de 2020

**F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:** Presentación informe de gestión vigencia 2020-2023 cierre de gobierno exitoso.

## 2. RESPUESTAS AL DNP Y DAFP

### 2.1. ¿Cuáles fueron los 10 principales resultados de desarrollo de dependencia?

La secretaria de Infraestructura obtuvo valiosos resultados para la comunidad y se destacan los siguientes:

Elaboración de Estudios y Diseños, consecución de recursos para su construcción en la Nación, Departamento o Municipio, contratación de ejecutores de obras y puesta al servicio de las siguientes infraestructuras:

- Nuevo Colegio Pablo VI
- Pista de Patinaje
- Skate Park
- Construcción del campo de voleibol playa en el Complejo de la Trinidad
- Adecuación del lago del Complejo de la Trinidad
- Remodelación de los dos parques infantiles en el complejo de la Trinidad
- Remodelación de campo de tenis en el complejo de la Trinidad
- Adecuación de las canchas múltiples de la Trinidad
- Cubierta de Meusa
- Cubierta y zona recreativa de Briceño
- Casa de la Mujer
- Construcción de zona recreativa y deportiva en Jardín del Norte
- Construcción de zona recreativa del Chuscal
- Barreras de protección en zonas riesgo vial
- Construcción del Salón Comunal los Andes
- Construcción del Salón comunal Montana
- Ciclo Ruta Sopó Briceño
- Placa Huella Piedra Herrada
- Vía en los manzanos
- Vía de Pueblo Viejo

- Mantenimiento de infraestructuras educativas, deportivas, sociales, culturales, comunales, institucionales.
- Estudios y diseños de la pista de atletismo, Bilbao planetario, Unidad de Atención Integral UAI, parque de los niños, complejo acuático, jardín social, cubierta san Agustín, Gratamira, Pueblo viejo, Carolina alta y Mercenario.

Ante la problemática por el rezago en la construcción y mantenimiento de la malla vial urbana y rural del municipio, desde la secretaría de infraestructura se implementaron las siguientes estrategias.

- Consolidar un grupo humano del área operativa y de maquinaria virtuoso, conocedor de las necesidades, conocedor de los procesos constructivos y de operación de maquinaria para resolver problemáticas infraestructurales de la comunidad Soposeña.
- Consolidación y construcción del espacio físico de Bodega y parqueadero de maquinaria de la secretaría de Infraestructura
- Compra y Adquisición de maquinaria amarilla se dotó al municipio de (1) una motoniveladora, (1) un vibro compactador de 5 toneladas para mantenimientos de vías rurales y (1) un vibro compactador de 3 toneladas para bacheo y/o construcción de vías.
- Dotación de equipos y herramientas al grupo operativo y de maquinaria para ejecutar las diferentes actividades requeridas en la infraestructura vertical y vial.
- Convenio con Asocentro con los aportes correspondientes y adicionando una cuota adicional por parte del municipio de Sopó a través del cual se realizó suministro de mezcla asfáltica, construcción de tramos viales, bacheo y mantenimiento con maquinaria de su propiedad de las vías rurales en superficie suelta.

A través de toda la infraestructura construida, mantenida o mejorada durante el periodo 2020-2023 se proveen de espacios que permiten a sus usuarios el desarrollo y consolidación de aptitudes, habilidades y actitudes en los sectores educativo, deportivo, social, cultural, comunal e institucional, entre otros que potencializan el desarrollo humano de nuestra comunidad.

**2.2. Mencione los 5 proyectos más estratégicos sobre los cuales el secretario (a) entrante debería hacer énfasis importante en su culminación para garantizar la continuidad de las grandes inversiones que se realizaron**

Terminar con la implementación de los Estudios y Diseños, consecución de recursos en la Nación, Departamento o Municipio para su construcción, contratación de ejecutores de las siguientes obras que están en desarrollo:



1. Pista de Atletismo
2. BOWL del skate Park fase 2.
3. Andenes del costado Oriental de la Cra 4
4. Ciclo ruta y senderos peatonales.
5. Entrega de subestación eléctrica en el Centro Integral Cultural C.I.C a ENEL.

**2.3. ¿Cuáles son los 10 principales retos en materia de desarrollo que le quedan al nuevo secretario (a) de despacho?**

Continuar las acciones que permitan la consecución de recursos para luego ejecutar los estudios y Diseños de otras infraestructuras que son requeridas por la comunidad Soposeña, cada una de estas infraestructuras fueron diseñadas en predios de propiedad del Municipio de Sopó, es decir, se tienen dos grandes avances el primero contar con los terrenos y el segundo con los respectivos estudios y diseño, estas son:

- Biblio Planetario
- Unidad de Atención Integral UAI
- Parque Ciudad de los niños
- Complejo Acuático
- Jardín social
- Casa de la Justicia
- Cubierta y campo deportivo San Agustín
- Cubierta y campo deportivo Gratamira
- Cubierta y campo deportivo Carolina Alta
- Cubierta y campo deportivo Pueblo Viejo
- Cubierta y campo deportivo Carolina Alta
- Vía del Sector Gómez
- Vía del Sector Coflexpo
- Vía Longitudinal
- Ejecutar los recursos que por cesión se han gestionado con la empresa San Lorenzo para invertirlos en las vías

**2.4. ¿Quiénes fueron los principales aliados públicos, privados o ciudadanos para lograr los resultados?**

Los principales aliados fueron múltiples los actores que aportaron para alcanzar estos resultados dentro de los que se destacan:

- El grupo formulador de proyectos de LA Oficina Asesora de Planeación Estratégica
- El grupo profesional de la secretaría de Infraestructura del Municipio de Sopó

- El grupo operativo y de maquinaria de la secretaría de Infraestructura "La cuadrilla de la gente"
- El Instituto de Construcción y Concesiones del Departamento de Cundinamarca ICCU
- La secretaria de Educación de la Gobernación de Cundinamarca
- La secretaria de Deporte de Cundinamarca
- El ministerio del Deporte
- El ministerio de Cultura
- Las Juntas de Acción Comunal
- La comunidad en general

**2.5. Describa las 5 recomendaciones más importantes para el Gobierno Nacional para mejorar el apoyo a las iniciativas de desarrollo del territorio**

- Se requiere mucho más conocimiento de los funcionarios del gobierno nacional sobre los territorios y de las necesidades de los territorios por parte del gobierno nacional, funcionarios del orden nacional más cerca de los entes territoriales.
- Previo a haber definido el predio de propiedad del ente territorial para ejecución de la obra y a haber realizado los estudios y diseños se inicia el proceso de viabilización del proyecto para la consecución de recursos en la nación es una acción que toma demasiado tiempo y que imposibilita la ejecución de las obras dentro del periodo constitucional del cuatrienio del alcalde; se deben revisar estos procesos.
- La implementación de los pliegos tipo, herramienta concebida y elaborada por el gobierno nacional, desconoce, entre otras muchas cosas, la disponibilidad de un recurso humano evaluador con el que no cuentan los entes territoriales, además, que la aplicación de esta metodología no garantiza la escogencia de un ejecutor experimentado que además de ejecutar una obra con calidad cuente con los recursos para ejecutarla en los plazos previstos por la entidad.
- Se deben proveer recursos para ejecutar los estudios y diseños que se dejaron con lo cual se logrará dinamizar la economía a través de proveedores de diferentes servicios provenientes del fortalecimiento del sector cultural, deportivo, turístico, comunal que pasó también por la disponibilidad de recursos para construcción y fortalecimiento de la malla vial del municipio y mejorar la movilidad.
- Las obras que se ejecutaron se encuentran en periodo de garantías, se debe realizar periódicamente los mantenimientos que requiere cada contrato (mantenimiento de bombas, pisos, pintura, etc.) para no perder el amparo de las garantías.
- Se requiere un conductor para la operación de los vibro-compactadores
- Se debe realizar periódicamente mantenimiento a la motoniveladora.

**3. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN**

**AÑO 2020**

- 1. Meta de producto:** Ejecutar el 100% de la nueva infraestructura del colegio Pablo VI garantizando una adecuada operación en el servicio educativo

**Descripción:**

Descripción de la meta de producto	Meta de la Vigencia	Avance 2020	Meta	% de Avance
Ejecutar el 100% de la nueva infraestructura del colegio Pablo VI garantizando una adecuada operación en el servicio educativo	31%	31%		31%





Para esta vigencia se gestionó con la Gobernación, una adición por valor de \$1.500.000.000 para obra y con recursos propios por valor de \$105.000.000 para la interventoría, con el fin de avanzar en la terminación de la infraestructura del colegio Pablo VI.

Se elaboró diseño y presupuesto del espacio público y deportivo del nuevo colegio Pablo VI.

Se han implementado determinaciones técnicas en las instalaciones educativas del nuevo colegio Pablo VI.

Se ha tramitado ante el concejo Municipal en tres oportunidades el proyecto de Acuerdo que nos permita una operación de crédito para conseguir los recursos para terminar la infraestructura educativa y se adelantan gestiones en la Gobernación de Cundinamarca para cofinanciar recursos para las zonas recreo deportivas.

➤ **Registro Fotográfico**

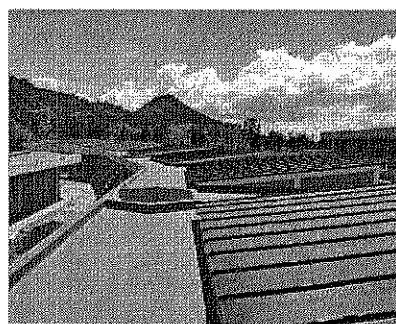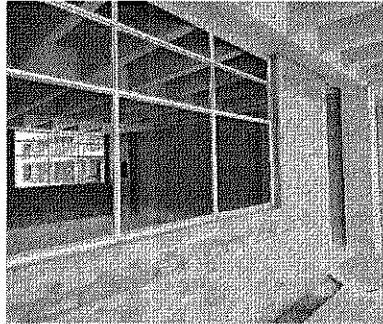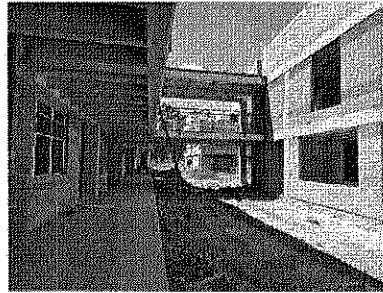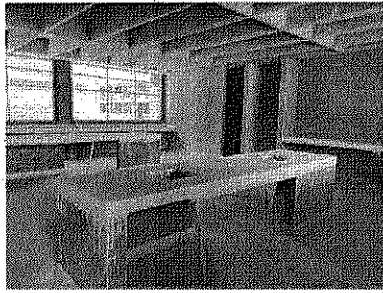

**AÑO 2021**



**1. Meta de producto:** Ejecutar el 100% de la nueva infraestructura del colegio Pablo VI garantizando una adecuada operación en el servicio educativo.

**Descripción:** Dentro de la vigencia 2021 se realizó una adición al contrato de obra L-2021-0383 por un valor de \$3.215.977.342,00 y al contrato de interventoría L-2021-0384 por un valor de \$225.114.454,00 con el fin de ejecutar al 100% los bloques existentes y dejarlos funcionales para el servicio de la comunidad. Los recursos invertidos en esta adición provienen del empréstito realizado en la presente vigencia. El día 27 de diciembre de 2021 se finalizan al 100% las obras de la fase 1 del Colegio Pablo VI.

El 26 de agosto de 2021 se suscribió el convenio No. ICCU 246 de 2021 entre el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU y el municipio de Sopó, cuyo objeto es "ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL

PRIMERA ETAPA – CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANISMO EN LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PABLO VI EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA” por un valor de \$4.675.000.000. Con estos recursos, sumados a \$2.868.804.427,00 de recursos propios del municipio provenientes del empréstito realizado en la presente vigencia, se contrataron la obra (L-2021-0561) e interventoría (CM-2021-0562) para ejecutar las obras de la fase 2 del Colegio Pablo VI, que además de las obras complementarias de urbanismo, incluye la construcción del bloque de bachillerato A1. Se suscribió acta de inicio el 20 de diciembre de 2021.

- **Registro Fotográfico**

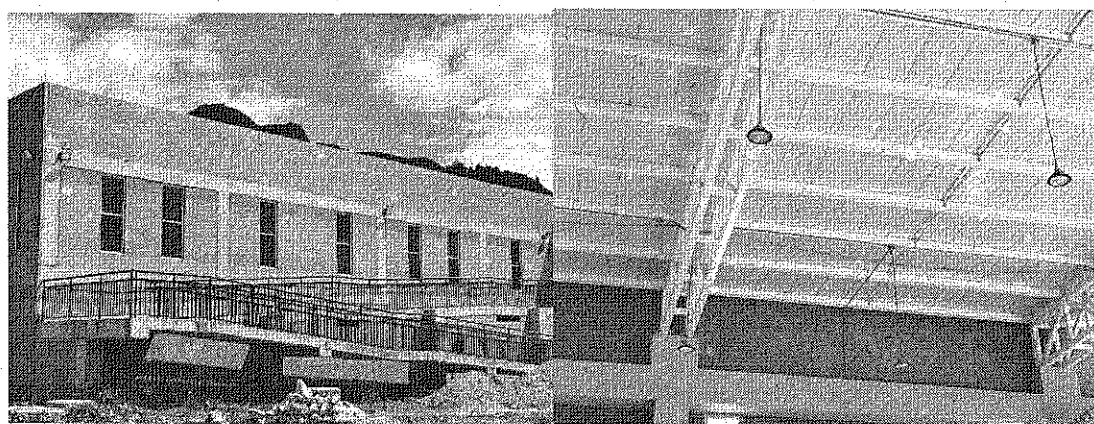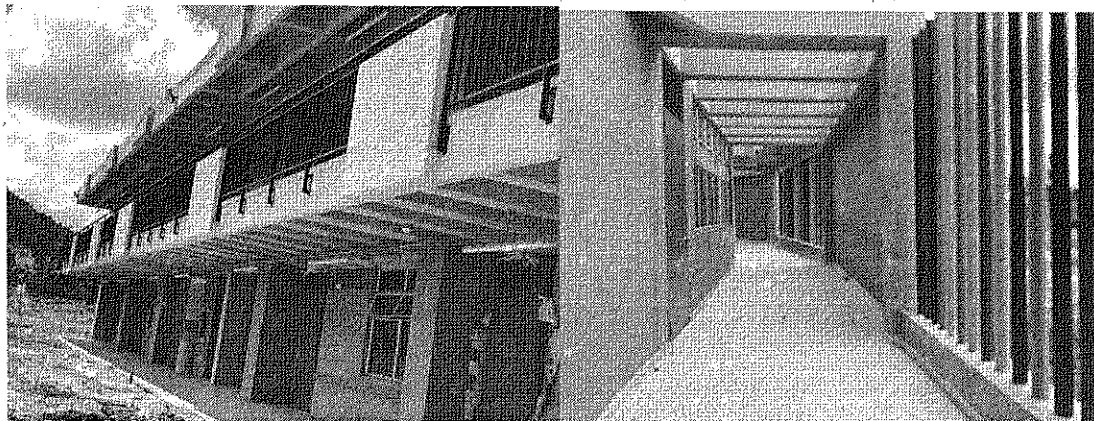

## AÑO 2022

**1. Meta de producto:** Ejecutar el 100% de la nueva infraestructura del colegio Pablo VI garantizando una adecuada operación en el servicio educativo

### Descripción:



Descripción de la meta de producto	Meta de la Vigencia	Avance Meta 2022
Ejecutar el 100% de la nueva infraestructura del colegio Pablo VI garantizando una adecuada operación en el servicio educativo	92%	92%

En la vigencia 2022 se vienen adelantando las obras correspondientes a la construcción de la fase II del proyecto de construcción de la nueva sede del Colegio Pablo VI. El proyecto, que contempla la construcción del bloque A1 (14 aulas de bachillerato), mini canchas de preescolar y otra en primaria, zonas de recreación en piso caucho en preescolar y primaria, cancha sintética y cancha de fútbol, obras complementarias de urbanismo, como zonas duras, plazoletas, plazoleta de formación con tarima, dos canchas múltiples, senderos peatonales para la circulación de acceso y salida, vía de acceso y parqueaderos; alcanzando una ejecución a la fecha cercana al 70%. De tal manera, el avance global de la meta incluyendo la fase 1 y la fase 2 alcanza un 92%.


Por otro lado, la administración municipal se encuentra gestionando un nuevo convenio con la gobernación de Cundinamarca a través del ICCU, para la construcción de la portería de acceso, shut te basuras, iluminación de zonas exteriores y acabados finales del bloque A1. El valor de estas obras se estima en \$2.152.000.000,00.

Contractualmente, el plazo de ejecución del contrato de obra para la construcción finaliza el próximo 16 de enero de 2023; sin embargo, esta fecha se encuentra sujeta a la suscripción del convenio gestionado con la Gobernación de Cundinamarca.

- **Registro Fotográfico**

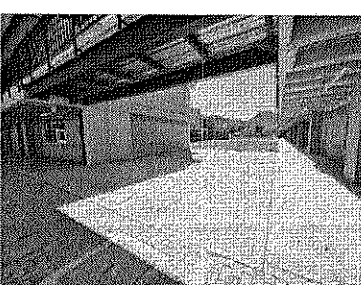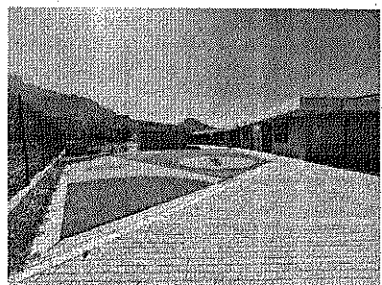



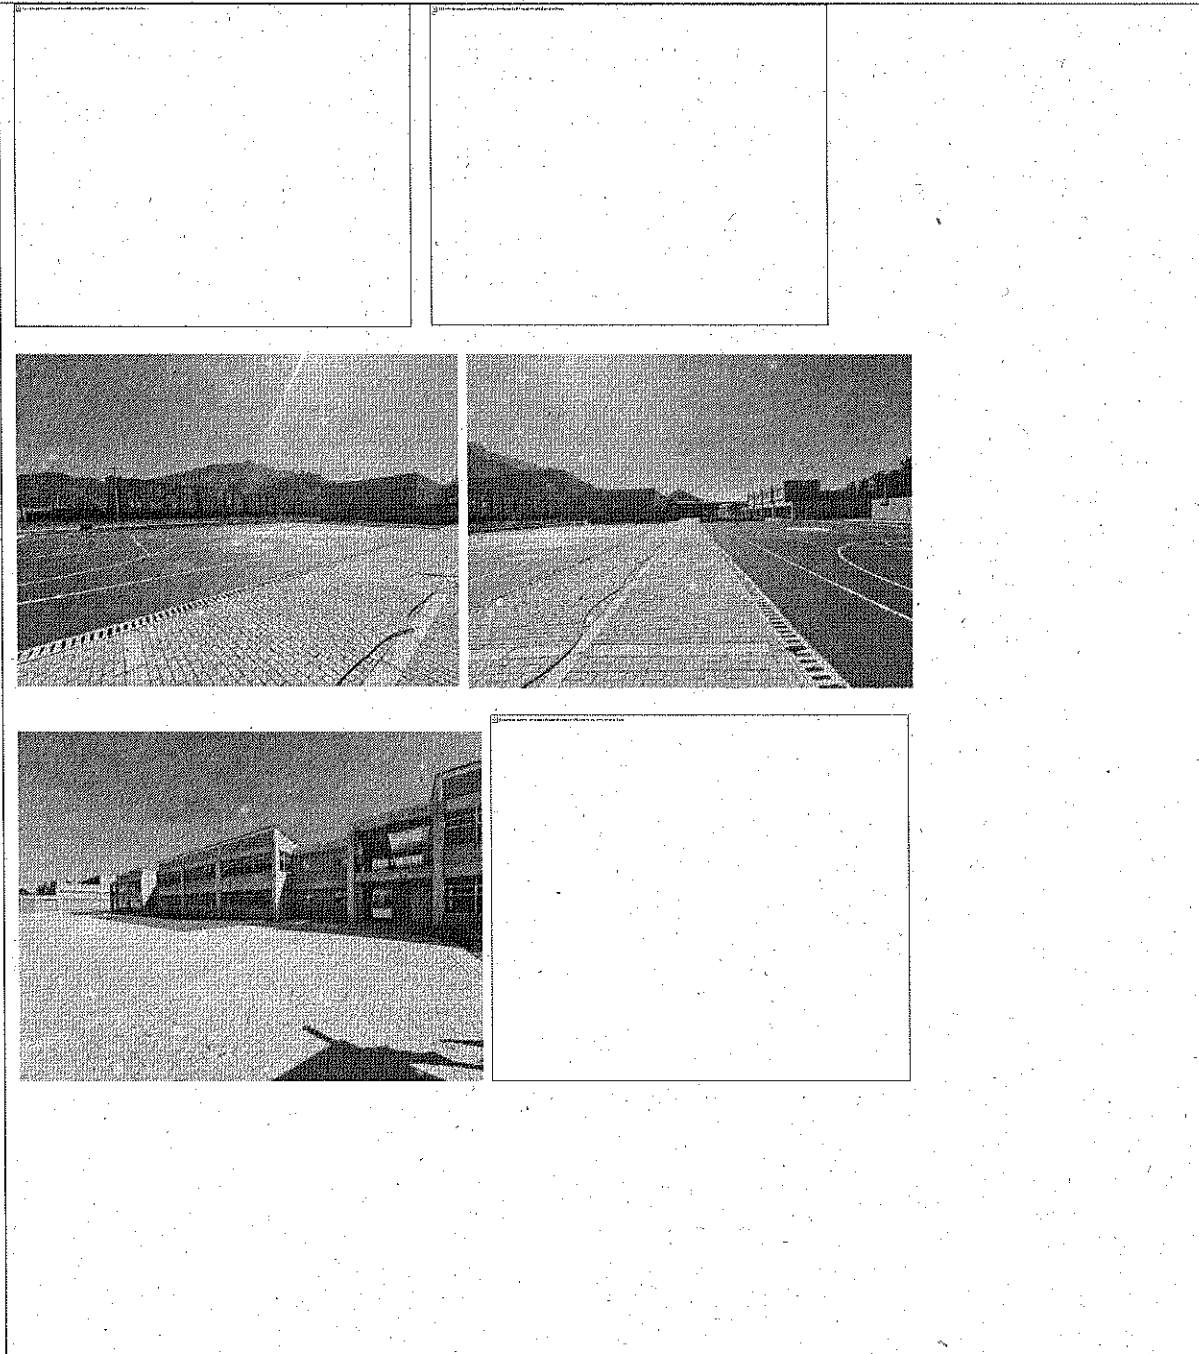

**AÑO 2023**


**1. Meta de producto:** Ejecutar el 100% de la nueva infraestructura del colegio Pablo VI garantizando una adecuada operación en el servicio educativo

**Descripción:** En la vigencia 2021 se finalizó la ejecución de la fase I de la nueva sede del Colegio Pablo VI, contempló la construcción de los bloques A2 (14 aulas de bachillerato), B (8 aulas de primaria), C (7 aulas de preescolar, restaurante, comedor, área administrativa), D (7 laboratorios), E (Biblioteca y área administrativa), F (Restaurante, comedor, auditorio, áreas accesorios), cuarto de subestación eléctrica, subestación de bombeo de agua potable, tanque de agua lluvia y re bombeo, cuarto de bombas.



En la vigencia 2022 se vienen adelantando las obras correspondientes a la construcción de la fase II del proyecto de construcción de la nueva sede del Colegio Pablo VI. Mediante la suscripción de contrato de obra No. L-2021-0561 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL COLEGIO PABLO VI, FASE II, EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 246 de 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y EL ICCU” EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO “SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023” y el contrato de interventoría No. CM-2021-0562 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL COLEGIO PABLO VI, FASE II, EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 246 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y EL ICCU, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO “SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO”. En la ejecución se realizan actividades como; construcción del bloque A1 (14 aulas de bachillerato), mini canchas de preescolar y otra en primaria, zonas de recreación en piso caucho en preescolar y primaria, cancha sintética y cancha de fútbol, obras complementarias de urbanismo, como zonas duras, plazoletas, plazoleta de formación con tarima, dos canchas múltiples, senderos peatonales para la circulación de acceso y salida, vía de acceso y parqueaderos; alcanzando una ejecución a la fecha cercana al 70%. De tal manera, el avance global de la meta incluyendo la fase 1 y la fase 2 hasta el mes de noviembre de 2023 alcanza un 100% de avance de obra.

- **Registro Fotográfico**

Colegio Pablo VI

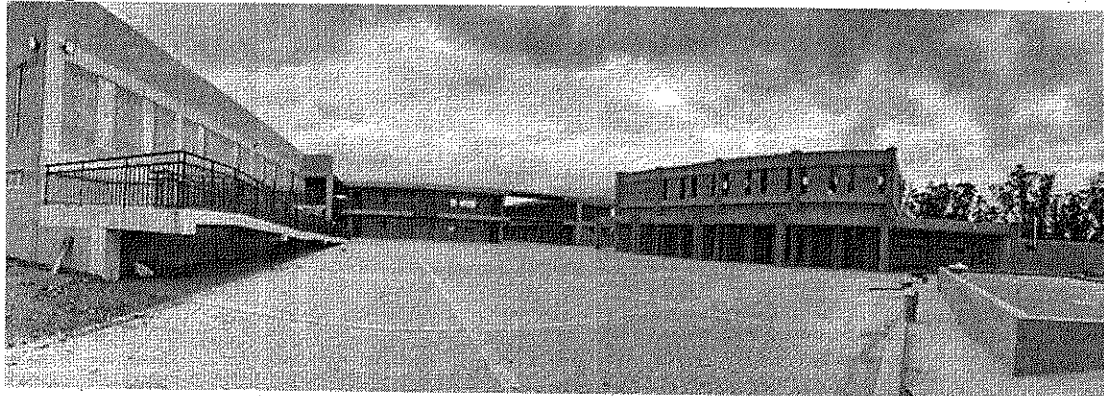



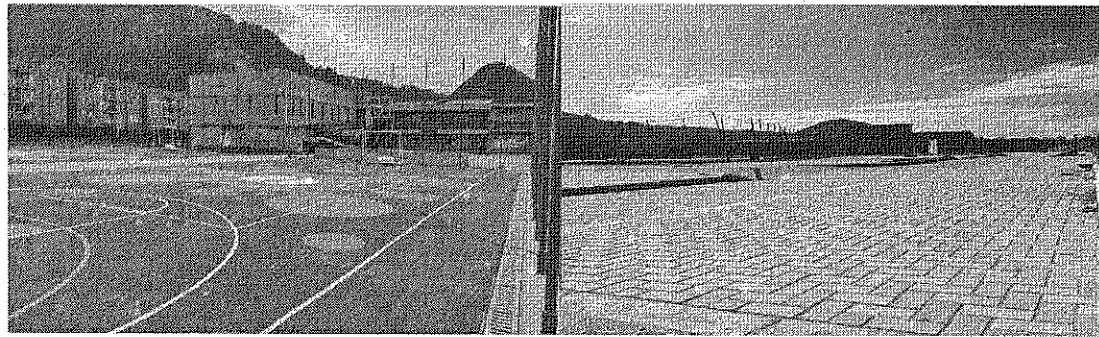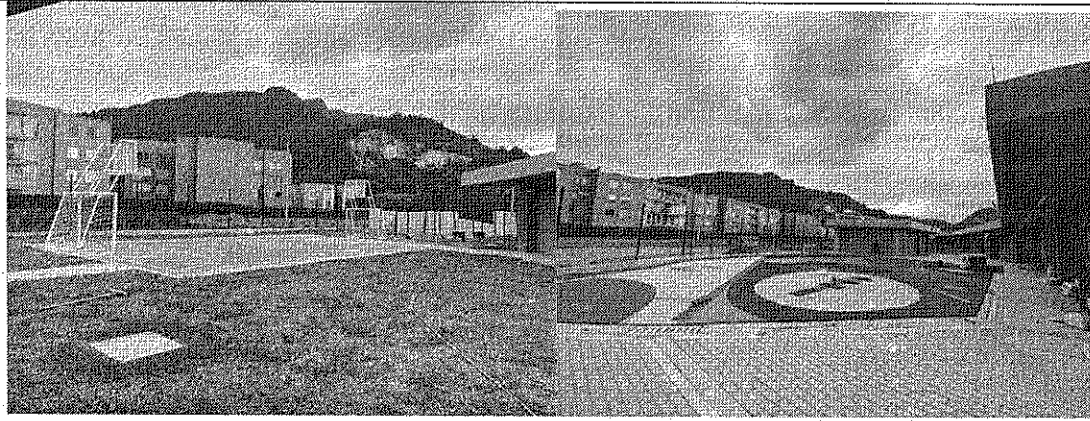

## AÑO 2020

- 2. Meta de producto:** Modernizar y/o adecuar en un 50% la Infraestructura existente del complejo deportivo La Trinidad, articulando los espacios por medio de una integración paisajística y generando su reactivación deportiva

### Descripción:

Descripción de la meta de producto	Meta de la Vigencia	Avance Meta 2020	% de Avance
Modernizar y/o adecuar en un 50% la Infraestructura existente del complejo deportivo La Trinidad, articulando los espacios por medio de una integración paisajística y generando su reactivación deportiva	43%	43%	43%

En la actualidad se realiza un análisis arquitectónico de las infraestructuras existentes y propuestas articulando urbanísticamente el Complejo de la Trinidad para dinamizar no solo las disciplinas culturales y deportivas sino complementarlo con emprendimientos que promuevan la económica local.

Adicionalmente, se ha realizado el proceso de contratación para diseñar Pista de Patinaje, Skate Park, Pista de Atletismo, Centro Acuático quienes deben acoger las recomendaciones arquitectónicas de articulación de las infraestructuras ubicadas en el complejo de la Trinidad.

Por otra parte, se realizó adecuación de la infraestructura del Centro de Eventos el cual se encontraba subutilizada.


También se realizó la limpieza del lago y se contrató el cerramiento del mismo; se estructuró la contratación para la ampliación del campo de vóley playa.

Se firmó convenio con el ministerio del Deporte para la construcción de la primera fase el patinódromo.

Se firmó convenio con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU para la construcción del SKATE PARK

### ➤ Registro Fotográfico

## Adecuación de la infraestructura del Centro de Eventos

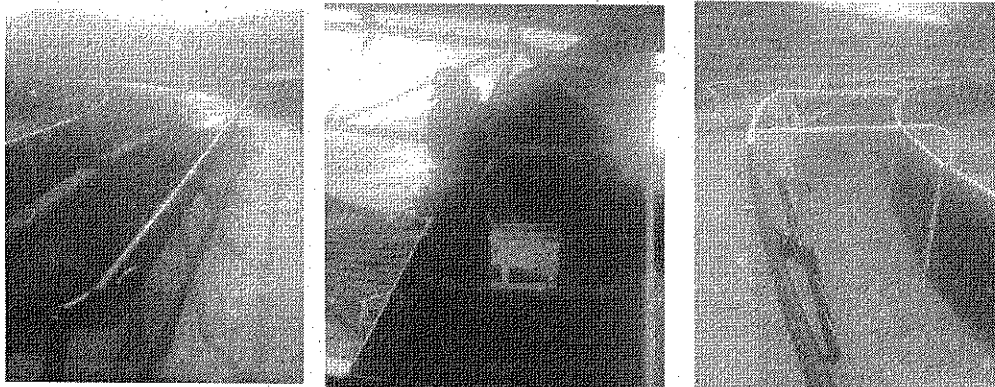

## Mantenimiento y limpieza del lago




### AÑO 2021

**2. Meta de producto:** Modernizar y/o adecuar en un 50% la Infraestructura existente del complejo deportivo La Trinidad, articulando los espacios por medio de una integración paisajística y generando su reactivación deportiva

#### Descripción:

Se adicionó el contrato de consultoría CM-2020-0550 y el contrato de interventoría CM-2020-0557; una de las razones de adicionar el contrato fue incluir el diseño urbanístico y paisajístico del parque La Trinidad para integrar y organizar la movilidad y conexión entre todos los escenarios deportivos que componen el complejo. Adicionalmente, se incluyó el diseño eléctrico general del complejo, que permitirá integrar a una sola acometida y una sola cuenta las conexiones eléctricas de todos los escenarios existentes y los que se proyectan construir, como lo son la pista de atletismo, el complejo acuático, la UAI, el biblio planetario; además de las obras que se encuentran en ejecución como el patinódromo y el skate park, todo ello tendiente a la modernización de la Trinidad.

- **Registro Fotográfico**

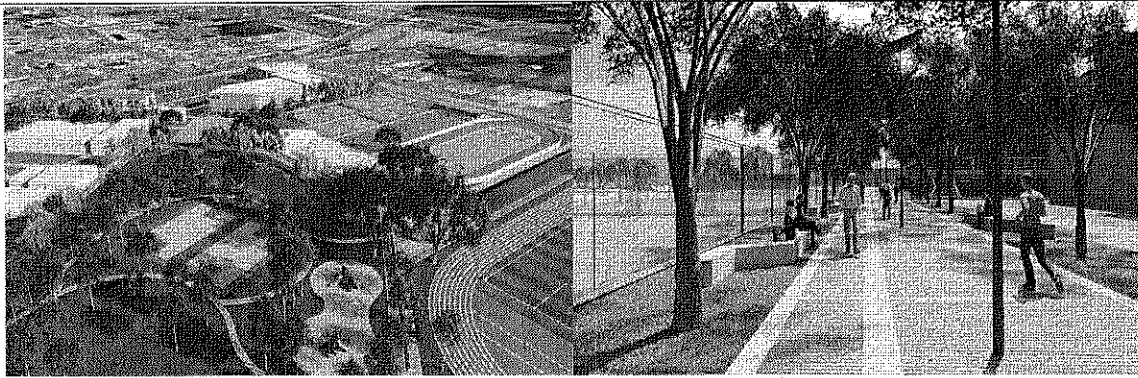

## AÑO 2020

**3. Meta de producto:** Construir y adecuar en 4 sectores rurales espacios recreo deportivos

### Descripción:

Descripción de la meta de producto	Meta de la Vigencia	Avance Meta 2020	% de Avance
Construir y adecuar en 4 sectores rurales espacios recreo deportivos	10%	10%	10%

Se tuvo que declarar desierta la consultoría para la elaboración de estudios y diseños a nivel de detalle de construcción placa para cancha múltiple, una gradería y cubierta para polideportivos de Meusa, Centro Alto, Mercenario, Carolina Alta y Gratamira, sin embargo hemos dejado estructurado el proceso para ser adelantada en enero la selección del consultor y se viabilizó proyecto de cubierta de Meusa ante INDEPORTES como resultado de ello se firmó convenio con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU para la construcción de la cubierta de Meusa.

## AÑO 2021

**3. Meta de producto:** Construir y adecuar en 4 sectores rurales espacios recreo deportivos

### Descripción:

Mediante el contrato CM-2021-0344 se realizaron los estudios y diseños a nivel de detalle para la construcción placa para cancha múltiple, una gradería y cubierta para polideportivos de Briceño, Carolina Alta, Pueblo Viejo, Mercenario, Gratamira, y San Agustín en el municipio de Sopó, el contrato se encuentra en etapa de liquidación.




De otro lado se realiza la construcción de placa para cancha múltiple una gradería y cubierta para polideportivo vereda Meusa en el municipio de Sopó mediante el contrato de obra No.L-2021-0423 y la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social, y seguridad y salud en el trabajo mediante el contrato No. CM-2021-0429, los cuales llevan un 80% de ejecución.


También, se suscribe con el ICCU el convenio No. 575 de 2021 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO BRICEÑO SECTOR CERRO FUERTE DEL MUNICIPIO DE SOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" por valor de \$1.615.774.132, en donde surge el contrato de obra el cual fue adjudicado el día 21 de diciembre de 2021 y el contrato de interventoría el cual se encuentra en trámite de contratación.

- **Registro Fotográfico**


**Briceño**

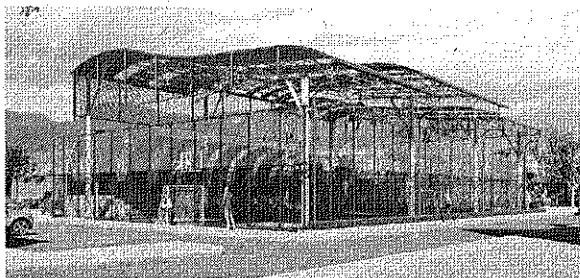


**Pueblo Viejo**

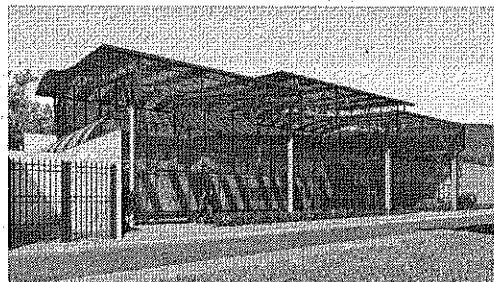

**Carolina Alta**


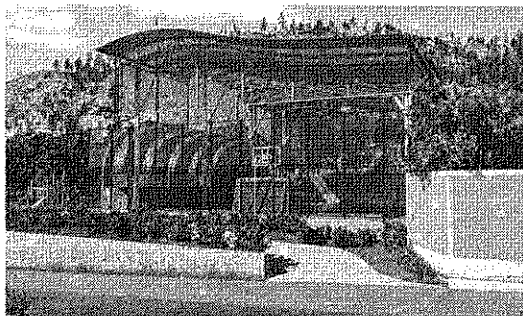


**Mercenario**


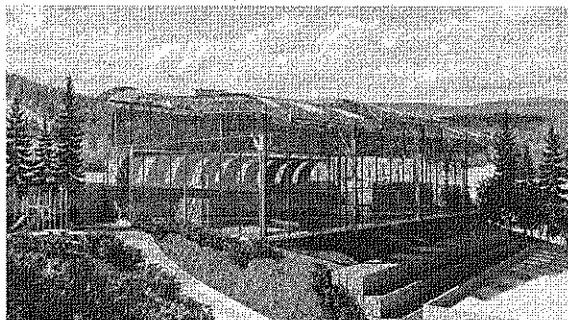


**Gratamira**

**San Agustín**

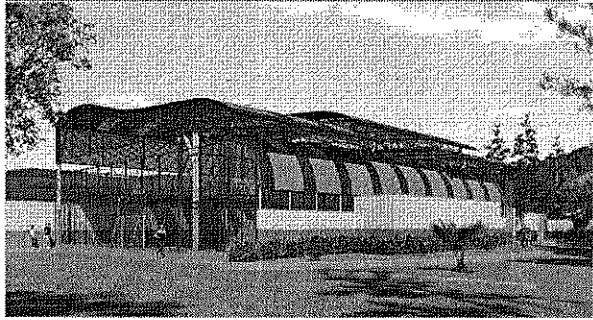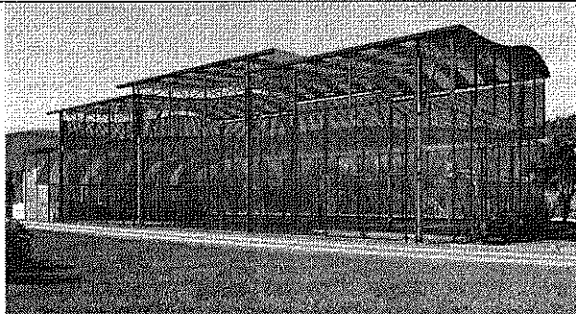

**Construcción de cubierta Meusa**

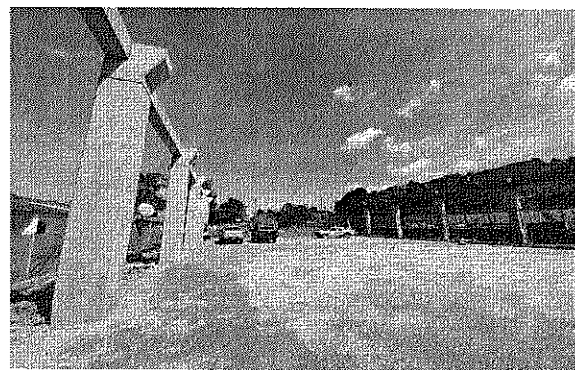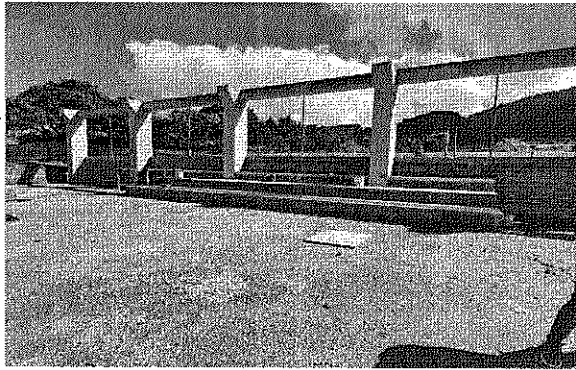

## **AÑO 2020**

**4. Meta de producto:** Realizar los estudios, diseños y la construcción de 4 escenarios de alto impacto deportivo y competitivo

### **Descripción:**

Descripción de la meta de producto	Meta de la Vigencia	Avance Meta 2020	% de Avance
Realizar los estudios, diseños y la construcción de 4 escenarios de alto impacto deportivo y competitivo	10%	10%	10%

Se deja contratado el proyecto para realizar los ajustes de los estudios y diseños del patinódromo y skate park, elaboración de estudios y diseños a nivel de detalle de la pista de atletismo y centro acuático y su interventoría, los cuales se articularán con las infraestructuras existentes en la Trinidad.

Se viabilizaron los proyectos para la construcción del skate park ante INDEPORTES y el Patinódromo ante el Ministerio del Deporte.

Se firmó convenio con el ministerio del Deporte para la construcción de la primera fase el patinódromo.

Se firmó convenio con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU para la construcción del SKATE PARK.

#### **AÑO 2021**

**4. Meta de producto:** Realizar los estudios, diseños y la construcción de 4 escenarios de alto impacto deportivo y competitivo

#### **Descripción:**

Dentro de la ejecución del contrato de consultoría CM-2020-0550 y de interventoría CM-2020-0557 se realizó el rediseño del Skate Park y la Pista de Patinaje. Además, se ejecutaron los estudios y diseños de la pista de atletismo y el complejo acuático. En la presente vigencia se culminaron al 100% todos los diseños y se inició la construcción de la fase 1 del Skate Park y la pista de patinaje.

Otro resultado obtenido de los diseños finalizados, es la radicación del proyecto de construcción de la pista de atletismo para lo cual se trabajó conjuntamente con el Ministerio del Deporte en viabilizar y actualmente en gestionar los recursos que permitan su ejecución. El identificador del proyecto en el Ministerio del Deporte es el 2021070701223, y el número de radicado de los diseños finales en físico es el 2021ER0025321.

En cuanto al complejo acuático, la siguiente vigencia se tiene proyectado iniciar gestión para consecución de recursos ante la Gobernación de Cundinamarca. Esta gestión también se debe hacer para la construcción de la fase 2 del skate park y la pista de patinaje.


Se suscribió convenio con el ICCU No. 407-2020 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL MUNICIPIO DE SOPÓ, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO FASE 1 EN EL COMPLEJO RECREO DEPORTIVO LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA" por valor de \$1.863.990.717 del cual se suscribieron los contratos de obra No. L-2021-0422 y de interventoría No. CM-2021-0424 con un avance del 25%.

Se suscribió convenio con el Ministerio del Deporte No. COIID-1237-2020 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN EL COMPLEJO RECREO DEPORTIVO LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA" por valor de \$1.069.240.897 del cual se suscribió el contrato de obra No. L-2021-0427 con un avance del 35%.


- **Registro Fotográfico**

**Diseños**


- Skate park:

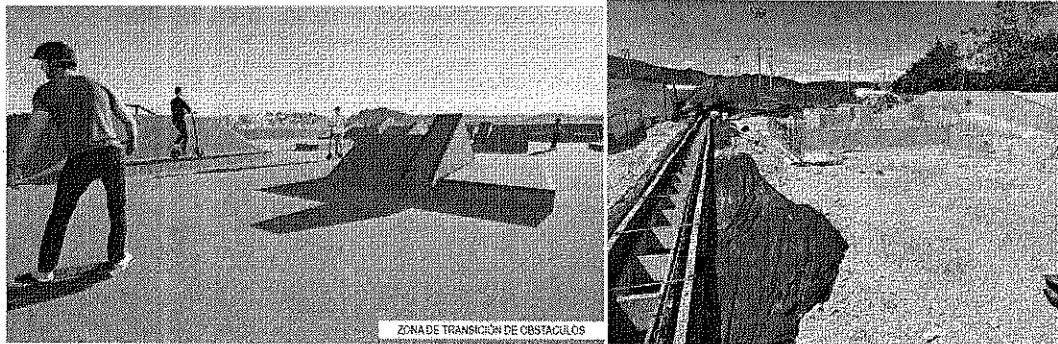

- Pista de patinaje:


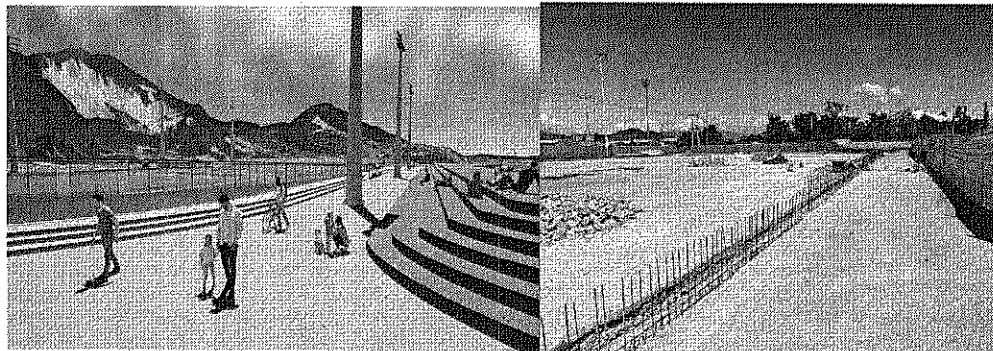


- Pista de atletismo:

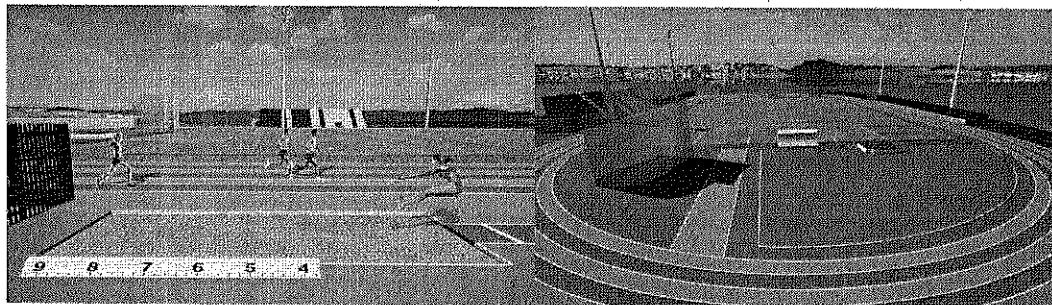



- Complejo Acuático:



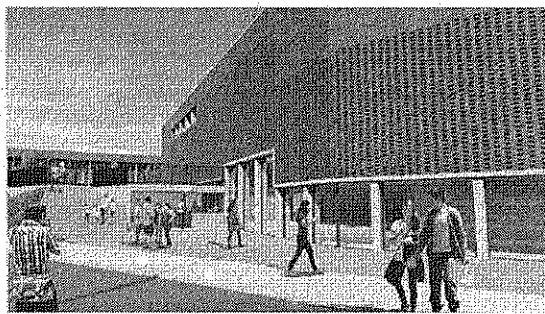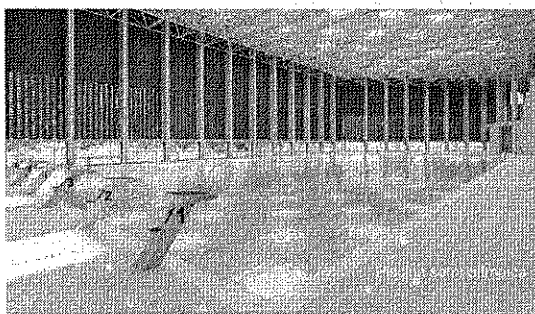


## Construcción

- Skate park:

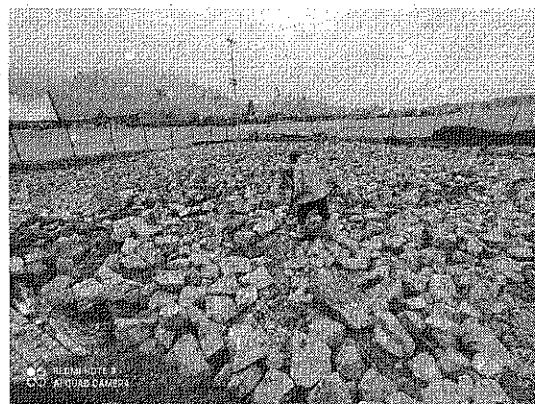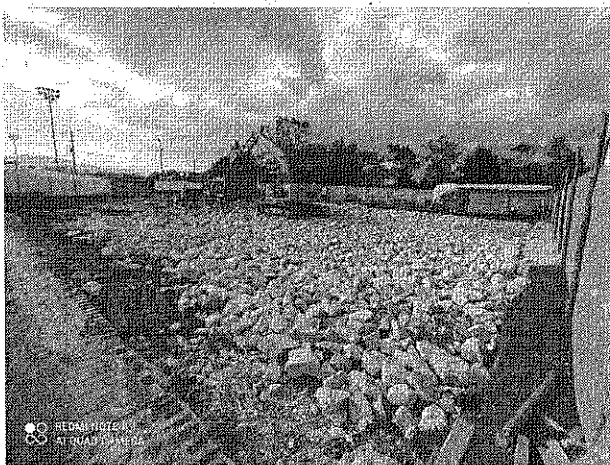

- Patinódromo:

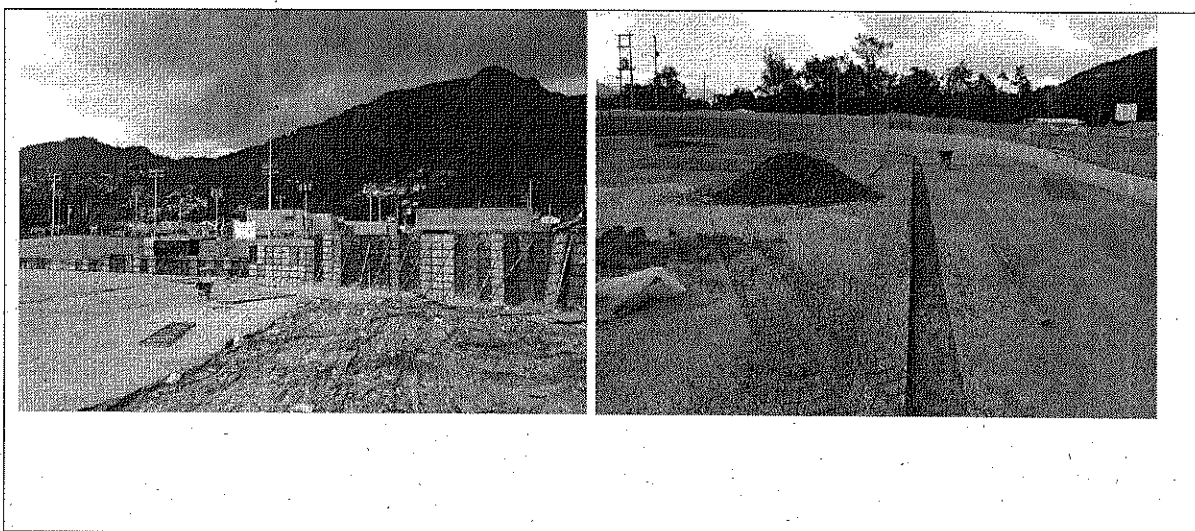

#### AÑO 2020

**5.Meta de producto:** Implementar un sistema de iluminación de bajo consumo y/o sostenible en el escenario deportivo Estadio Municipal José Vicente Rodríguez Riaño

#### Descripción:

Esta meta es transversal, y se realizará el estudio y diseño de la pista de atletismo en donde se incorporará el sistema de iluminación sostenible, acciones que son lideradas y ejecutadas desde la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

#### AÑO 2020

**5.Meta de producto:** Elaborar los estudios y diseños que permitan la construcción a mediano plazo de la Unidad Funcional "La ciudad de los niños" con parques, juegos y atracciones que permitan el aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo de habilidades básicas motrices por medio de la recreación.

#### Descripción:

Descripción de la meta de producto	Meta de la Vigencia	Avance Meta 2020	% de Avance
Elaborar los estudios y diseños que permitan la construcción a mediano plazo de la Unidad Funcional "La ciudad de los niños" con parques, juegos y atracciones que permitan el aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo de habilidades básicas motrices por medio de la recreación.	10%	10%	10%

Se dejó contratadas la consultoría para la elaboración de los estudios y diseños a nivel de detalle de la ciudad de los niños.

## AÑO 2021

**5.Meta de producto:** Elaborar los estudios y diseños que permitan la construcción a mediano plazo de la Unidad Funcional "La ciudad de los niños" con parques, juegos y atracciones que permitan el aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo de habilidades básicas motrices por medio de la recreación.

### Descripción:

Durante la ejecución del contrato de consultoría CM-2020-0550 y el contrato de interventoría CM-2020-0557 se ejecutaron al 100% los estudios y diseños del proyecto denominado "Ciudad de los niños". Con los estudios y diseños finalizados, se debe empezar con la gestión de recursos para la construcción del proyecto en la gobernación de Cundinamarca.

El diseño contempla un espacio amplio, colorido, con diversidad de juegos y áreas de uso exclusivo para la población infantil, esto aunado a utilizar una zona de cesión que no ha sido incorporada al desarrollo urbanístico del área urbana.

### • Registro Fotográfico



## AÑO 2020

**6.Meta de producto:** Realizar los estudios y diseños de la Casa de la Justicia en el municipio de Sopó que garantice a mediano plazo su construcción, dotación y funcionamiento

### Descripción:

Descripción de la meta de producto	Meta de la Vigencia	Avance Meta 2020	% de Avance
------------------------------------	---------------------	------------------	-------------

Realizar los estudios y diseños de la Casa de la Justicia en el municipio de Sopó que garantice a mediano plazo su construcción, dotación y funcionamiento	10%	10%	10%
--	-----	-----	-----

Se dejó contratada la consultoría para la elaboración de los estudios y diseños a nivel detalle de la casa de la justicia y su interventoría, simultáneamente, se adelantan gestiones para la consecución de recursos para su construcción.


## AÑO 2020

**7.Meta de producto:** Realizar el mantenimiento y/o adecuación de la infraestructura comunal del municipio

### Descripción:

La secretaria en conjunto con la administración municipal ha liderado mantenimientos en Mercenario y realizado visitas de diagnóstico con las juntas de acción comunal tales como San Gabriel, San Agustín, Pueblo Viejo, Gratamira, Hatogrande y Carolina Alta; elaborando presupuesto y orientación sobre la formulación de proyectos para gestión de recursos.

### Registro Fotográfico.

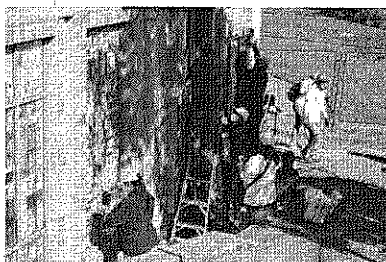

## AÑO 2021

**7.Meta de producto:** Realizar el mantenimiento y/o adecuación de la infraestructura comunal del municipio

### Descripción:



Se realizó mantenimiento al salón comunal de mercenario con el personal operativo, realizando actividades en el cerramiento, en la cubierta, cielo Razo.

Se realizó el mantenimiento del salón comunal de la vereda Hato Grande mediante el convenio solidario No. D-CS-2021-0001 suscrito entre la Junta de Acción Comunal y el Municipio de Sopó, en donde se realizó el cambio de la cubierta, mejoramiento de la estructura de la cubierta, mejoramiento del cielo raso y adecuaciones de las instalaciones eléctricas, esta intervención generó un cambio radical en este espacio comunal que beneficia a los residentes del sector.

Se realizó el mantenimiento del salón comunal de la vereda Pueblo Viejo mediante el convenio solidario No. D-CS-2021-0002 suscrito entre la Junta de Acción Comunal y el Municipio de Sopó, en donde se realizó el destronque y pulida del piso, cambio de lámparas, mantenimiento en la cubierta plana, lavado de fachada, cambio de cerraduras y chapas, igualmente se embelleció y brindó a la comunidad un área comunal cómoda, iluminada, ventilada y apta para el uso confortable y seguro de su comunidad.

Se realizó el mantenimiento del salón comunal de la vereda San Agustín mediante el convenio solidario No. D-CS-2021-0003 suscrito entre la Junta de Acción Comunal y el Municipio de Sopó, en donde se realizó el cambio de enchape, desmonte de cielo raso, cambio de tejas, mantenimiento de la carpintería metálica, pintura en general, pañetes, adecuaciones de baños, y adecuaciones en la red eléctrica. Esta es una de las infraestructuras que se encontraba en muy malas condiciones y la inversión de los recursos con el empeño de los comunales generaron una transformación de la edificación que hoy está completamente terminada, adecuada y al servicio de sus usuarios.





Se realiza la construcción de placa huella en la vereda comuneros, mediante el convenio No.1132 de 2021, suscrito entre la Junta de Acción Comunal de la vereda Comuneros y el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca – IDACO. Esta es una obra con excelentes resultados por la perfecta unión de esfuerzos de la junta de acción comunal y la Administración municipal.

A la fecha se tiene firmado el convenio solidario entre la Junta de Acción Comunal Piedra Herrada y el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca – IDACO, para la construcción de placa huella, por motivos de desembolso no se ha iniciado con la ejecución del convenio.


Se han realizado la formulación y radicación de proyectos ante el Ministerio del Interior para la gestión de recursos para la construcción de placa huella en las veredas, San Gabriel, Meusa, Comuneros, Piedra Herrada, Pueblo viejo, y San Agustín.


- **Registro Fotográfico**

### **Salón Comunal Hato Grande**

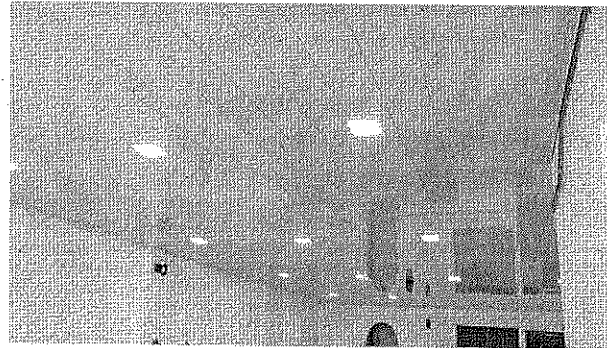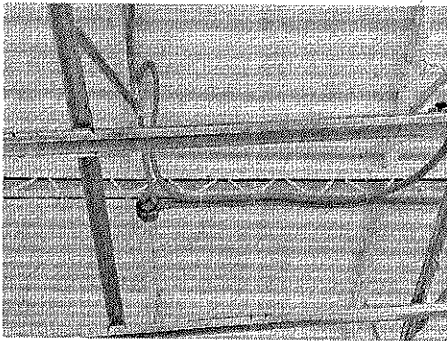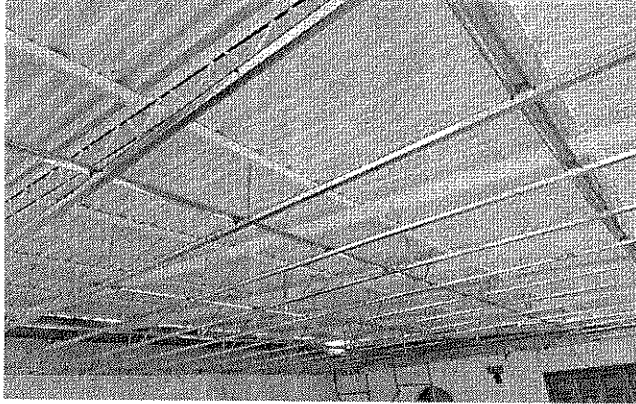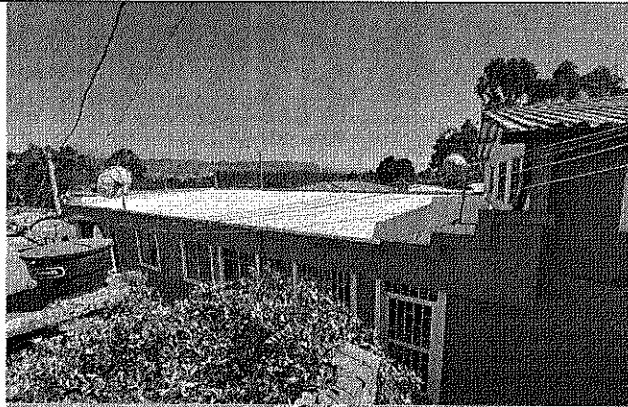

**Salón Comunal Pueblo Viejo**

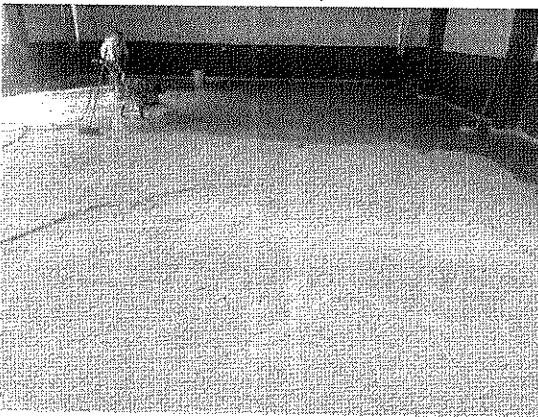


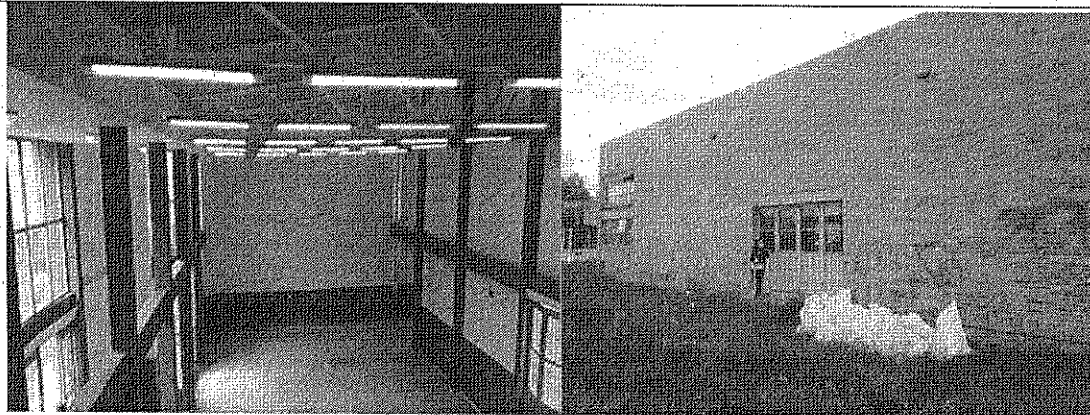

**Salón Comunal San Agustín**



**Construcción de placa huella vereda Comuneros**

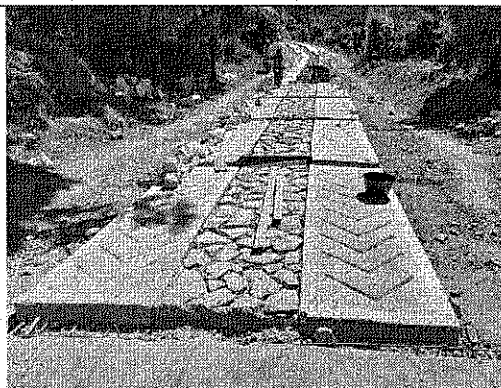

## AÑO 2020

**8.Meta de producto:** Realizar los estudios y diseños de la Casa de la Mujer en el municipio de Sopó que garantice a mediano plazo su construcción, dotación y funcionamiento

### Descripción:

Descripción de la meta de producto	Meta de la Vigencia	Avance Meta 2020	% de Avance
Realizar los estudios y diseños de la Casa de la Mujer en el municipio de Sopó que garantice a mediano plazo su construcción, dotación y funcionamiento	10%	10%	10%

Se dejó contratada la consultoría para la elaboración de los estudios y diseños a nivel detalle de la casa de la mujer y su interventoría. Simultáneamente fue incluida la construcción de la casa de la mujer por ASODAMAS para ser ejecutada en la vigencia 2021 y estamos a portas de la firma del convenio para su construcción.

## AÑO 2021

**8.Meta de producto:** Realizar los estudios y diseños de la Casa de la Mujer en el municipio de Sopó que garantice a mediano plazo su construcción, dotación y funcionamiento

### Descripción:




Se ejecuta el contrato de consultoría No. CM-2020-0559 y el contrato de interventoría No. CM-2020-0560 que corresponden al proyecto de ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE DE LA CASA DE JUSTICIA, CASA DE LA MUJER E ICBF EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023".



El Municipio de Sopó trabajó mancomunadamente con ASODAMAS la gestión de recursos para la construcción del Centro de emprendimiento e innovación casa social de la mujer, municipio de Sopó, a través del convenio con N° D-CV-2021-0019 el cual tiene un valor de \$1.150.000.000.00 y permitió que se inicien las labores de construcción; dentro de las actividades preliminares para dar entrada a este proyecto, se tuvo la demolición de la antigua Policarpa Salavarrieta, generando el espacio propicio para la posterior construcción.

Ya se realizó la demolición y respectiva adecuación del terreno, y se encuentra en fase de ejecución la construcción, específicamente en cimentación, teniendo un avance del 8% en construcción.

- **Registro Fotográfico**

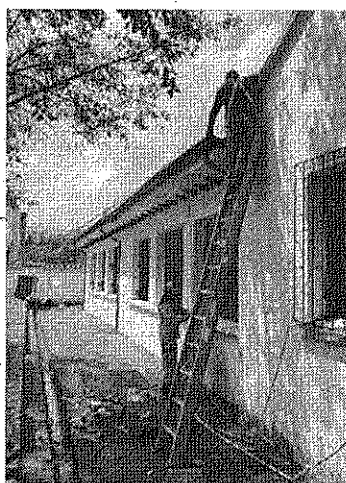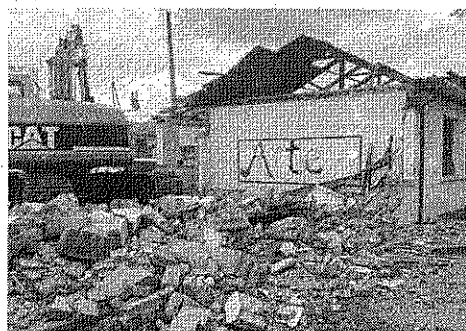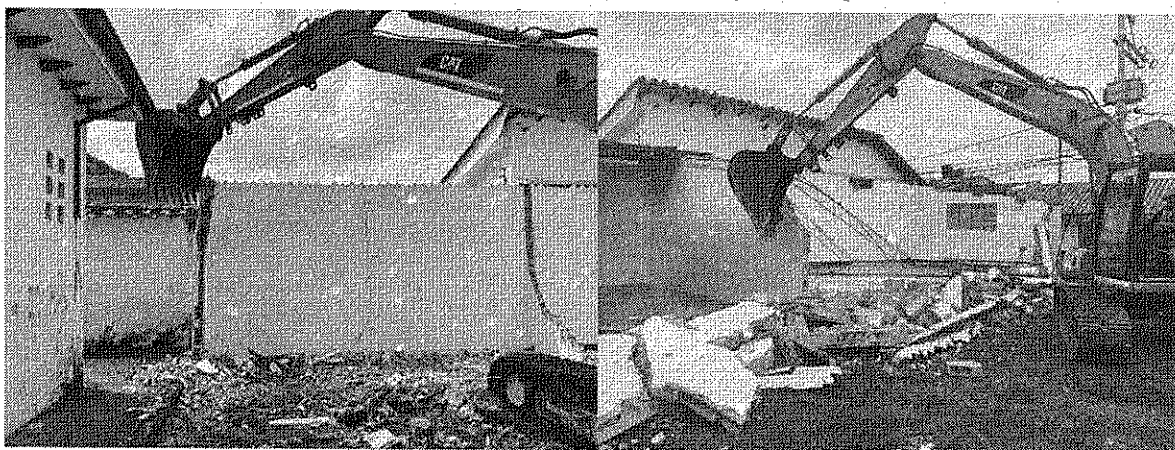

AÑO 2020
<b>9.Meta de producto:</b> Realizar los estudios y diseños del proyecto Sacúdete al parque en el Municipio de Sopó, que garantice a mediano plazo su construcción, dotación y funcionamiento.
<b>Descripción:</b>  Se tiene el proyecto radicado ante los entes nacionales competentes, nos encontramos a la espera del registro en Superintendencia de Notariado y Registro de la modificación del número de cédula catastral del predio para que se nos adjudiquen por parte del Ministerio del Interior los recursos de estudios y diseños, construcción e interventoría por valor aproximado de \$1.000.000.000.

AÑO 2021
<b>9.Meta de producto:</b> Realizar los estudios y diseños del proyecto Sacúdete al parque en el Municipio de Sopó, que garantice a mediano plazo su construcción, dotación y funcionamiento.
<b>Descripción:</b>  Se formuló el proyecto para ser presentado ante el Ministerio del Interior. Durante la viabilización del mismo, se realizaron diferentes mesas de trabajo conjuntas entre funcionarios del municipio y los viabilizadores técnicos del Sacúdete, hasta la aprobación y viabilización técnica y metodológica del proyecto. El proyecto incluye diseños, interventoría a los diseños, construcción e interventoría a la obra.  La administración municipal se encuentra a la espera de citación a comité final, para culminar el proceso ante el ministerio y suscribir el convenio interadministrativo, que permita la materialización de los diseños y la construcción del proyecto.

AÑO 2020
<b>10.Meta de producto:</b> Realizar el mantenimiento y/o dotación y/o adecuación de la concha acústica durante el cuatrienio
<b>Descripción:</b>

Para este espacio se cuenta con el diseño para la construcción de la batería Sanitaria y optimización de los espacios de semisótano que se encuentran subutilizados y deteriorados. En la vigencia 2021 se harán las respectivas inversiones. Se dejó estructurado el estudio previo para realizar su contratación en la vigencia 2021 en enero.

#### AÑO 2021

**10.Meta de producto:** Realizar el mantenimiento y/o dotación y/o adecuación de la concha acústica durante el cuatrienio

**Descripción:**

En la vigencia 2021; se publicó dos veces el proceso de mantenimiento de diferentes edificaciones entre ellas la concha acústica; por razones en la ejecución de los mismos fue revocado en el primer proceso y desierto en el segundo proceso.

Actualmente se está gestionando nuevamente el proceso que incluye la construcción y/o mantenimiento de la batería Sanitaria y optimización de los espacios de semisótano que se encuentran subutilizados y deteriorados; el proceso publicado es el número SA-AMS-2021-0021 cuyo objeto será Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la red de bibliotecas, concha acústica, campo de voleibol arena, instituciones educativas y centro de integración cultural C.I.C. del municipio de Sopó, Cundinamarca, en cumplimiento del plan de desarrollo "Sopó es nuestro tiempo 2023".

#### AÑO 2020

**11.Meta de producto:** Hacer que el 100% de la infraestructura nueva cumpla con la normatividad de accesibilidad para PcD.

**Descripción:** Esta meta es transversal, y aplica para todos los estudios y diseños de Preinversión que son liderados y ejecutados desde la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas por lo que se verificara la aplicación y cumplimiento de la normatividad de accesibilidad en cada uno de los proyectos de infraestructura.

#### AÑO 2021

**11.Meta de producto:** Hacer que el 100% de la infraestructura nueva cumpla con la normatividad de accesibilidad para PcD.

**Descripción:** Durante la vigencia se adelantaron y/o adelantan los estudios y diseños correspondientes a:

- Casa de la Mujer
- Casa de la Justicia
- Jardín Social
- Biblioplanetario
- Patinódromo
- Centro acuático
- Nueva sede del colegio Pablo VI – Fase I
- Nueva sede del colegio Pablo VI – Fase II
- Unidad de Atención Integral – UAI
- Placa, cubierta y gradería para los polideportivos de varios sectores del municipio
- Vía longitudinal y ciclo ruta
- Diseños urbanísticos para las zonas de cesión
- Ciudad de los niños
- Renovación urbana del centro poblado urbano de Briceño

Cada una de estas infraestructuras han sido diseñadas y/o vienen siendo diseñadas a detalle atendiendo la normativa vigente para Accesibilidad al medio físico y espacios de servicios al ciudadano en la administración pública, en donde se contemplan elementos como rampas, ascensores, advertencias visuales y táctiles, señalización, instalaciones sanitarias, circulaciones, accesos entre otros.

A razón de estos diseños, a la fecha se encuentra en construcción los siguientes proyectos:

- Patinódromo
- Placa, cubierta y gradería del polideportivo de la vereda de Meusa
- Nueva sede del colegio Pablo VI – Fase I
- Casa de la Mujer

## AÑO 2022

**11.Meta de producto:** Hacer que el 100% de la infraestructura nueva cumpla con la normatividad de accesibilidad para PcD.

**Descripción:** Durante la vigencia se culminaron los estudios y diseños correspondientes a:

- Casa de la Justicia
- Unidad de Atención Integral – UAI
- Placa, cubierta y gradería para los polideportivos de varios sectores del municipio
- Renovación urbana del centro poblado urbano de Briceño
- Modernización del Complejo recreo deportivo La Trinidad

Cada una de estas infraestructuras fueron diseñadas a detalle atendiendo la normativa vigente para Accesibilidad al medio físico y espacios de servicios al ciudadano en la administración pública, en donde se contemplaron elementos como rampas, ascensores,


advertencias visuales y táctiles, señalización, instalaciones sanitarias, circulaciones, accesos entre otros.

A razón de los diseños ejecutados durante la vigencia 2021 y 2022, se llevaron a cabo la construcción de los siguientes proyectos:


- Patinódromo
- Skate Park
- Placa, cubierta y gradería del polideportivo de la vereda de Meusa
- Placa, cubierta y gradería del polideportivo de la vereda de Briceño
- Nueva sede del colegio Pablo VI – Fase II
- Casa de la Mujer

- **Registro Fotográfico**



Patinódromo:

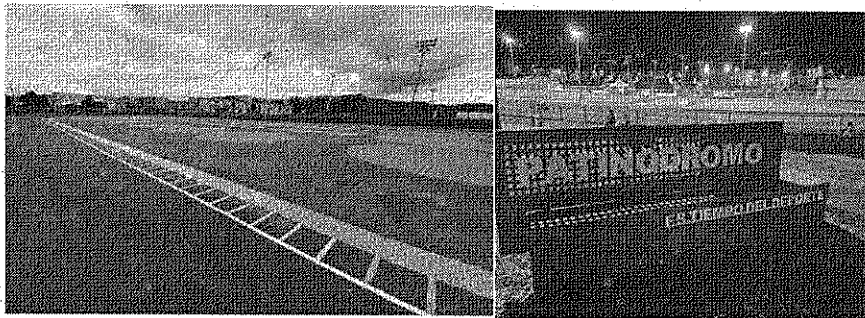



Skate Park:

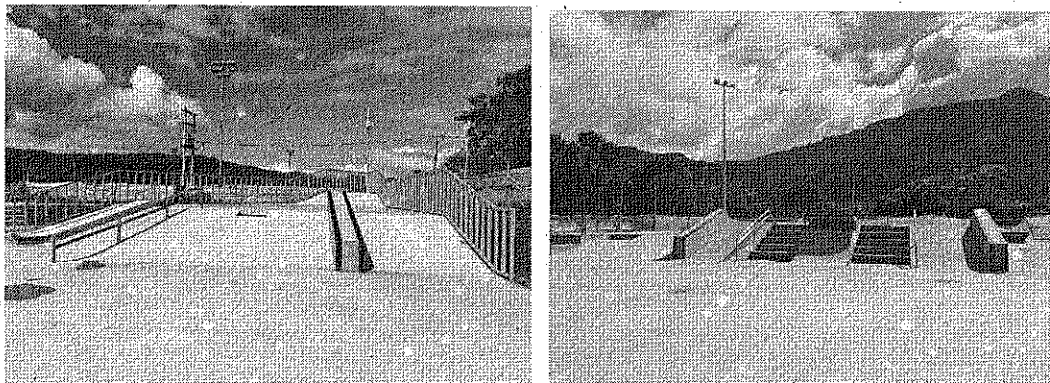



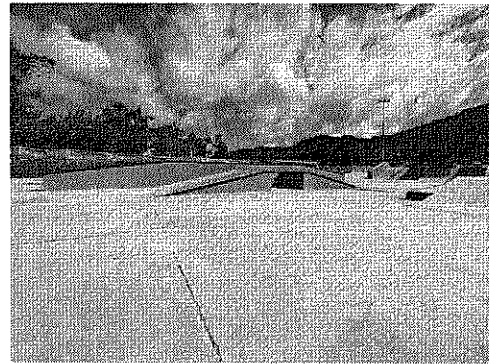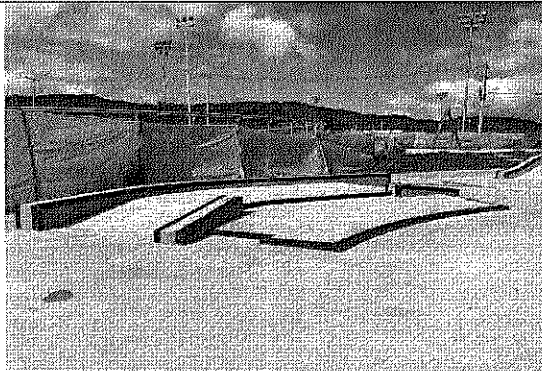


Construcción de cubierta Meusa:




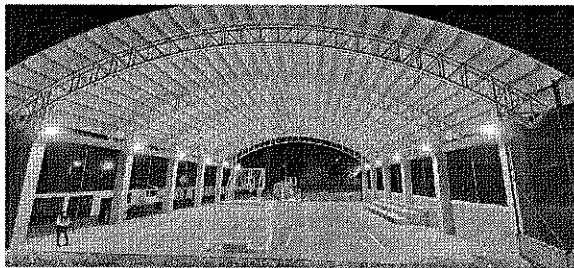


Construcción escenario deportivo Briceño sector Cerro Fuerte:




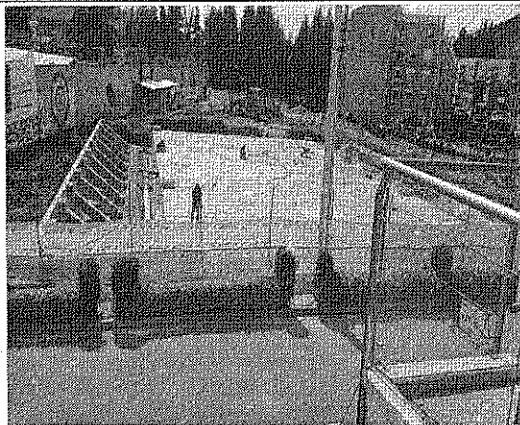

Nueva sede del colegio Pablo VI – Fase II:

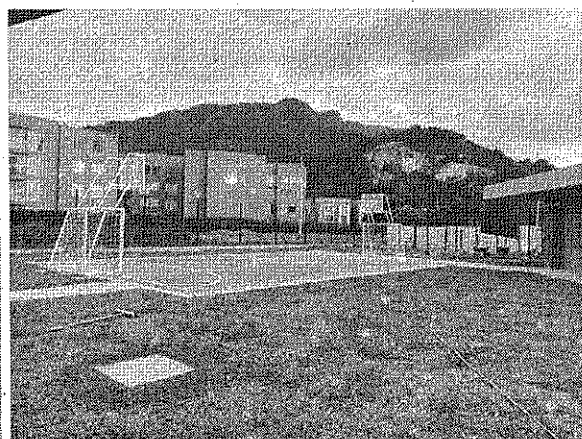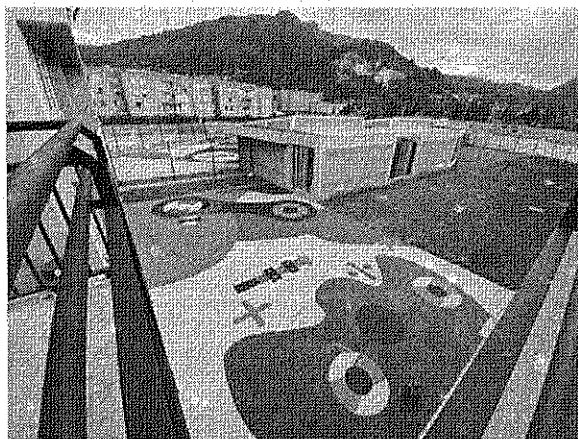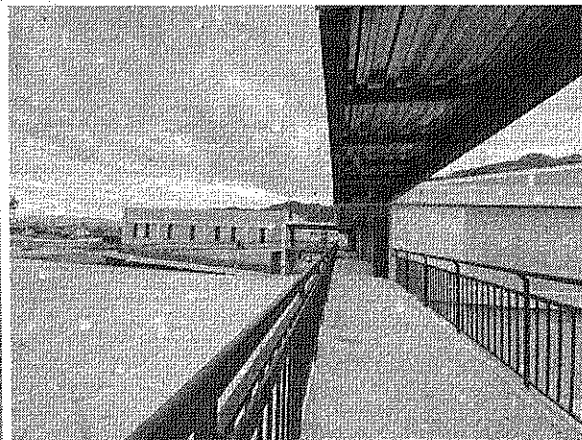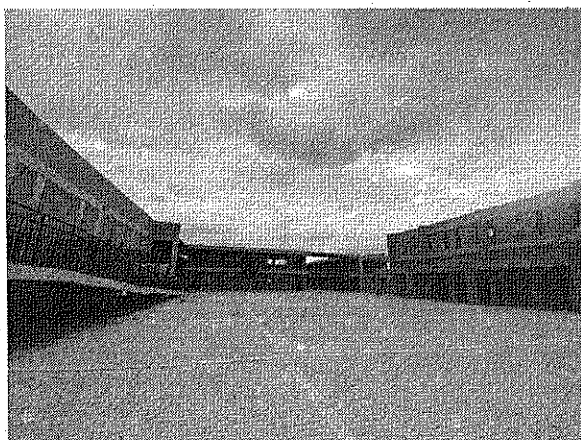

Casa de la Mujer:

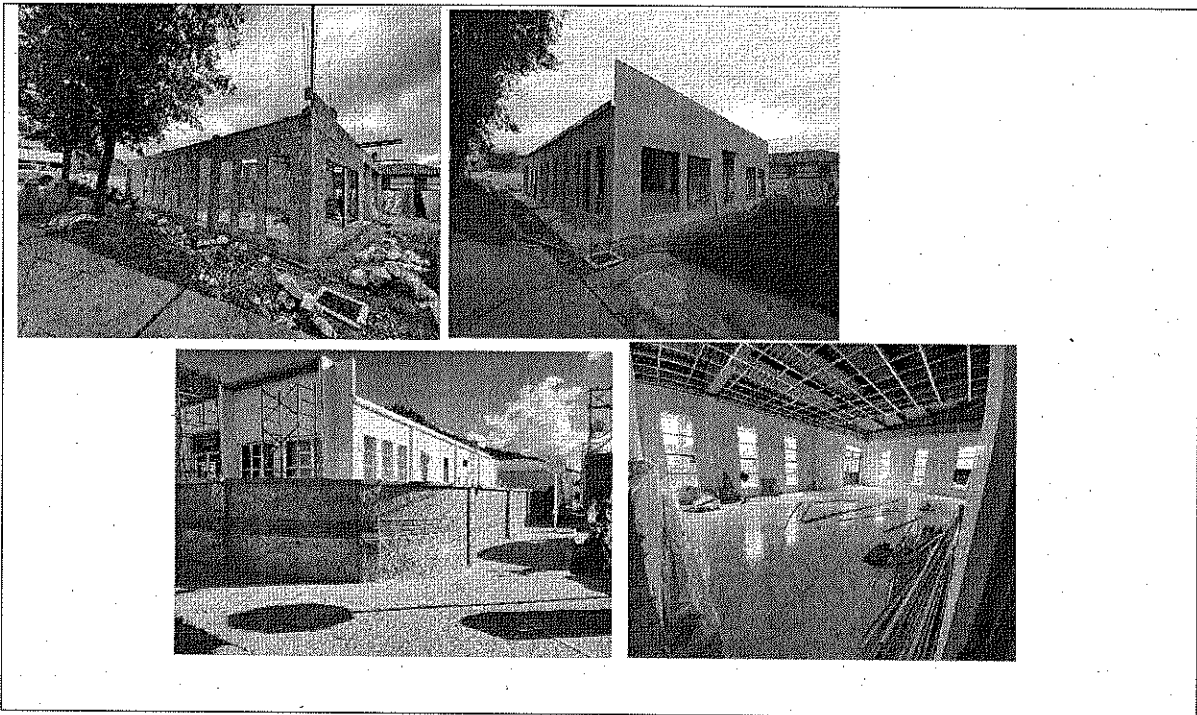

#### AÑO 2023

**4. Meta de producto:** Hacer que el 100% de la infraestructura nueva cumpla con la normatividad de accesibilidad para PcD

**Descripción:** Durante la vigencia se culminaron los estudios y diseños correspondientes a:

- a. Casa de la Justicia
- b. Unidad de Atención Integral – UAI
- c. Placa, cubierta y gradería para los polideportivos de varios sectores del municipio
- d. Modernización del Complejo recreo deportivo La Trinidad

Cada una de estas infraestructuras fueron diseñadas a detalle atendiendo la normativa vigente para Accesibilidad al medio físico y espacios de servicios al ciudadano en la administración pública, en donde se contemplaron elementos como rampas, ascensores, advertencias visuales y táctiles, señalización, instalaciones sanitarias, circulaciones, accesos entre otros.

A razón de los diseños ejecutados durante la vigencia 2021 y 2022, se llevaron a cabo la construcción de los siguientes proyectos:

- e. Patinódromo
- f. Skate Park
- g. Placa, cubierta y gradería del polideportivo de la vereda de Meusa
- h. Placa, cubierta y gradería del polideportivo de la vereda de Briceño



- i. Nueva sede del colegio Pablo VI – Fase II
- j. Casa de la Mujer

Para la vigencia cada una de las edificaciones construidas se garantiza la accesibilidad para PcD.


#### AÑO 2021


**12.Meta de producto:** Ejecutar un proceso de elaboración de Estudios y Diseños de la UAI en el municipio de Sopó que garantice a mediano plazo su construcción.

**Descripción:** Se ejecuta el contrato No. CM-2021-0481 cuyo objeto es la CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DETALLE DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL (UAI) EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023" por valor de \$249.999.960.

A la fecha se lleva una ejecución del 30% en donde se cuenta con los estudios y diseños de Diagnóstico, levantamiento topográfico, estudio de suelos y proyecto arquitectónico.

- **Registro Fotográfico**

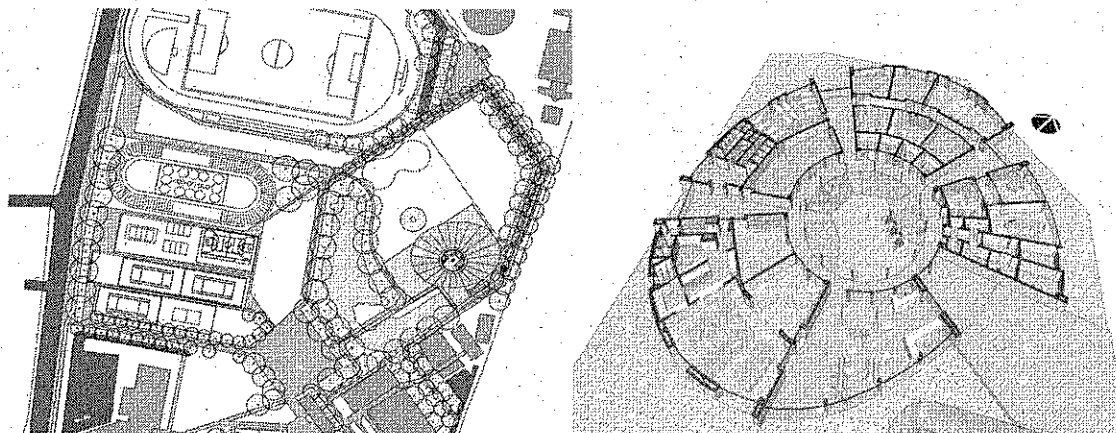

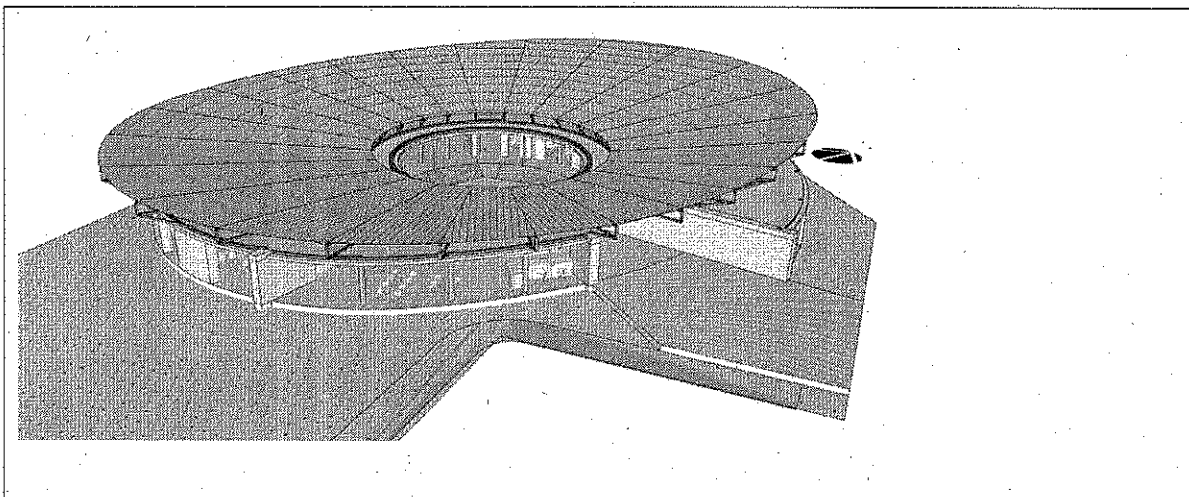

#### AÑO 2020

**13.Meta de producto:** Desarrollar un proyecto comunitario que garantice la ampliación de la cobertura de educación para primera infancia

**Descripción:** Se deja contratada la consultoría para la elaboración de los estudios y diseños a nivel detalle del jardín social y su interventoría.


#### AÑO 2021

**13.Meta de producto:** Desarrollar un proyecto comunitario que garantice la ampliación de la cobertura de educación para primera infancia

**Descripción** Se ejecuta el contrato de consultoría No. CM-2020-0559 y el contrato de interventoría No. CM-2020-0560 que corresponden al proyecto de ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE DE LA CASA DE JUSTICIA, CASA DE LA MUJER E ICBF EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023".

El Municipio de Sopó radicó en el mes de septiembre del 2021 ante el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS el proyecto para la gestión de recursos, a la fecha se encuentra en proceso de revisión, evaluación y requerimientos.

- **Registro Fotográfico**

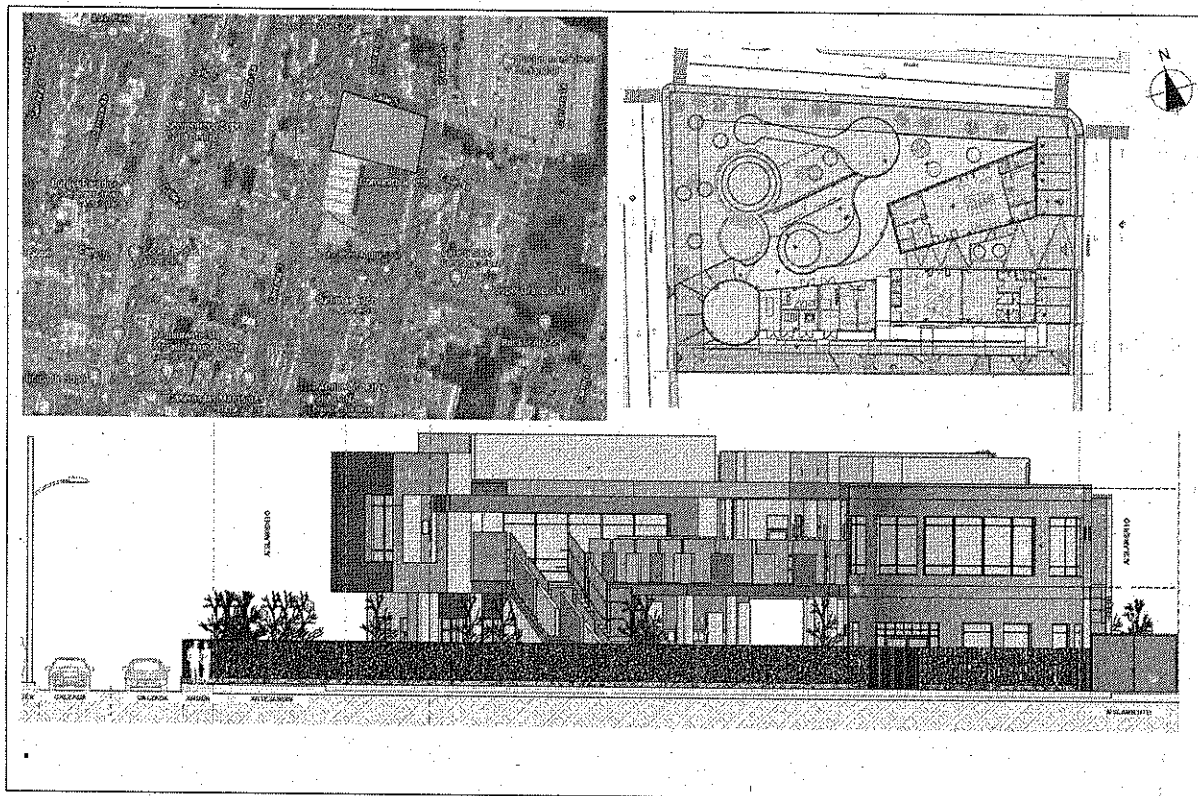



## AÑO 2021

**14. Meta de producto:** Realizar los estudios y diseños de un parque infantil especializado por rangos de edad que garantice a mediano plazo su construcción, dotación y funcionamiento

**Descripción:** Durante la ejecución del contrato de consultoría CM-2020-0550 y el contrato de interventoría CM-2020-0557 se ejecutaron al 100% los estudios y diseños del proyecto denominado "Ciudad de los niños". Con los estudios y diseños finalizados, se debe empezar con la gestión de recursos para la construcción del proyecto en la gobernación de Cundinamarca.

El diseño atiende las necesidades de los infantes para su esparcimiento, ofreciendo grandes áreas, diversidad de juegos y de espacios de circulación, complementados con un bello colorido que invita a la integración de la niñez con los demás miembros de su familia.

- **Registro Fotográfico**

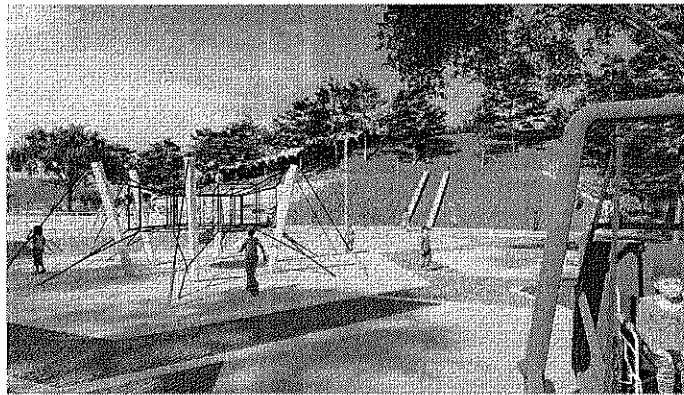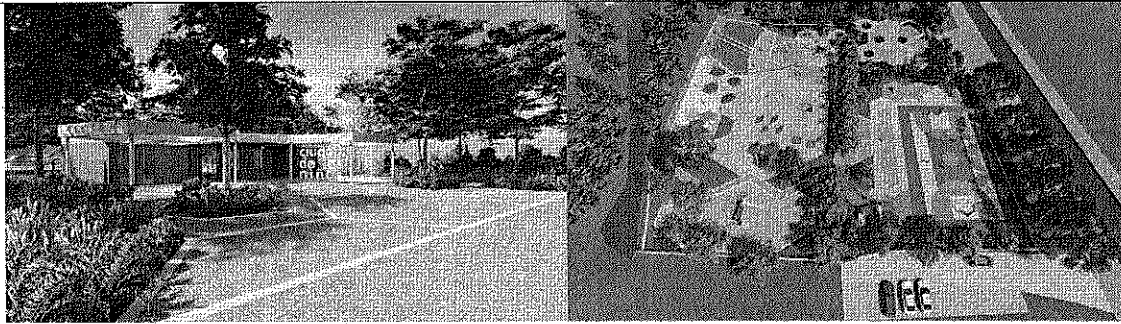

#### AÑO 2020

**15.Meta de producto:** Construir 600 Mts2 de alameda sobre la carrera 4 del municipio de Sopó

**Descripción:** Se realizaron reuniones con empresas como Claro y Codensa, con el fin de trabajar en conjunto para la intervención del espacio público sobre esta zona, sin embargo, por la pandemia por Covid-19, se suspendió el proceso.

#### AÑO 2022

**15.Meta de producto:** Construir 600 Mts2 de alameda sobre la carrera 4 del municipio de Sopó

**Descripción:** Durante el mes de octubre se gestionó ante el Honorable Concejo Municipal el Acuerdo No. 022 del 27 de octubre de 2022 "POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE SOPÓ PARA OBTENER RECURSOS A TRAVÉS DE UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, SE LE OTORGAN ALGUNAS FACULTADES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" para el financiamiento de proyectos de inversión incluido en el Plan de

Desarrollo como lo es la INTERVENCIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN LA CARRERA 4TA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ por un valor de \$1.300.000.000.

Actualmente, la secretaría de Hacienda se encuentra realizando la gestión ante el banco para la viabilización y aprobación del crédito. Una vez se tenga la aprobación se deberá incorporar los recursos al presupuesto del municipio y así tener a disposición dichos recursos para la contratación de la obra.

AÑO 2023
<p><b>15.Meta de producto:</b> Construir 600 Mts2 de alameda sobre la carrera 4 del municipio de Sopó</p> <p><b>Descripción:</b> Durante el mes de octubre de 2022 se gestionó ante el Honorable Concejo Municipal el Acuerdo No. 022 del 27 de octubre de 2022 "POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE SOPÓ PARA OBTENER RECURSOS A TRAVÉS DE UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, SE LE OTORGAN ALGUNAS FACULTADES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" para el financiamiento de proyectos de inversión incluido en el Plan de Desarrollo como lo es la INTERVENCIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN LA CARRERA 4TA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ por un valor de \$1.300.000.000, obteniendo su aprobación y viabilización.</p> <p>Para la vigencia 2023 se estructura la parte contractual para realizar la firma del CONVENIO No D-CV-2023-0007 con EMSERSOPO - E.S.P. Por un valor de \$1.600.000.000. con un plazo de ejecución de cinco meses.</p> <p>La empresa de servicios públicos EMSERSOPO ESP, realizó la invitación pública N° ESP 001 de 2023 para la selección del contratista que ejecutará la obra con resolución de adjudicación No 166 de 2023, por valor de \$ 1.484.986.611.</p>

AÑO 2020
<p><b>16.Meta de producto:</b> Construir 1000 metros lineales de andenes y rampas de acceso a lugares públicos buscando una consolidación urbanística e infraestructura inclusiva.</p> <p><b>Descripción:</b> En la actualidad se adelantan los estudio y diseños para la construcción del sendero peatonal – ciclo ruta Briceño-Sopó y la vía longitudinal que incluye zonas de anden y ciclo ruta.</p>

AÑO 2021
<p><b>16.Meta de producto:</b> Construir 1000 metros lineales de andenes y rampas de acceso a lugares públicos buscando una consolidación urbanística e infraestructura inclusiva.</p>





**Descripción:** En la ejecución del contrato CM-2020-0500 celebrado por la Administración municipal para los estudios y diseños para la construcción de la vía longitudinal y ciclorruta-sendero peatonal de Briceño - Sopó; se realizaron los diseños de la ciclorruta, buscando generar espacios confortables y amigables de fácil utilización, con texturas antideslizantes, modulares, con elementos estéticos atractivos del paisaje urbano que despierten el interés por el entorno que le ofrece al municipio.

Para las personas con discapacidad sensorial o mental se colocarán texturas de alerta que cumplan con las condiciones anteriormente expuestas. Este contrato contaba con interventoría realizada mediante contrato CM-2020-0504.






En la ejecución del contrato CM-2021-0419 celebrado por la Administración municipal para los estudios y diseños de renovación urbana del centro poblado urbano Briceño colindante con la vía principal troncal central del norte en el municipio de Sopó Cundinamarca, en cumplimiento al plan de desarrollo "Sopó es nuestro tiempo 2020 – 2023", se realizó el análisis de la problemática que se presenta en la movilidad del corredor vial y espacio público; por lo cual se está realizando el diseño del espacio público independizando los diferentes flujos de movilidad, ordenando el espacio público y demás factores relacionados con la problemática. Los diseños se radicaron en la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) para obtener el permiso de uso debido a que el espacio público es administrado por ésta agencia.

- **Registro Fotográfico**



Contrato CM-2020-0500

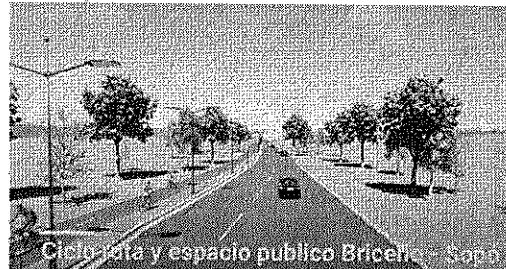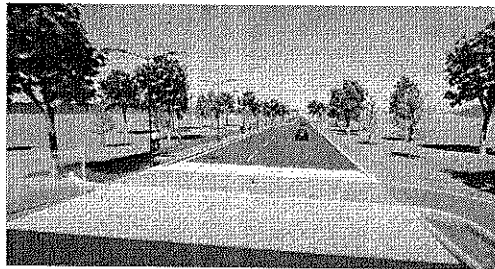




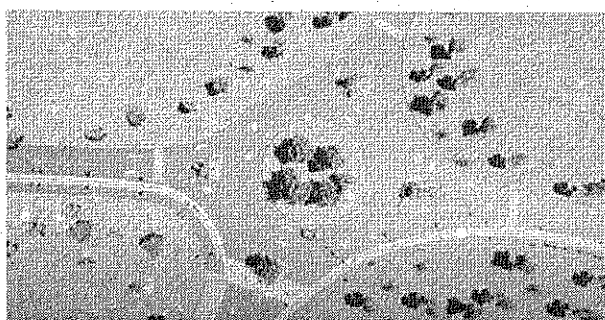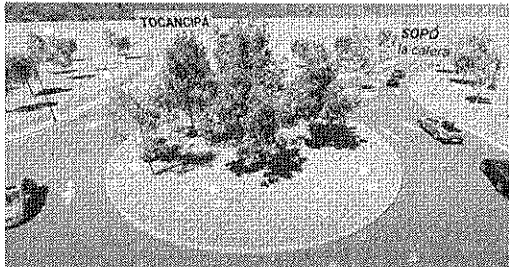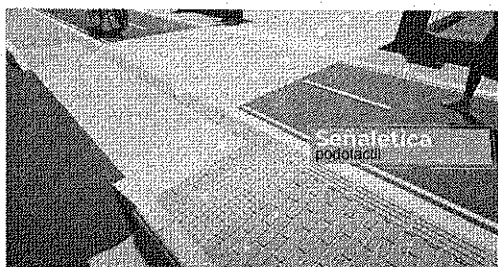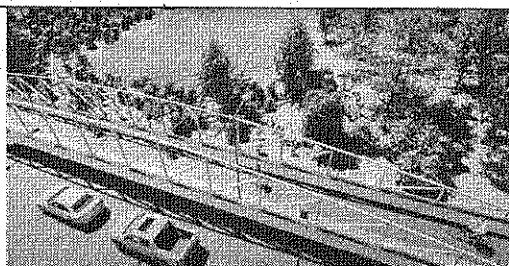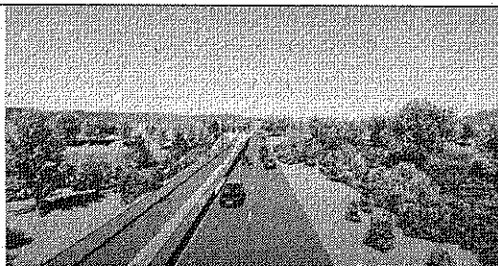

Contrato CM-2021-0419

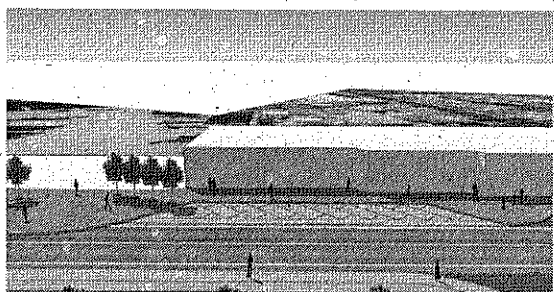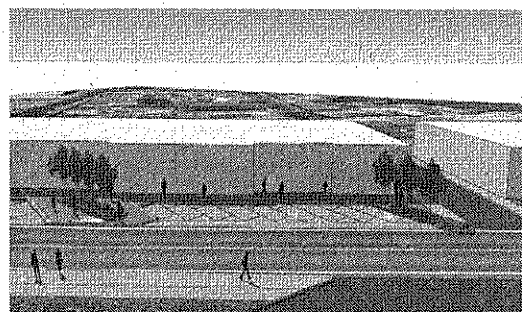

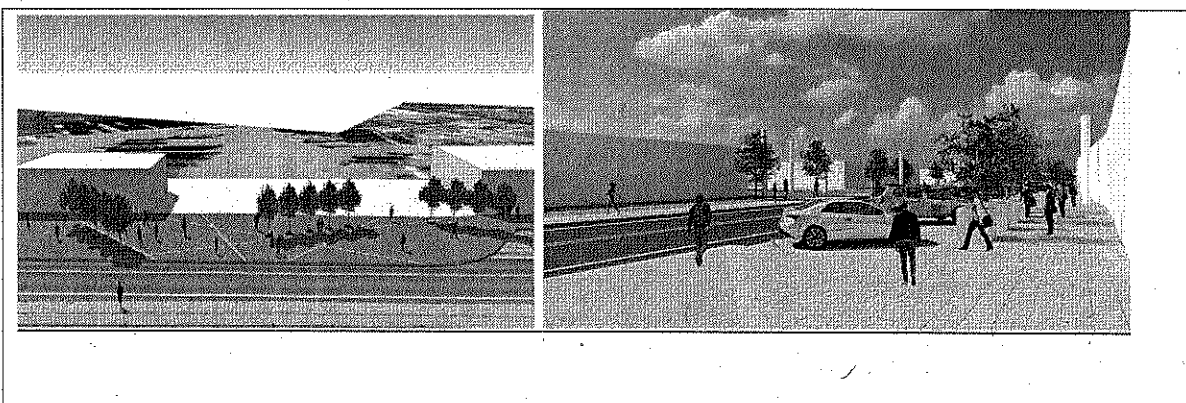

## AÑO 2022

**16. Meta de producto:** Construir 1000 metros lineales de andenes y rampas de acceso a lugares públicos buscando una consolidación urbanística e infraestructura inclusiva.

**Descripción:** Durante la vigencia y mediante la ejecución de la obra del Colegio Pablo VI, se realizó la construcción del andén de acceso a la nueva sede el colegio Pablo VI con una longitud de 95.01 ml.

Por otra parte, en la ejecución del contrato CM-2020-0500 celebrado por la Administración municipal para los estudios y diseños para la construcción de la vía longitudinal y ciclorruta-sendero peatonal de Briceño - Sopó; se realizaron los diseños de la ciclorruta, buscando generar espacios confortables y amigables de fácil utilización, con texturas antideslizantes, modulares, con elementos estéticos atractivos del paisaje urbano que despierten el interés por el entorno que le ofrece al municipio.

Para las personas con discapacidad sensorial o mental se colocarán texturas de alerta que cumplan con las condiciones anteriormente expuestas. Este contrato contaba con interventoría realizada mediante contrato CM-2020-0504.

El consultor finalizó los estudios y diseños en noviembre de 2021, en los cuales se encuentran:

\*Los diseños de 3.9 kilómetros de vía longitudinal por un valor de \$35.767.383.657,00.

\*Los diseños de la ciclo ruta y sendero peatonal de 3.1 kilómetros por valor de \$5.820.253.288,30 (incluye interventoría) y un paso elevado a nivel por valor de \$1.081.233.279,10 (incluye interventoría).

Una vez se recibieron los diseños se inicia la gestión en la Administración Municipal para el trámite de obtener los recursos para la construcción del proyecto.

En la gestión del proyecto realizada por la Administración Municipal encontramos lo siguiente:

- Socialización del proyecto: este proyecto ha sido socializado en lo corrido del periodo de administración y ha sido aceptado por los propietarios de los predios y la comunidad Soposeña que conoce la problemática y también es consciente que la única solución es construir nuevas vías que sean alternas y complementarias a las existentes mejorando, con ello, la movilidad.
- Socialización de los diseños con los propietarios de los predios involucrados en el proyecto: a los propietarios se les explicó todo el proyecto y se les enseñó la ficha predial en donde se indicaba el área de cesión. Todos los propietarios aceptaron positivamente el proyecto. Se cuenta con las actas de reuniones de las áreas sobre las cuales está la vía constituida.
- Se gestionó ante el concejo Municipal el Acuerdo Municipal número 012 de 2022 del 13 de junio de 2022 "POR EL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA, SE FIJA LA COMPETENCIA PARA DECRETAR LAS ESPECIALES CONDICIONES DE URGENCIA POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE GESTIÓN PREDIAL" de los predios que hacen parte del proyecto.
- Se expidió el Decreto Municipal número 065 de 2022, "POR EL CUAL SE DECLARA LA UTILIDAD PÚBLICA Y LA EXISTENCIA DE CONDICIONES DE URGENCIA POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA DE UNOS PREDIOS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA FUTURO DESARROLLO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES "

Actualmente nos encontramos en la organización de los productos de acuerdo a los requerimientos para la creación de la MGA y los requisitos del Instituto de Infraestructura y de Concesiones de Cundinamarca - ICCU, se está tramitando el permiso ante el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y se avanza en la gestión de cofinanciación del proyecto ante la Gobernación de Cundinamarca, contando con el aval para la obtención de todos los recursos necesarios para llevar a la finalización este proyecto.

Durante el mes de octubre se gestionó ante el Honorable Concejo Municipal el Acuerdo No. 021 del 27 de octubre de 2022 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO NO. 001 DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", con el fin de autorizar al alcalde del municipio de Sopó para suscribir operaciones de crédito público con la banca nacional para el financiamiento de proyectos de inversión incluidos en el Plan de Desarrollo, como lo es la CONSTRUCCIÓN DE LA CICLO-RUTA Y ANDÉN EN EL COSTADO NORTE DE LA VÍA 50CN03 BRICEÑO-SOPÓ por un valor de \$6.750.000.000. Así mismo, se firmó ante el Concejo Municipal el Acuerdo No. 022 del 27 de octubre de 2022 "POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE SOPÓ PARA OBTENER RECURSOS A TRAVÉS DE UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, SE LE OTORGAN ALGUNAS FACULTADES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" para el financiamiento de proyectos de inversión incluido en el Plan de Desarrollo como lo es la CONSTRUCCIÓN DE LA CICLO-RUTA Y ANDÉN EN EL COSTADO NORTE DE LA VÍA 50CN03 BRICEÑO-SOPÓ por un valor de \$1.250.000.000; es decir se tienen un valor de \$8.000.000.000 de crédito público aprobado para la

## CONSTRUCCIÓN DE LA CICLO-RUTA Y ANDÉN EN EL COSTADO NORTE DE LA VÍA 50CN03 BRICEÑO-SOPÓ.

Paralelamente, la secretaría de Hacienda se encuentra realizando la gestión ante la entidad financiera para la viabilización y aprobación del crédito. Una vez se tenga la aprobación se deberá incorporar los recursos al presupuesto del municipio y así tener a disposición dichos recursos para la contratación de la obra.


En cuanto a la ejecución del contrato CM-2021-0419 celebrado por la Administración municipal para los ESTUDIOS Y DISEÑOS DE RENOVACIÓN URBANA DEL CENTRO POBLADO URBANO BRICEÑO COLINDANTE CON LA VÍA PRINCIPAL TRONCAL CENTRAL DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020 – 2023", se realizó el análisis de la problemática que se presenta en la movilidad del corredor vial y espacio público; por lo cual se realizó el diseño del espacio público independizando los diferentes flujos de movilidad, ordenando el espacio público y demás factores relacionados con la problemática.

Los estudios y diseños se radicaron en la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para obtener el permiso de uso, debido a que el espacio público es administrado por esta agencia. Por lo anterior se obtuvo la Resolución 20223040011455 del 19 de agosto del 2022 "POR LA CUAL SE CONCEDE PERMISO TEMPORAL PARA EL USO, OCUPACIÓN E INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL AL MUNICIPIO DE SOPÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CON NIT. 899.999.468-2, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DESTINADAS A LA SEGURIDAD VIAL - RENOVACIÓN URBANA DEL CENTRO POBLADO BRICEÑO EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, QUE SE DESARROLLARÁN SOBRE LA RN 5501 ENTRE LOS PR0+584 Y EL PR1+415 AMBOS COSTADOS, PERTENECIENTE AL PROYECTO VIAL DENOMINADO ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ."

Actualmente estamos en la gestión de cofinanciación del proyecto.

- **Registro Fotográfico**

Andén de acceso Colegio Pablo VI

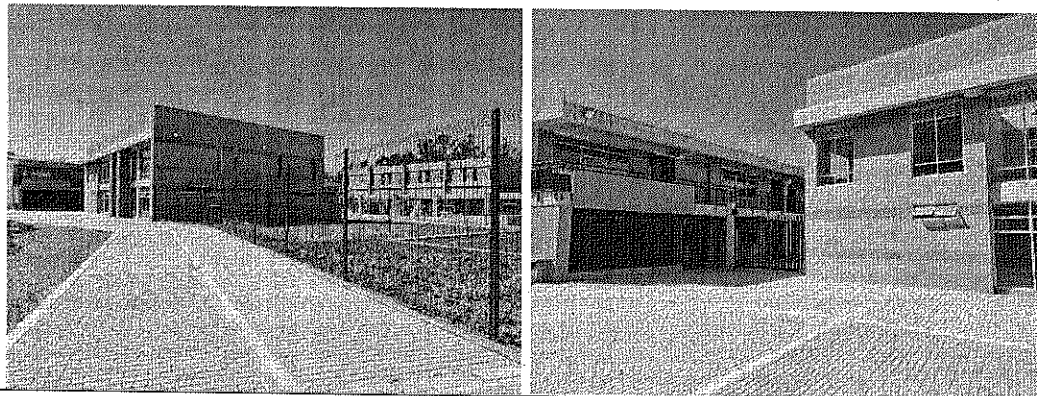

**AÑO 2023**

**16. Meta de producto:** Construir 1000 metros lineales de andenes y rampas de acceso a lugares públicos buscando una consolidación urbanística e infraestructura inclusiva.

**Descripción:** Durante la vigencia y mediante la ejecución de la obra del Colegio Pablo VI, se realizó la construcción del andén de acceso a la nueva sede el colegio Pablo VI con una longitud de 95.01 ml.

Por otra parte, en la ejecución del contrato CM-2020-0500 celebrado por la Administración municipal para los estudios y diseños para la construcción de la vía longitudinal y ciclorruta-sendero peatonal de Briceño - Sopó; se realizaron los diseños de la ciclorruta, buscando generar espacios confortables y amigables de fácil utilización, con texturas antideslizantes, modulares, con elementos estéticos atractivos del paisaje urbano que despierten el interés por el entorno que le ofrece al municipio.

Para las personas con discapacidad sensorial o mental se colocarán texturas de alerta que cumplan con las condiciones anteriormente expuestas. Este contrato contaba con interventoría realizada mediante contrato CM-2020-0504.

El consultor finalizó los estudios y diseños en noviembre de 2021, en los cuales se encuentran:

\*Los diseños de 3.9 kilómetros de vía longitudinal por un valor de \$35.767.383.657,00.

\*Los diseños de la ciclo ruta y sendero peatonal de 3.1 kilómetros por valor de \$5.820.253.288,30 (incluye interventoría) y un paso elevado a nivel por valor de \$1.081.233.279,10 (incluye interventoría).

Una vez se recibieron los diseños se inicia la gestión en la Administración Municipal para el trámite de obtener los recursos para la construcción del proyecto.

En la gestión del proyecto realizada por la Administración Municipal encontramos lo siguiente:

- Socialización del proyecto: este proyecto ha sido socializado en lo corrido del periodo de administración y ha sido aceptado por los propietarios de los predios y la comunidad Soposeña que conoce la problemática y también es consciente que la única solución es construir nuevas vías que sean alternas y complementarias a las existentes mejorando, con ello, la movilidad.
- Socialización de los diseños con los propietarios de los predios involucrados en el proyecto: a los propietarios se les explicó todo el proyecto y se les enseñó la ficha predial en donde se indicaba el área de cesión. Todos los propietarios aceptaron



positivamente el proyecto. Se cuenta con las actas de reuniones de las áreas sobre las cuales está la vía constituida.

- Se gestionó ante el concejo Municipal el Acuerdo Municipal número 012 de 2022 del 13 de junio de 2022 "POR EL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA, SE FIJA LA COMPETENCIA PARA DECRETAR LAS ESPECIALES CONDICIONES DE URGENCIA POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE GESTIÓN PREDIAL" de los predios que hacen parte del proyecto.

- Se expidió el Decreto Municipal número 065 de 2022, "POR EL CUAL SE DECLARA LA UTILIDAD PÚBLICA Y LA EXISTENCIA DE CONDICIONES DE URGENCIA POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA DE UNOS PREDIOS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA FUTURO DESARROLLO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Durante el mes de octubre se gestionó ante el Honorable Concejo Municipal el Acuerdo No. 021 del 27 de octubre de 2022 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO NO. 001 DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", con el fin de autorizar al alcalde del municipio de Sopó para suscribir operaciones de crédito público con la banca nacional para el financiamiento de proyectos de inversión incluidos en el Plan de Desarrollo, como lo es la CONSTRUCCIÓN DE LA CICLO-RUTA Y ANDÉN EN EL COSTADO NORTE DE LA VÍA 50CN03 BRICEÑO-SOPÓ por un valor de \$6.750.000.000.


Así mismo, se firmó ante el Concejo Municipal el Acuerdo No. 022 del 27 de octubre de 2022 "POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE SOPÓ PARA OBTENER RECURSOS A TRAVÉS DE UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, SE LE OTORGAN ALGUNAS FACULTADES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" para el financiamiento de proyectos de inversión incluido en el Plan de Desarrollo como lo es la CONSTRUCCIÓN DE LA CICLO-RUTA Y ANDÉN EN EL COSTADO NORTE DE LA VÍA 50CN03 BRICEÑO-SOPÓ por un valor de \$1.250.000.000; es decir se tienen un valor de \$8.000.000.000 de crédito público aprobado para la CONSTRUCCIÓN DE LA CICLO-RUTA Y ANDÉN EN EL COSTADO NORTE DE LA VÍA 50CN03 BRICEÑO-SOPÓ.

Para la vigencia 2023 se adjudicó el proceso de obra No L-2023-0862 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE LA CICLO RUTA Y SENDEROS PEATONALES EN EL TRAMO BRICEÑO - SOPÓ EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023." Y el proceso de interventoría No CM-2023-0863 cuyo objeto es: " INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA CICLO RUTA Y SENDEROS PEATONALES EN EL TRAMO BRICEÑO - SOPÓ EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023". En la ejecución se realizan actividades como localización y replanteo, excavaciones varias, relleno en recebo común, instalación de tubería PVC alcantarillado, material granular filtrante, pozos de inspección, cajas de inspección, ducto eléctrico, instalación de sardineles






y bordillos, instalación de adoquín de arcilla, tableta táctil y loseta toperol y señalización. Hasta el 9 de noviembre se cuenta con el 80 % de avance de obra.


- **Registro Fotográfico**

Andén de acceso Colegio Pablo VI



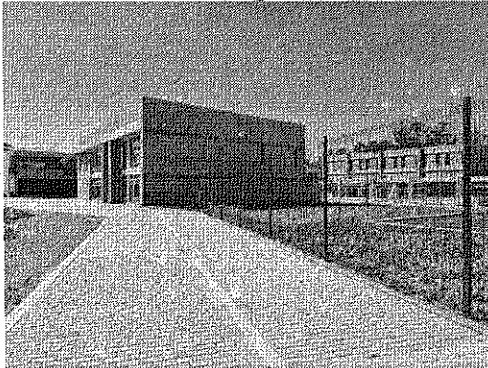


Diseños Vía longitudinal y ciclorruta- sendero peatonal de Briceño - Sopó








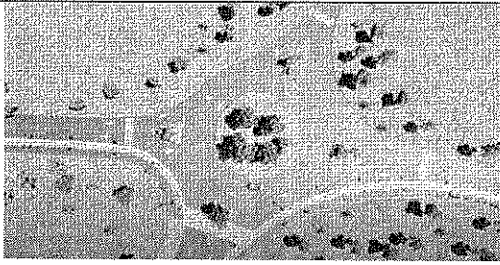


Antes

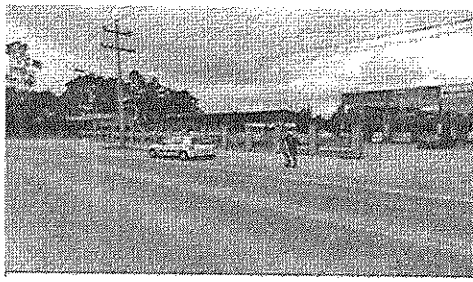


Durante

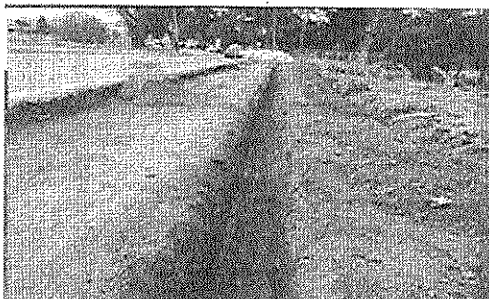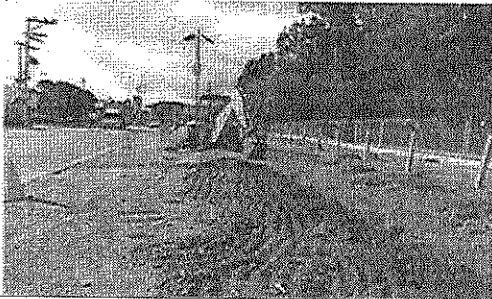

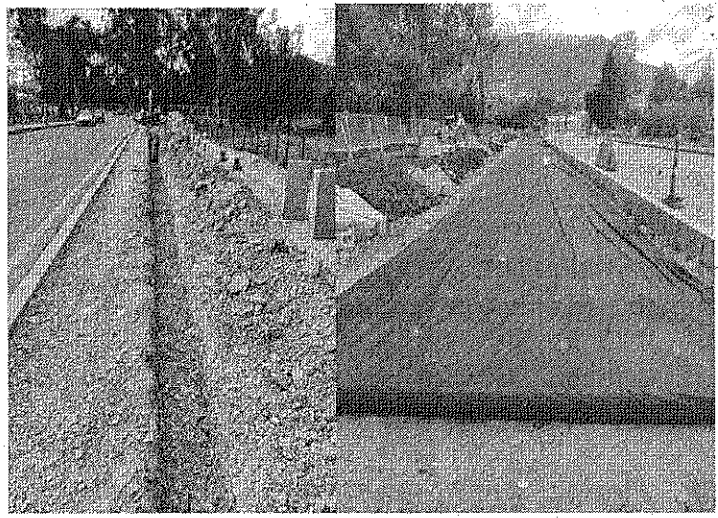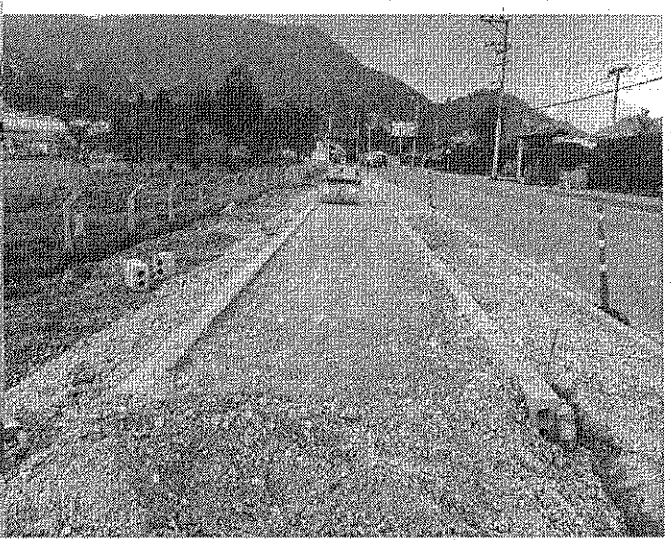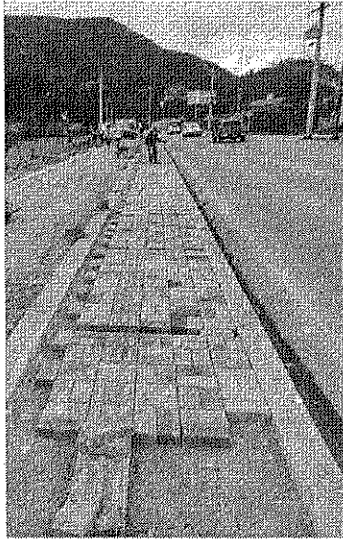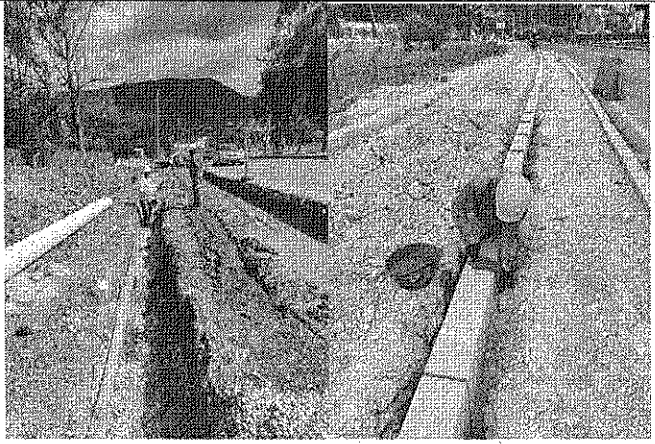

Después



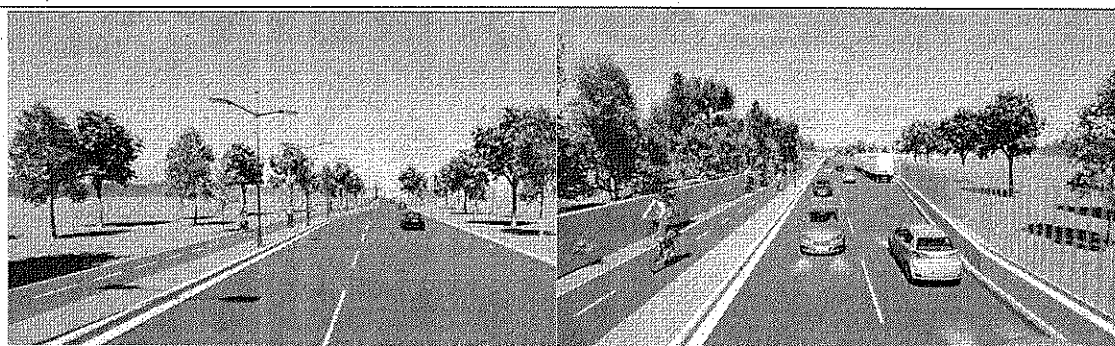

## **AÑO 2021**

**17.Meta de producto:** Desarrollar 4 proyectos de espacio público efectivo.

- **Descripción: Actividades Realizadas para el cumplimiento de la Meta**

Durante la ejecución del contrato de consultoría CM-2020-0550 y de interventoría CM-2020-0557 se ejecutaron al 100% los estudios y diseños de cinco (05) parques en zonas verdes de cesión que pertenecen al municipio, con el fin de generar un urbanismo y paisajismo adecuado que embellecen y garantizan la utilidad del espacio público efectivo del municipio. Los parques se encuentran localizados en El Chuscal, Jardín del Norte y Rosales; este último ya se encuentra radicado en el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU para la gestión de recursos.


En la ejecución del contrato CM-2021-0419 se realizó el análisis de la problemática que se presenta en la movilidad del corredor vial y espacio público; por lo cual se está realizando el diseño del espacio público independizando los diferentes flujos de movilidad, ordenando el espacio público y demás factores relacionados con la problemática. Los diseños se radicaron en la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) para obtener el permiso de uso debido a que el espacio público es administrado por esta agencia.

Existen predios resultado de las operaciones urbanísticas que no han sido integrados al entorno y esto produce inseguridad, desorden urbanístico por lo que se han realizado diseño que permitan el desarrollo de estas zonas con mobiliario y generación de espacios que puedan ser usados por la comunidad y cuidados por ellos mismos.

- **Registro Fotográfico**

- **Localización general dentro del casco urbano:**




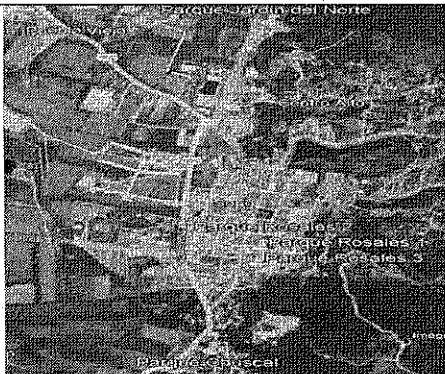


- Parque El Chuscal:



- Parque Jardín del Norte:

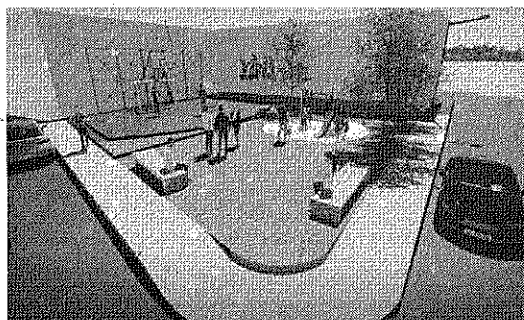


- Parque Rosales 1:

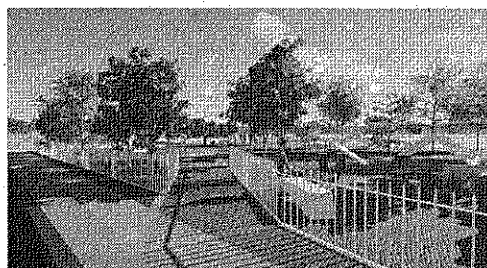


- Parque Rosales 2:



- Parque Rosales 3:

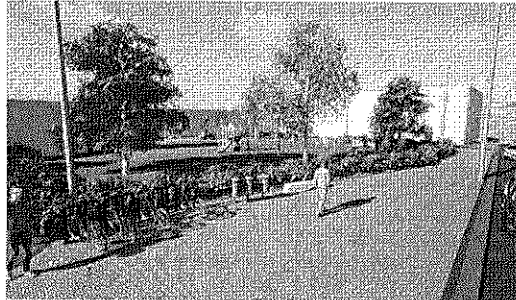

- Alameda Briceño:

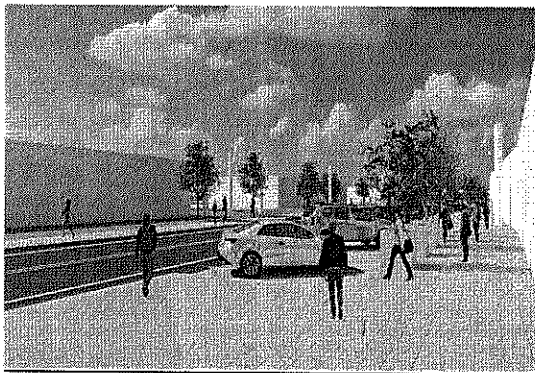

#### AÑO 2020

**18.Meta de producto:** Mantener y/o mejorar integralmente 20.000 mts2 de espacio público existente

#### Descripción:

Se realizó la reparación del andén en adoquín ubicado en la Cll 4 con Cra 4, reparación del andén ubicado en la Cra 5 con Cll 2, los cuales presentaban hundimiento.

Se ha adecuado y recuperado el espacio del Centro de Eventos, el cual se encontraba subutilizado.

Reparación de materas y andenes en la ClI 4 con Cra 1, los cuales presentaban daño por las raíces de los árboles.


Se construyó sendero en Mercenario con mano de obra de la administración municipal.

Se realizó convenio interadministrativo con EMSERSOPO con el fin de realizar actividades de ornato, mantenimiento y adecuación del espacio público adyacente a la red vial, espacio público en general y zonas verdes.


Se realizó convenio interadministrativo con EMSERSOPO con el fin de realizar mantenimiento y limpieza de Box Culvert, rejillas, cunetas, cárcamos, sumideros y zonas duras de espacio público.

➤ **Registro Fotográfico**


**Intervención Andén Calle 4 con Carrera 4**

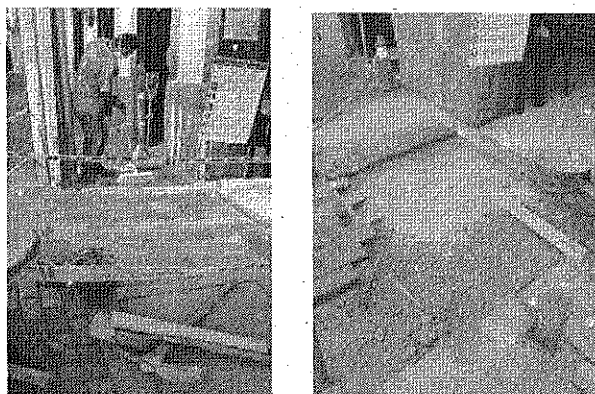

**Intervención Andén Carrera 5 con Calle 2**

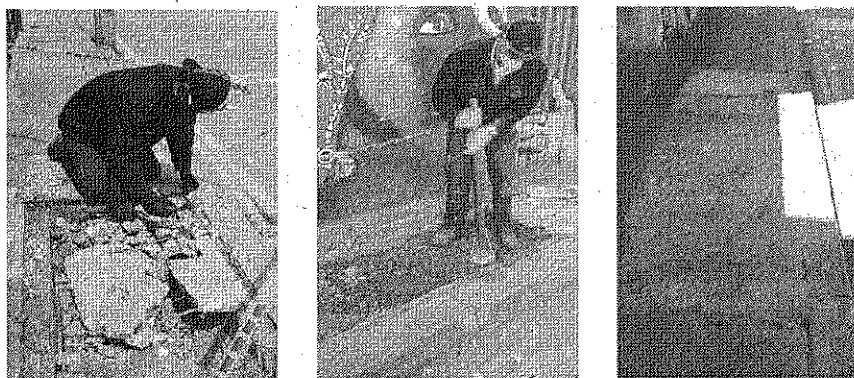


### **Adecuación de la infraestructura del Centro de Eventos**

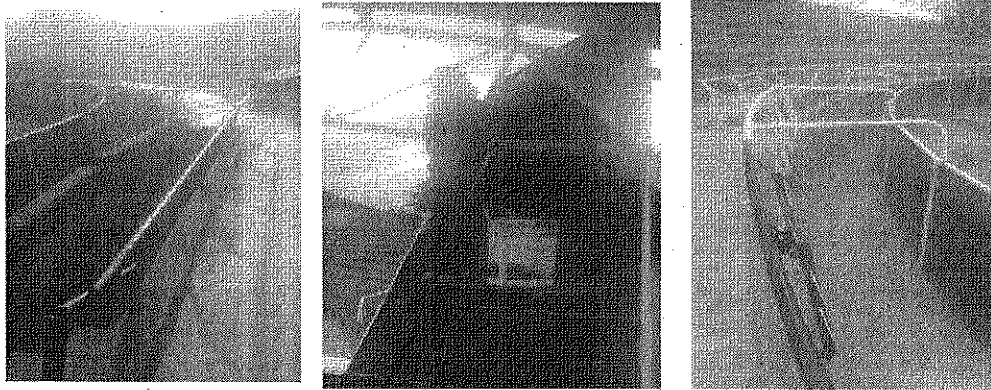

### **Reparación de materas y andenes en la Cll 4 con Cra 1**





### **Construcción Sendero Mercenario**

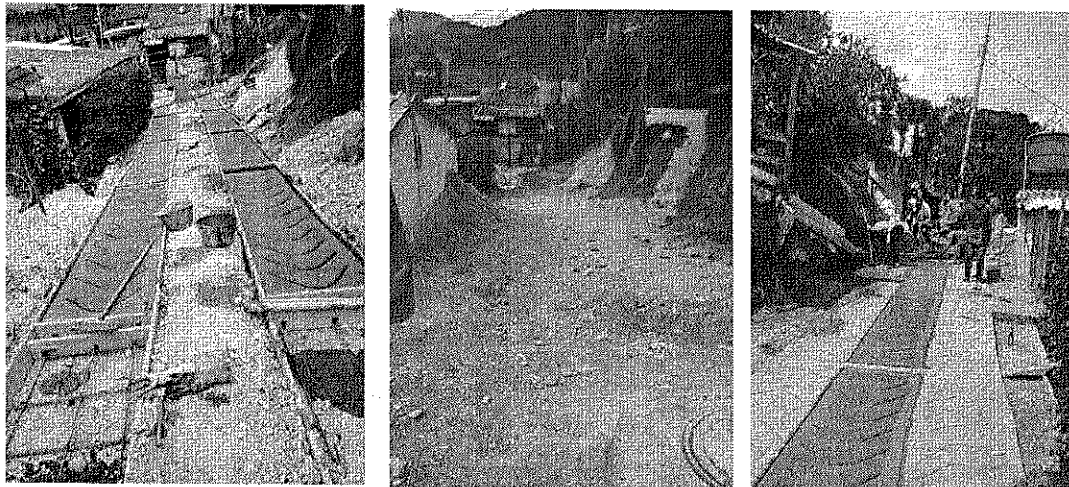

### **Ornato, mantenimiento y adecuación del espacio público**

**MANTENIMIENTO DE ZONAS DURAS Y ADOQUINADAS (20 sectores)**




Parque principal, parque de los Pinos, parque de la vida, sector San Felipe, Primera de Mayo, sector terminal de transporte, sector coliseo, sector Los Andes, Acceso parque Chuscal, sector del cementerio, Cerrito, Rincón del Norte, San Agustín, Ciclo ruta Pueblo Viejo. Parque paralelo al salón comunal Pueblo Viejo, Parque Pueblo viejo sector Niño.

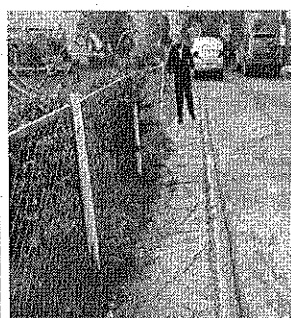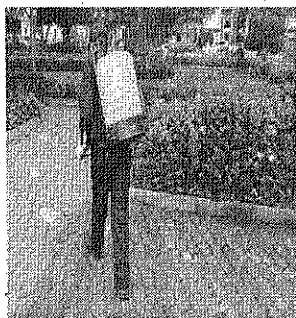

**Mantenimiento y limpieza de Box Culvert, rejillas, cunetas, cárcamos y sumideros**

**SUMIDEROS (152 unidades)**

Casco urbano del Municipio de Sopó se priorizaron en los sectores de (carreras 1-2-3-4-5 y calle 3 sur a calle 4).





**AÑO 2021**

**18.Meta de producto:** Mantener y/o mejorar integralmente 20.000 mts2 de espacio público existente

- **Descripción: Actividades Realizadas para el cumplimiento de la Meta**

A través del convenio D-CV-0010, entre el Municipio de Sopó y la empresa de servicios públicos EMSERSOPÓ, se realizaron las labores de podas y jardinería dando cumplimiento al mantenimiento de las áreas públicas de las que disfrutan los habitantes del municipio. Esto con el fin de preservar y evitar que el crecimiento excesivo de la vegetación, deteriore las diferentes instalaciones.

Los sectores que fueron objeto de estas intervenciones se relacionan a continuación:

- Corte de césped en zonas verdes preestablecidas y mantenimiento de zonas duras contiguas a las zonas verdes como andenes, alamedas, sardineles, bordillo – incluye retiro y disposición de material en sitio autorizado.

SECTOR	CANTIDAD m <sup>2</sup>	REPETICIONES	CANTIDAD TOTAL
PARQUE SAUCES	170	2	340
PARQUE LOS ROSALES	1565	3	4695
PARQUE LOS PINOS	991	2	1982
PARQUE TESTIGOS DE JEHOVÁ	957	3	2871
PARQUE DETRÁS DEL CEMENTERIO	1568	3	4704
PARQUE PRINCIPAL	1719	5	8595
PARQUE LOS ANDES	276	3	828
PARQUE DE LA VIDA	671	2	1342
PARQUE ZALAMEA	50	3	150
PARQUE	2487	3	7461


INFANTIL BOSQUETIVA Y ZONA CARRILERA			
PARQUE FELIX SAMANIEGO	189	3	567
PARQUE PRIMERA DE MAYO	208	2	416
SECTOR EL CERRITO	467	1	467
SECTOR LA TRINIDAD	434	2	868
CARRERA 5	2030	2	4060
BRICEÑO	3248	3	9744
BRICEÑO COLISEO	61	2	122
ALAMEDA VIA ANCIANATO-BELLAVISTA	272	2	544
ALAMEDA VÍA SALON COMUNAL SAN AGUSTIN	103	2	206
GLORIETA ALPINA	84	3	252
CONCHA ACUSTICA ZONA EXTERIOR	2065	1	2065
CONCHA ACUSTICA ZONA INTERIOR	2930	2	5860
LUDOTECA	609	4	2436
PUNTO VIVE DIGITAL	622	3	1866
TRANSVERSAL SEXTA	4644	2	9288
PUEBLO VIEJO-CACIQUE SOPO	2083	2	4166
PUEBLO	3171	2	6342

VIEJO SALON COMUNAL			
CASA DE LA JUVENTUD	60	2	120
ALAMEDA HACIA SANTUARIO	450	1	450
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL POMBO- HATO GRANDE	4282.66	2	8565.32
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL POMBO- BRICEÑO	7534.64	2	15069.28
PUEBLO VIEJO SECTOR NIÑO	1150		0
ALAMEDA VIA SALON COMUNAL SAN AGUSTIN	103		0
ALAMEDA MONTANA	201	1	201
COLEGIO CEIS	11199	2	22398
CONJUNTO VALLE SOPO ZONA INTERIOR	3968	1	3968
CENTRO DIA	3132	1	3132
CONJUNTO VALLE SOPO ZONA EXTERIOR	749	1	749
INSTITUCION EDUCATIVA SAN GABRIEL	2964	1	2964
SALON COMUNAL VEREDA MERCENARIO	796	1	796
INSTITUCION EDUCATIVA LA VIOLETA	5411	1	5411
SALON COMUNAL VEREDA GRATAMIRA	214	1	214


PARQUE INFANTIL VEREDA GRATAMIA	276	1	276
INSTITUCION EDUCATIVA MEUSA	1768	1	1768
PARQUE CHUSCAL	1437	1	1437
CENTRO DE DESPACHO	43.71	1	43.71
SALON COMUNAL VEREDA CAROLINA ALTA	590	1	590
SALON COMUNAL BELLAVISTA	2219	2	4438
COLEGIO VEREDA COMUNEROS	2159	1	2159
PARQUE BIOSALUDABLE SAN AGUSTÍN	456.5	1	456.5
PARQUE JARDIN DEL NORTE	461.25	1	461.25
<b>TOTALES</b>	<b>85298.76</b>		<b>157904.06</b>

Este convenio también tiene integrado el mantenimiento de las estructuras hidráulicas de box Couvert, alcantarillas, cárcamos ubicados en las vías con lo cual se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los espacios públicos pertenecientes a las vías.

- **Registro Fotográfico**

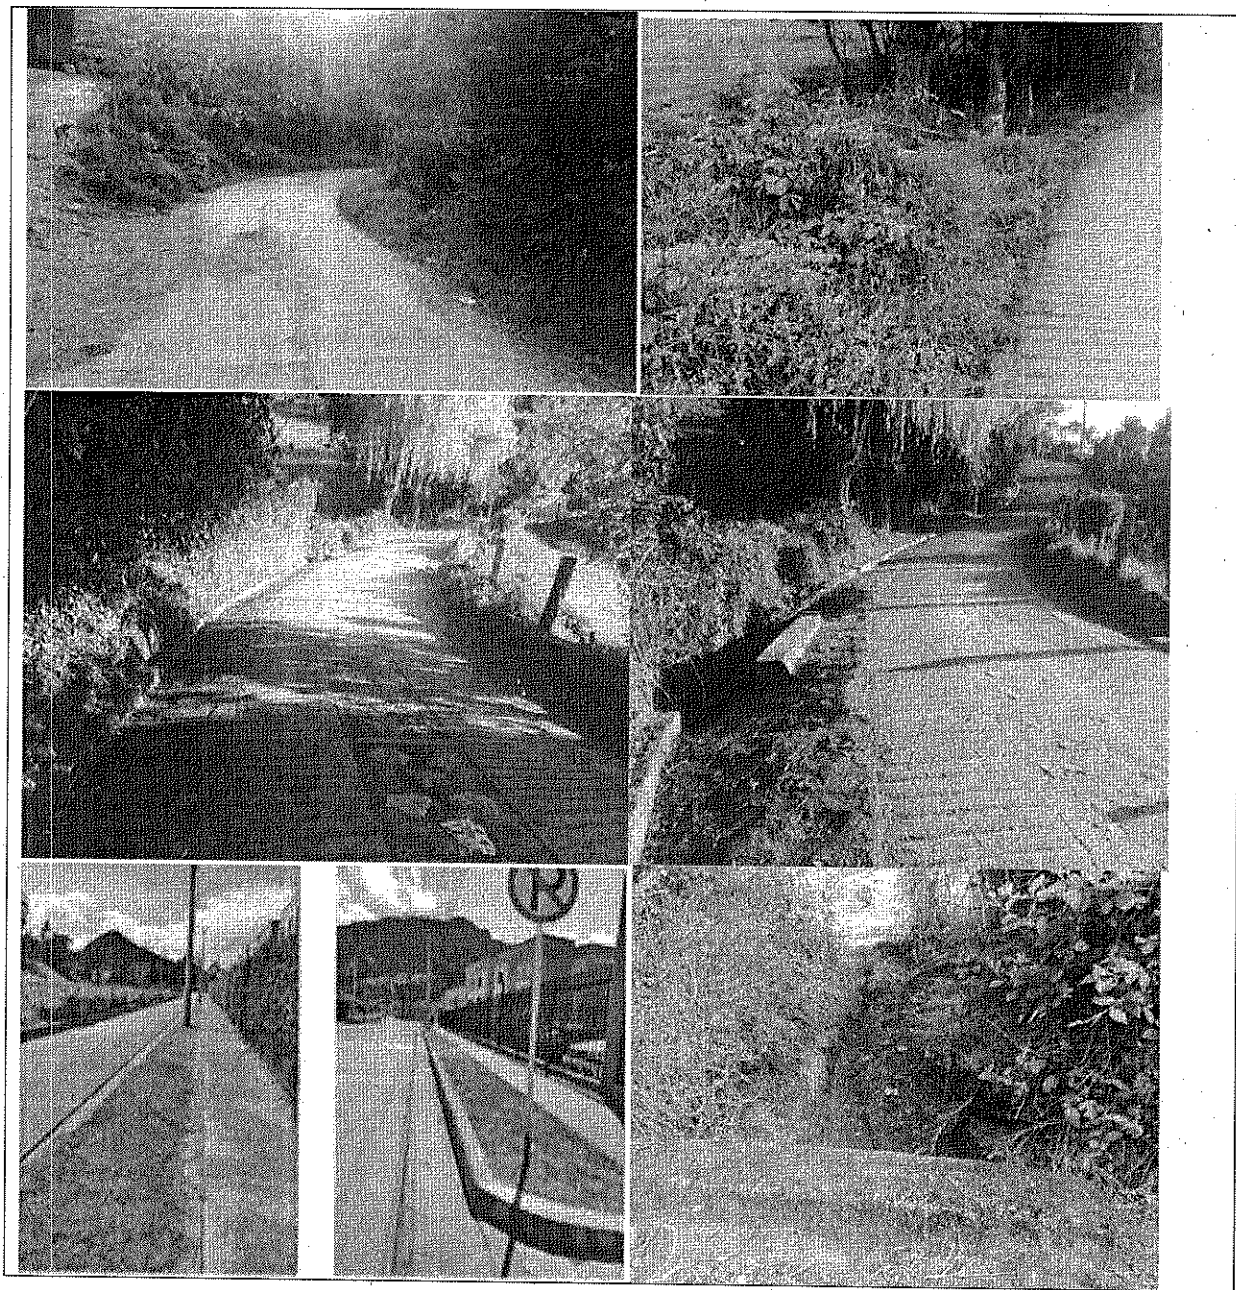



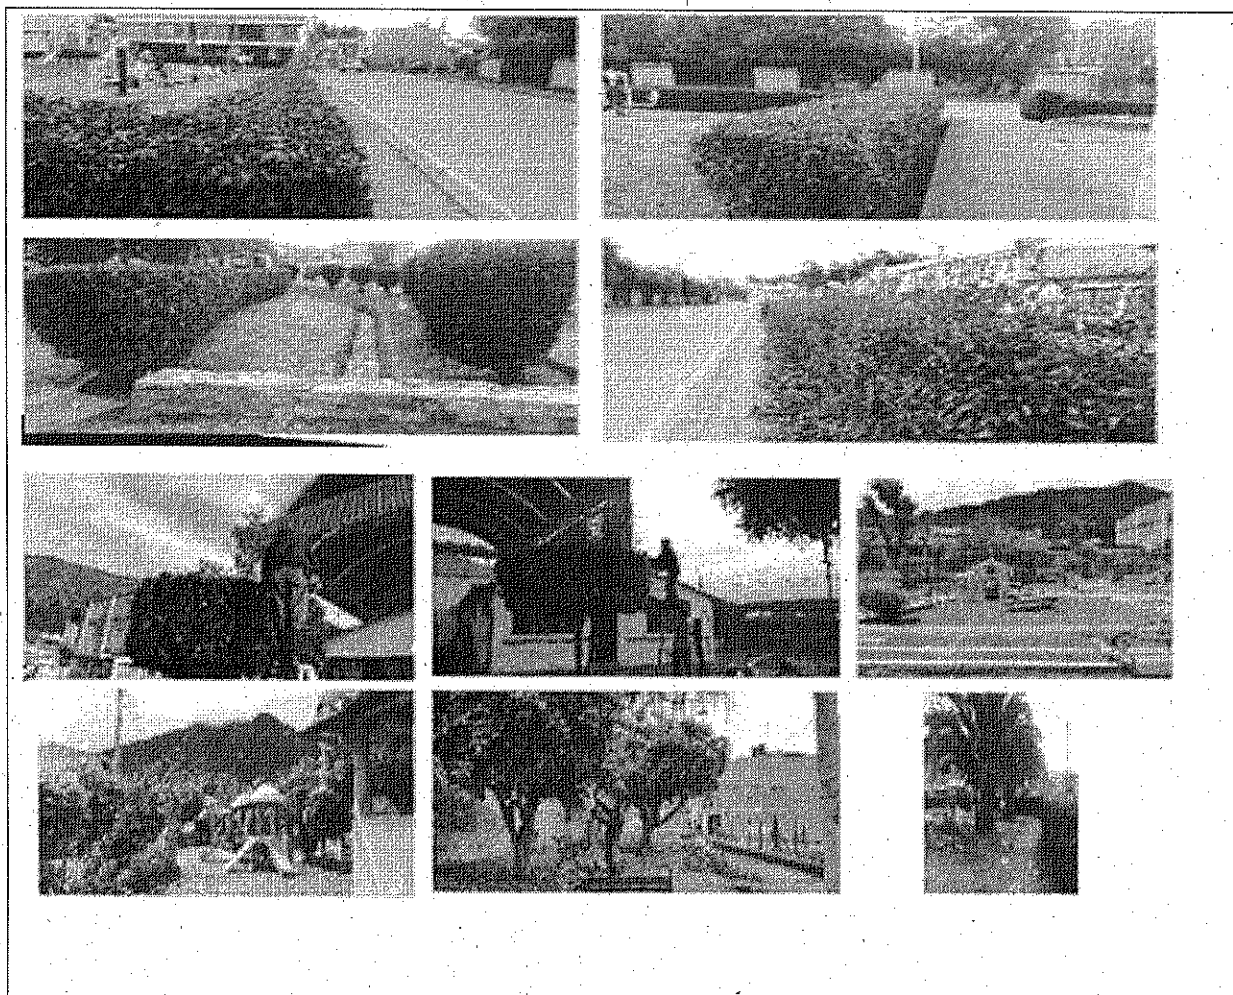

### AÑO 2022

**18.Meta de producto:** Mantener y/o mejorar integralmente 20.000 mts2 de espacio público existente.

**Descripción:** A través de los convenios D-CV-2021-0010 y D-CV-2022-0009, entre el Municipio de Sopó y la empresa de servicios públicos EMSERSOPÓ, se realizaron las labores de podas y jardinería dando cumplimiento al mantenimiento de las áreas públicas de las que disfrutan los habitantes del municipio. Esto con el fin de preservar y evitar que el crecimiento excesivo de la vegetación, deteriore las diferentes instalaciones.

Los sectores que fueron objeto de estas intervenciones se relacionan a continuación:

- Corte de césped en zonas verdes preestablecidas y mantenimiento de zonas duras contiguas a las zonas verdes como andenes, alamedas, sardineles, bordillos – incluye retiro y disposición de material.

Sector	Contrato 51 de 2021	Contrato 39 de 2022	TOTAL
--------	---------------------	---------------------	-------

	Cantidad (m2)	Cantidad (m2)	Frecuencia	Sub Total (m2)	
Parque Sauces		461,32	2	922,64	922,64
Parque Los Rosales	1970,48	1970,48	2	3940,96	5911,44
Parque Los Pinos	1375,02	1375,02	2	2750,04	4125,06
Parque Testigos de Jehová	1080,86	1080,86	2	2161,72	3242,58
Parque detrás del cementerio	1808,96	1808,96	1	1808,96	3617,92
Parque Principal	1862,84	1200,00	3	3600,00	5462,84
Parque Los Andes	352,24	352,24	1	352,24	704,48
Parque La Vida	458,95	458,95	2	917,9	1376,85
Parque Zalamea		104,28	3	312,84	312,84
Parque Rincón Norte	614,51	614,51	1	614,51	1229,02
Parque chuscal		1040,00	1	1040,00	1040,00
Parque Jardín del Norte Paidocentro		249,00	1	249,00	249,00
Parque La Diana		227,00	1	227,00	227,00
Parque Félix Samaniego	225,60	225,60	2	451,2	676,80
Bósquetiva		969,84	1	969,84	969,84

Briceño Áreas Ferrocarril		3675,00	1	3675,00	3675,00
Zona Verde - exterior Hospital		320,00	1	320,00	320,00
Briceño Quintas de Briceño Paidocentro		320,00	1	320,00	320,00
Briceño Centro Comercial Cerro Fuerte		300,00	1	300,00	300,00
San Agustín Paidocentro, Bioparque		458,00	1	458,00	458,00
Concha Acústica - Zona exterior		2065,00	2	4130,00	4130,00
Concha Acústica - Zona interior		2640,00	2	5280,00	5280,00
Pueblo Viejo -Salón Comunal		1870,39	3	5611,17	5611,17
Salón Comunal Bellavista Paidocentro y Bioparque		1040,00	2	2080,00	2080,00
Pueblo Viejo - Sector niño		741,77	2	1483,54	1483,54
Gratamira Salón Comunal y Cancha		243,00	2	486,00	486,00
Mercenario Salón Comunal		404,00	1	404,00	404,00
Centro Alto Salón Comunal Bioparque y Paidocentro		298,50	1	298,50	298,50

Quintas de Ceramita		5016,20	1	5016,20	5016,20	
Briceño Coliseo		61,00	1	61,00	61,00	
Centro de Integración Cultural C.I.C.	3862,22	3862,32	1	3862,32	7724,54	
Complejo La Trinidad	17960,00				17960,00	
Pueblo Viejo parque infantil sector Niño	741,77				741,77	
<b>TOTAL</b>					<b>86418,03</b>	

<b>RESUMEN ÁREAS INTERVENIDAS</b>	
<b>SECTOR</b>	<b>CANTIDAD (M2)</b>
<b>ESPACIO PÚBLICO</b>	
Parque Sauces	461,32
Parque Los Rosales	1.970,48
Parque Los Pinos	1.375,02
Parque Testigos de Jehová	1.080,86
Parque detrás del cementerio	1.808,96
Parque Principal	1.200,00
Parque Los Andes	352,24

Parque La Vida	458,95
Parque Zalamea	104,28
Parque Rincón Norte	614,51
Parque Chuscal	1.040,00
Parque Jardín del Norte	249
Parque La Diana	227
Parque Félix Samaniego	225,6
Bosquetiva	969,84
Briceño áreas Ferrocarril	3.675,00
Zona Verde - exterior Hospital	320
Briceño Quintas de Briceño Paidocentro	320
Briceño Centro Comercial Cerro Fuerte	300
San Agustín Bioparque	458
Concha Acústica - Zona exterior	2.065,00
Concha Acústica - Zona interior	2.640,00
Pueblo Viejo -Salón Comunal	1.870,39




Salón Comunal Bellavista y Bioparque	1.040,00
Pueblo Viejo - Sector niño	741,77
Gratamira Salón Comunal y Cancha	243
Mercenario Salón Comunal	404
Centro Alto Salón Comunal Bioparque	298,5
Quintas de Ceramita	5.016,20
Briceño Coliseo	61
Centro de Integración Cultural - C.I.C.	3.862,32
Complejo La Trinidad	17.960,00
Pueblo Viejo parque infantil sector Niño	741,77
<b>TOTAL ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>54.155,01</b>

En estos convenios se realiza también la limpieza y el mantenimiento rutinario de la infraestructura de drenaje de aguas lluvias de las vías y áreas públicas del municipio, a continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas en la vigencia.

- **Registro Fotográfico**

Parque Los Sauces:

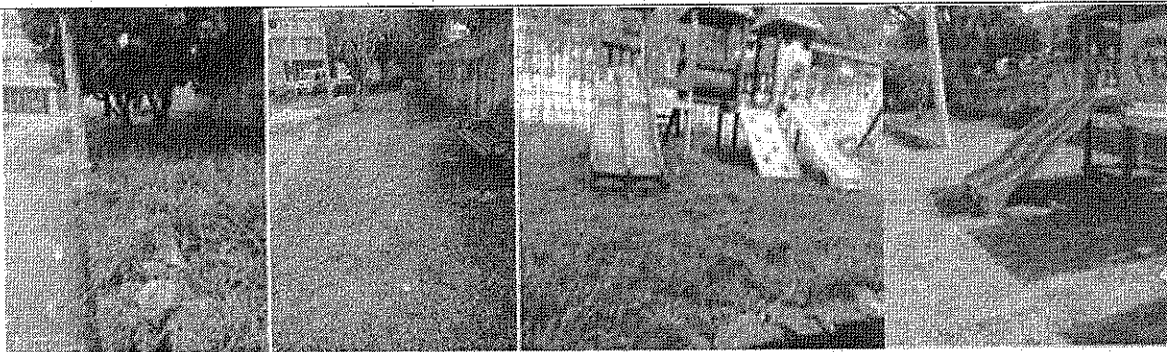


ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

Parque Los Pinos:

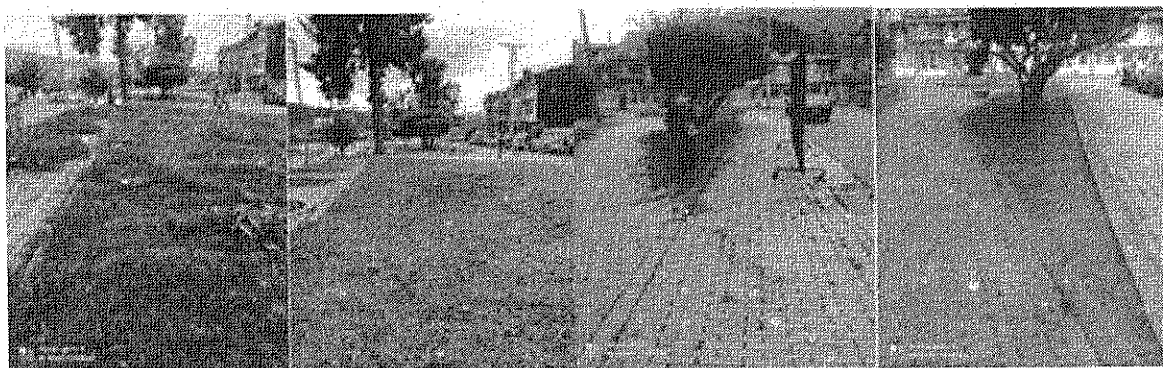

ANTES

DESPUÉS


ANTES

DESPUÉS

Parque Principal:







ANTES

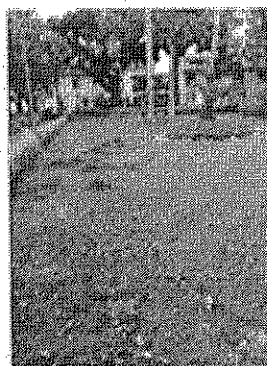

DESPUÉS



Zona exterior hospital y Alpina:

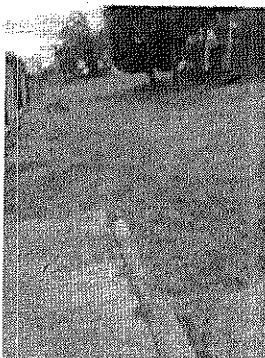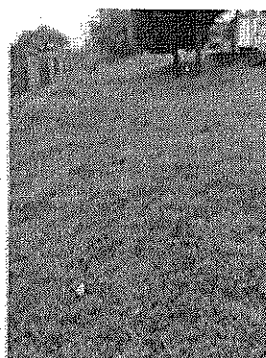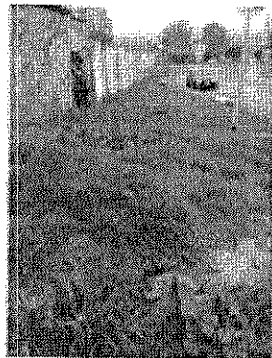


ANTES

DESPUÉS

Quintas de Briceño:

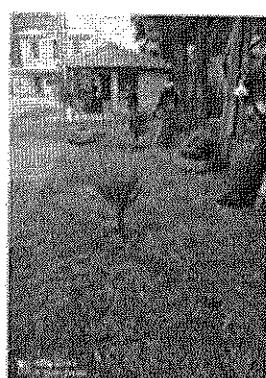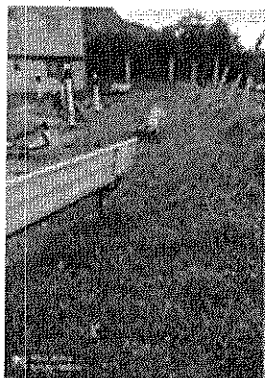

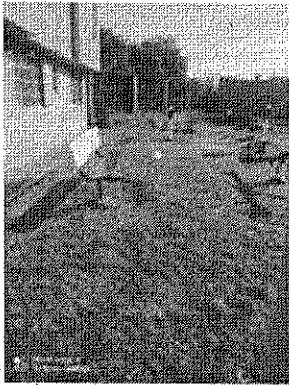


ANTES




DESPUÉS

Concha acústica:



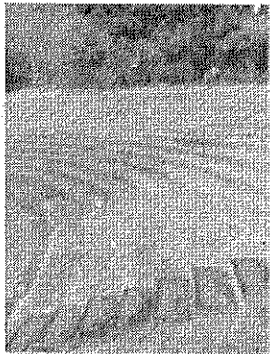


ANTES

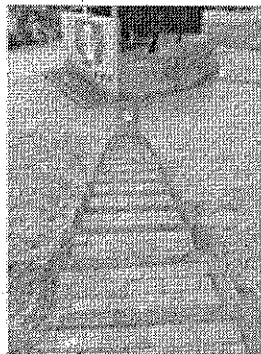

DESPUÉS



Pueblo Viejo salón Comunal:

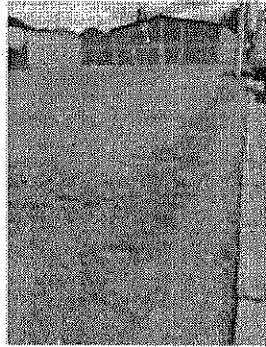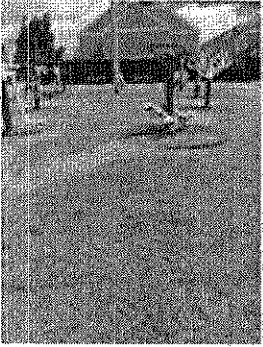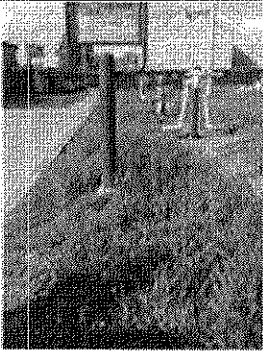

ANTES

DESPUÉS

Gratamira salón comunal y cancha:

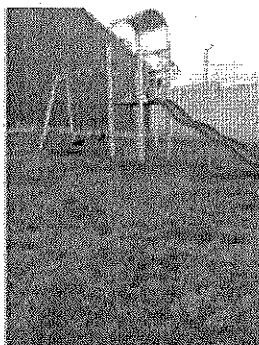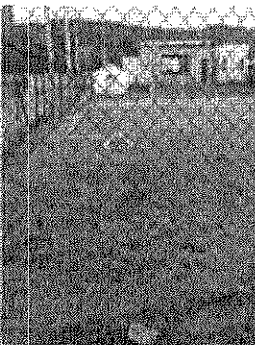

ANTES

DESPUÉS



### Salón Comunal Mercenario:





ANTES



DESPUÉS



### Parque Briceño:

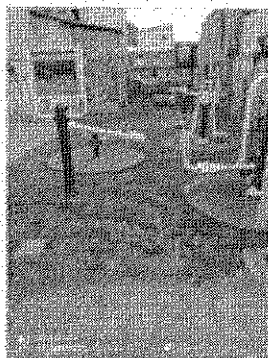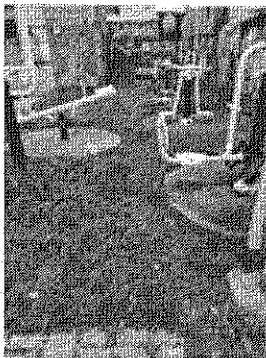

### **AÑO 2023.**

**18. Meta de producto:** Mantener y/o mejorar integralmente 20.000 mts2 de espacio público existente



**Descripción:** durante la vigencia se realizaron actividades de podas de parques, adecuación de zonas verde en el parque la trinidad, podas en el barrio san Agustín, parque principal, ptap, teusaca, parque los pinos, parque de la vida, poda por la ciclorruta de la variante, parque de los sauces, predio detrás del cementerio, poda detrás de cabaña alpina, fumigación parque principal, salón comunal Bellavista, Parque primero de mayo, parque los sauces y espacio público detrás del hospital.

	<b>Sector</b>	<b>Área (m2)</b>	<b>Frecuencia</b>
1	podas en el barrio san Agustín	50	Ocasionalmente
2	podas parque principal	1132	Semanal
3	Podas ptap Teusaca	1000	Ocasionalmente
4	Podas parque los pinos	750	Frecuentemente
5	Podas parque de la vida	680	Frecuentemente


6	poda por la ciclorruta de la variante	300	Frecuentemente
7	parque de los sauces	800	Frecuentemente
8	predio detrás del cementerio	1205	Ocasionalmente
9	fumigación parque principal	800	Frecuentemente
10	salón comunal Bellavista	100	De vez en cuando
11	Parque primero de mayo	50	Ocasionalmente
12	espacio público detrás del hospital	250	Ocasionalmente

## REGISTRO FOTOGRÁFICO:


### San agustin:

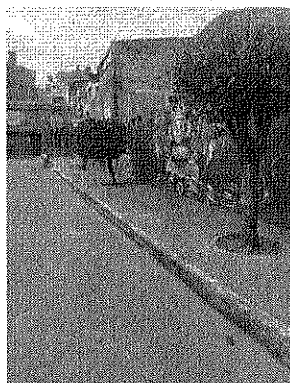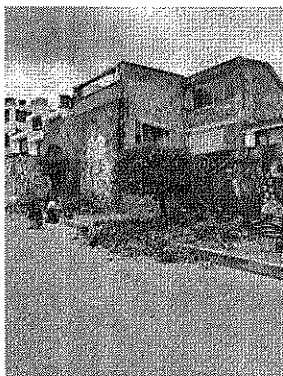


### Parque principal

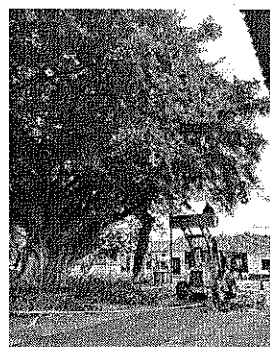


### Ptap Teusaca

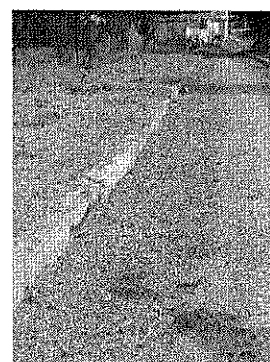

Parque de los pinos

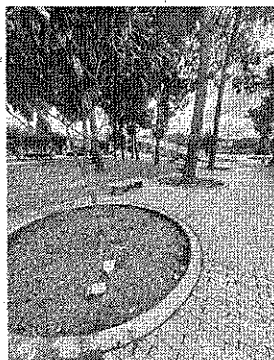



Parque de la vida

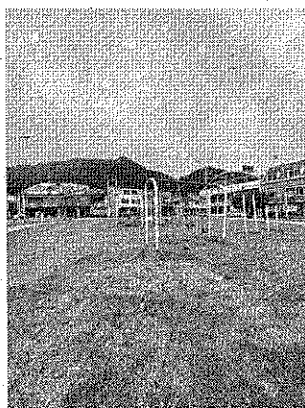


Parque los Sauces



Detrás del cementerio

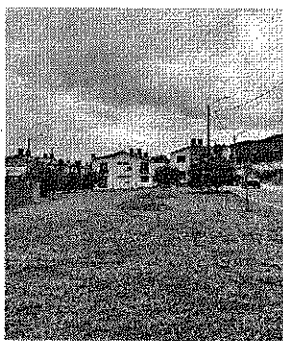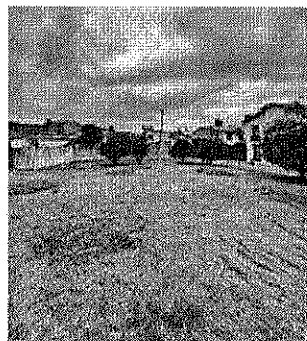

Parque primero de mayo

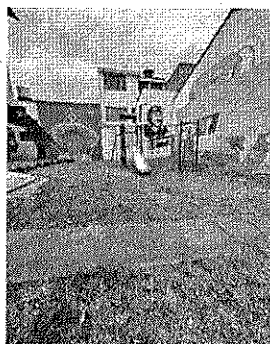

## **AÑO 2020**

**19.Meta de producto:** Realizar mantenimiento al 100% de infraestructuras deportivas, educativas, de salud, incluyentes, medioambientales, turísticas, de emprendimiento, agropecuarias, administrativas, culturales y de espacio público

**Descripción:** Se deja contratado el mantenimiento, adecuación, mejoramiento y rehabilitación de las infraestructuras educativas, así como el Centro de Integración Cultural – CIC, del lago en el Complejo de la Trinidad y se dejó estructurado el mantenimiento del Centro Comercial Simón Bolívar, de la Adecuaciones batería sanitaria de la concha acústica, adecuaciones del hogar de paso canino y ampliación del campo de vóley playa.

También se realizó la limpieza del lago y queda contratada la construcción del cerramiento del mismo.

Por otra parte, se realizaron adecuaciones y mantenimiento al Palacio Municipal (en las secretaria de Control Interno, Prensa, Infraestructura, Despacho Alcalde, zonas de

circulación), infraestructura de la Antigua Policarpa se adecuó oficinas de medio ambiente y vivienda y Centro Comercial Simón Bolívar se adecuó sala de conciliaciones, despacho de gobierno, despacho de desarrollo económico, generando espacios adecuados para los funcionarios y comunidad.

Se adquirió herramientas para el grupo operativo y directamente atender actividades de mantenimiento.




Se realizó convenio interadministrativo con EMSERSOPO con el fin de realizar actividades de ornato, mantenimiento y adecuación del espacio público en general y zonas verdes de las instituciones educativas.

Se doto al grupo operativo de un juego de andamio certificado para realizar trabajo en alturas, previo a que fuera tomado por parte de los funcionarios su respectivo curso.

#### ➤ **Registro Fotográfico**

##### **Mantenimiento y limpieza del lago**

##### **Mantenimiento y adecuación del Palacio Municipal**

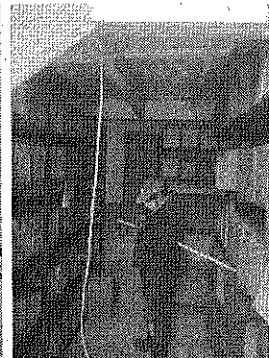
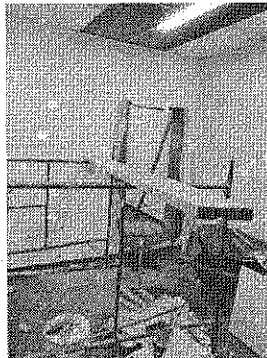





### Mantenimiento y adecuación de la infraestructura de la Antigua Policarpa




### Mantenimiento y adecuación del Centro Comercial Simón Bolívar

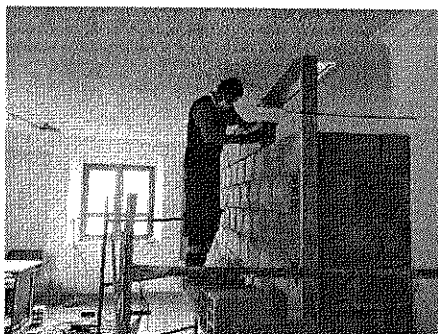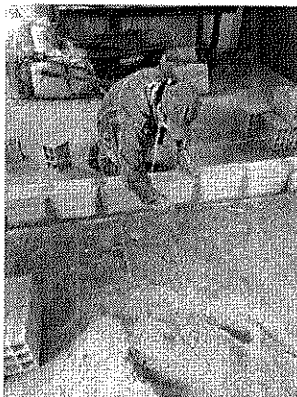


### Ornato, mantenimiento y adecuación de las instituciones educativas

Actividades de ornato, mantenimiento y adecuación del espacio público adyacente a la red vial, zonas públicas, zonas verdes de las instituciones educativas departamentales.

I.E.D. La Violeta, Colegio Pablo VI, Ludoteca centro y Jardín Departamental, Colegio La Violeta, I.E.D. Marco Fidel, I.E.D. Comuneros, I.E.D. Rafael Pombo sede Briceño, I.E.D. CEIS.

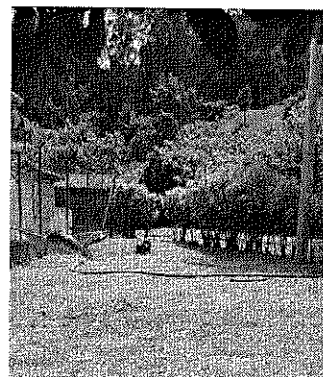

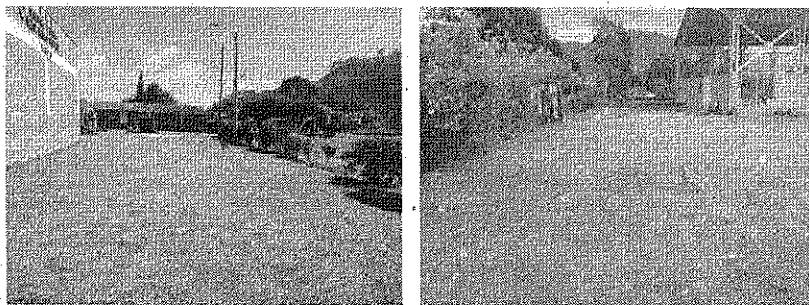

## AÑO 2021

**19. Meta de producto:** Realizar mantenimiento al 100% de infraestructuras deportivas, educativas, de salud, incluyentes, medioambientales, turísticas, de emprendimiento, agropecuarias, administrativas, culturales y de espacio público

**Descripción:** Mediante el contrato No. SA-2020-0555 se realizó el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación del Centro de Integración Cultural fase I, en donde se realizaron actividades de impermeabilización de cubierta, limpieza de bajantes, pintura interna y externa, demolición e instalación de piso en caucho, cambio de cielo rasos, intervención en instalaciones sanitarias, reposición de vidrios, mantenimiento del ascensor, entre otros.

Mediante el contrato No. SA-2021-0407 se realizó el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación del Centro de Integración Cultural - CIC fase II, que incluía actividades de impermeabilización de cubierta, pintura interna y externa, demolición e instalación de piso laminado, cambio de cielo rasos, cambio de luminarias, carpintería metálica, carpintería de madera, marquesinas, tanque de suministro de agua potable, entre otros.

Mediante el contrato No. SA-2020-0556 se realizó el mantenimiento, adecuación, mejoramiento y rehabilitación de las siguientes infraestructuras educativas:

Escuela Marco Fidel Suarez, se realizó la limpieza y el mantenimiento de la cubierta, mantenimiento de la cuneta y anden posterior.

Colegio CEIS, se realizó el mantenimiento de la impermeabilización de canales, cubiertas planas, y terrazas, y el mantenimiento del sistema de las bombas hidráulicas.

Escuela Meusa, se realizó el cerramiento frontal y adecuación de la puerta de acceso.

Colegio La Violeta, Se realizó el mantenimiento y adecuación de la red hidráulica, limpieza de tanques de almacenamiento e impermeabilización de la cubierta plana.

Colegio Rafael Pombo sede Briceño, se realizó el mantenimiento parcial del cerramiento perimetral, cambio de mallas del cerramiento, demolición y construcción de columnas del cerramiento.


Escuela Rafael Pombo sede Hato Grande, se realizó el cerramiento perimetral de la escuela, mantenimiento del cerramiento existente y adecuaciones de puertas de acceso.

Por otro lado, junto con el personal operativo se han adelantado las siguientes actividades, que fortalecen el mantenimiento de los espacios públicos:


- Adecuación oficina casa de Bolívar: Se realiza instalación de muros y techo en drywall, pintura y limpieza de los mismos. También adaptación de las puertas existentes en vidrio al espacio destinado.
- Demolición antigua policarpa: se realiza el retiro de tejas, ventanería y elementos de madera que aún se puedan aprovechar.
- Reparación de placa huella sector San Agustín: debido a que la placa huella ha mostrado grandes deterioros se realiza la demolición manual de los puntos críticos para reponer por rajón, las lajas desprendidas.
- Mantenimiento placas peatonales San Agustín: se realiza selección de las placas que aún tengan utilidad y se realiza el retiro de las que presentan mal estado. Posteriormente, se realiza la construcción de nuevas placas que conformarán el sendero peatonal en cuanto hayan cumplido sus días de fraguado.
- Se realiza poda de árboles en el sector Santuario, con el fin de mitigar el riesgo que generan las ramas expuestas a la vía y a las cuerdas eléctricas.
- Se realiza limpieza mecánica a las alcantarillas aledañas a fábrica San Lorenzo, esto con el fin de contribuir a la reparación de la zona aledaña.
- Instalación de 4 tanques de reserva de agua en la alcaldía municipal.
- Apoyo en evacuación de agua en las vías terciarias que así lo han requerido.
- Cambio de cubierta de Estación de Policía
- Reparación de placas huellas en el sector San Agustín
- Desmantelamiento de la edificación denominada Policarpa

- **Registro Fotográfico**




**Centro de Integración Cultural - CIC**

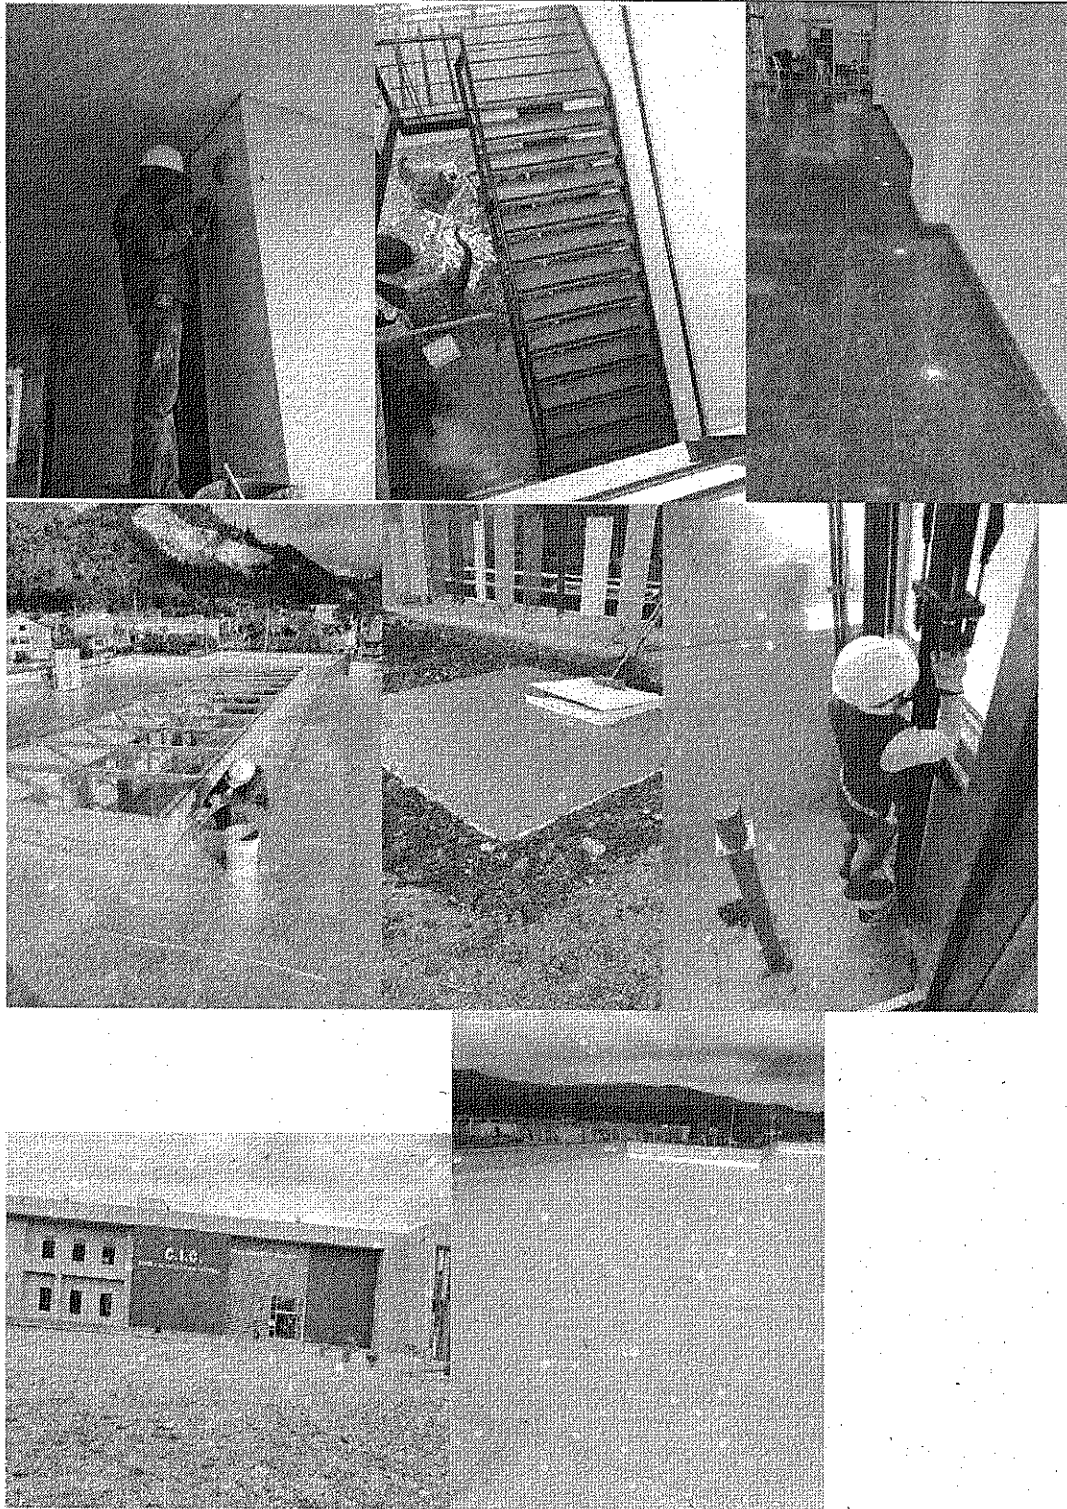

**Escuela Marco Fidel Suarez**

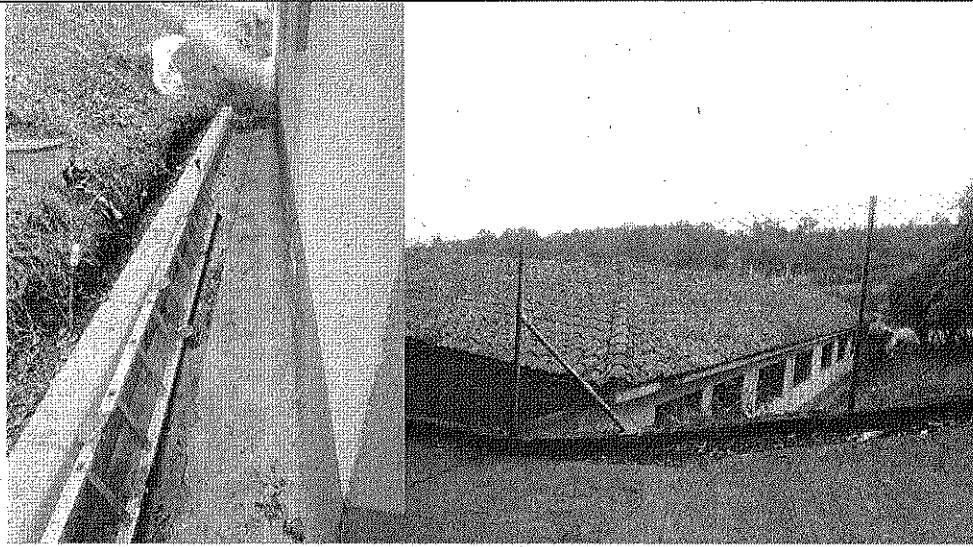


**Colegio CEIS**

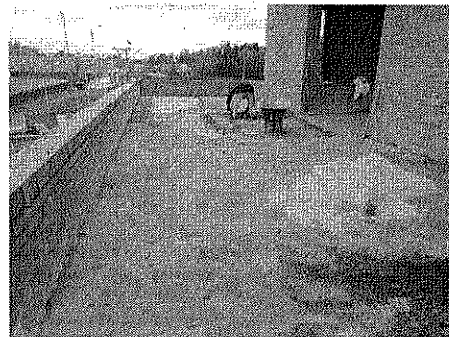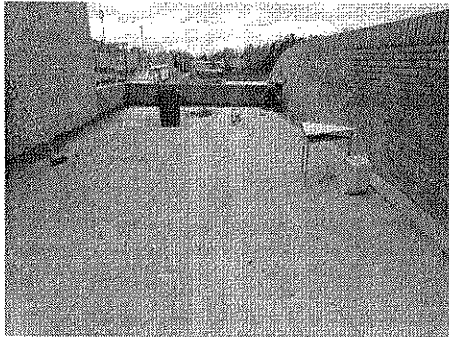
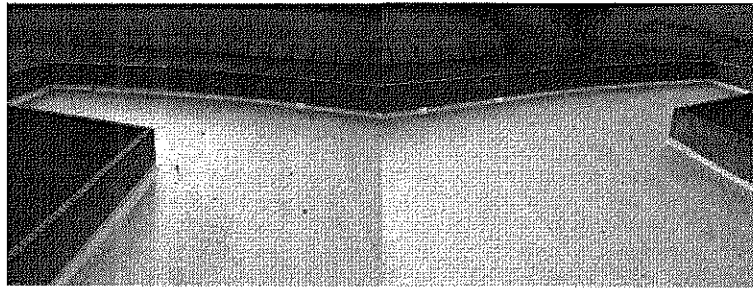


**Escuela Meusa**




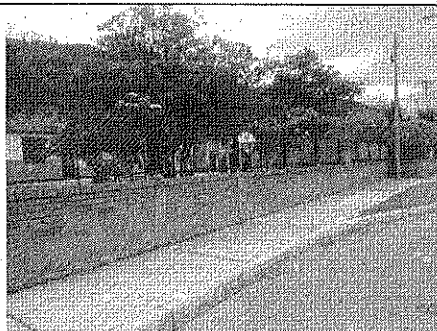


**Colegio La Violeta**

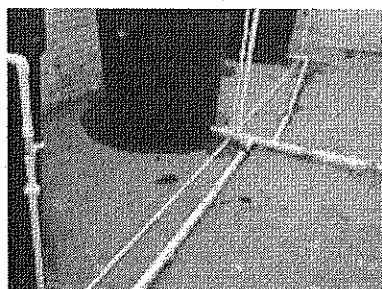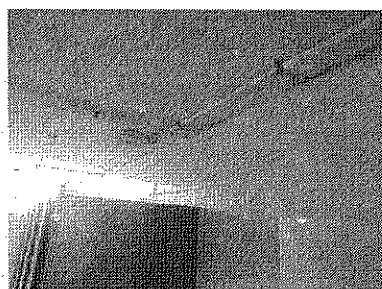



**Colegio Rafael Pombo sede Briceño**

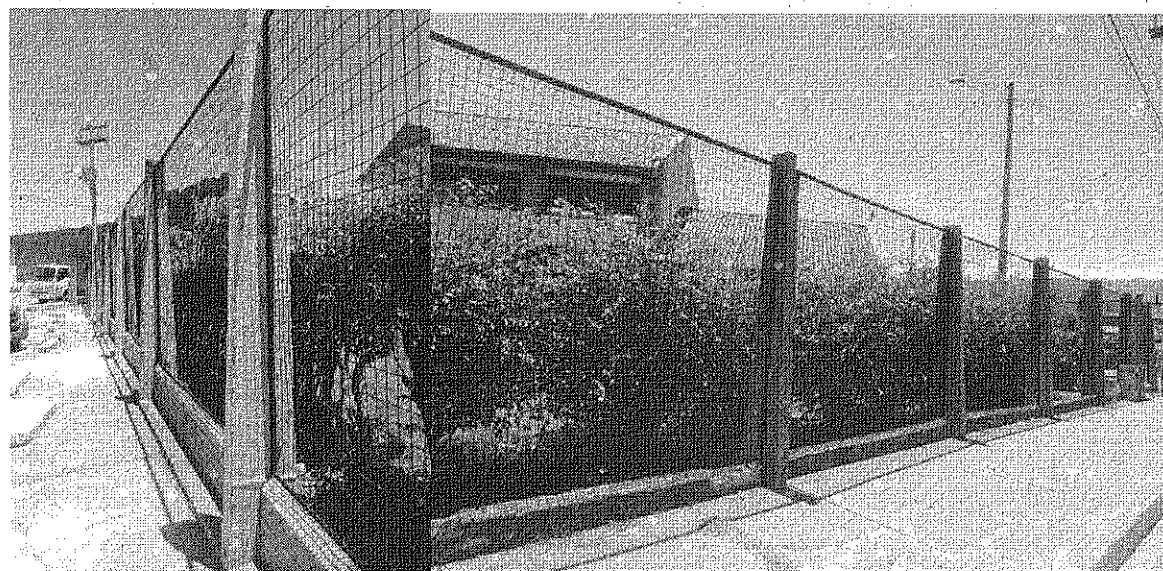


**Escuela Rafael Pombo sede Hato Grande**

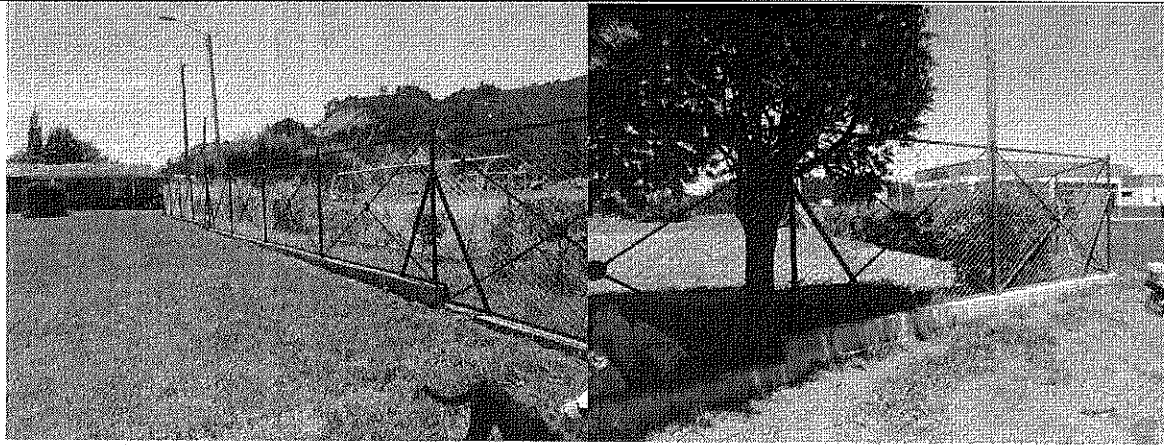

**Labores equipo operativo:**

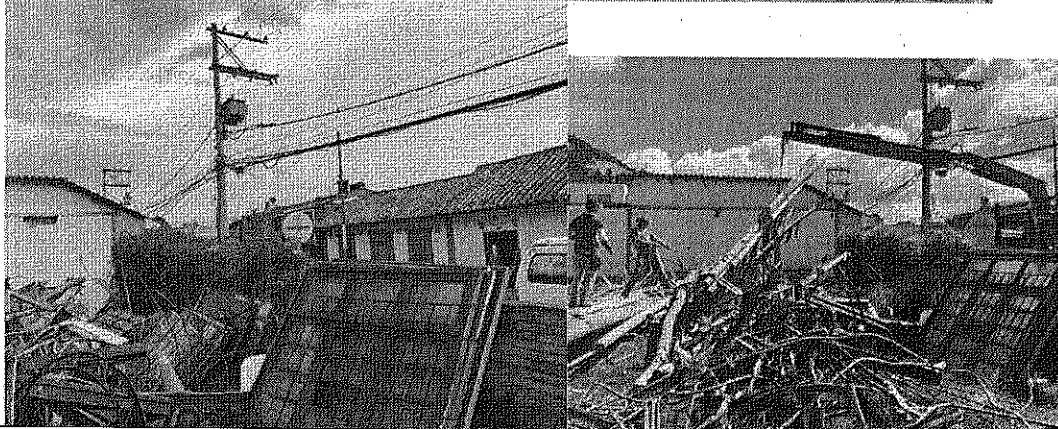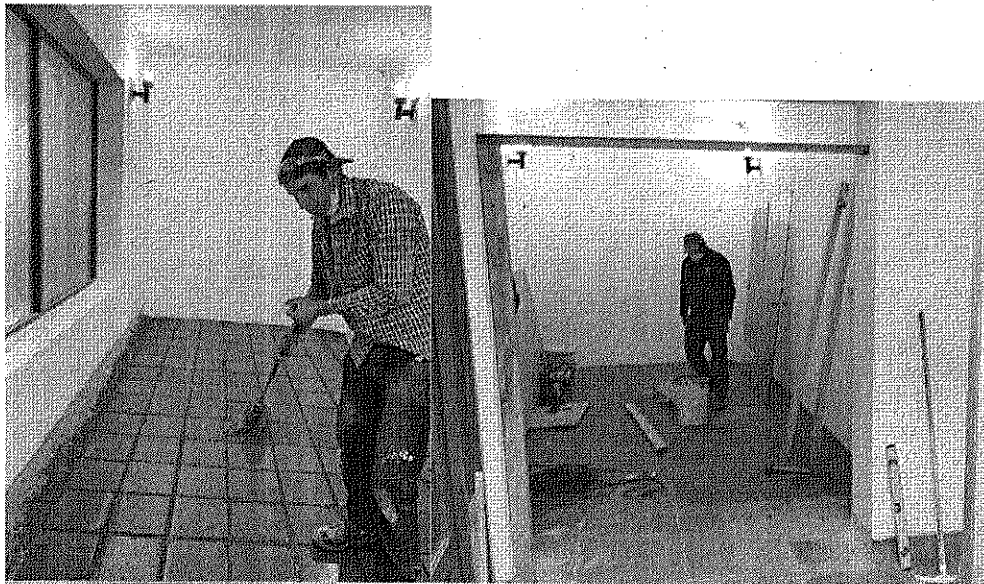

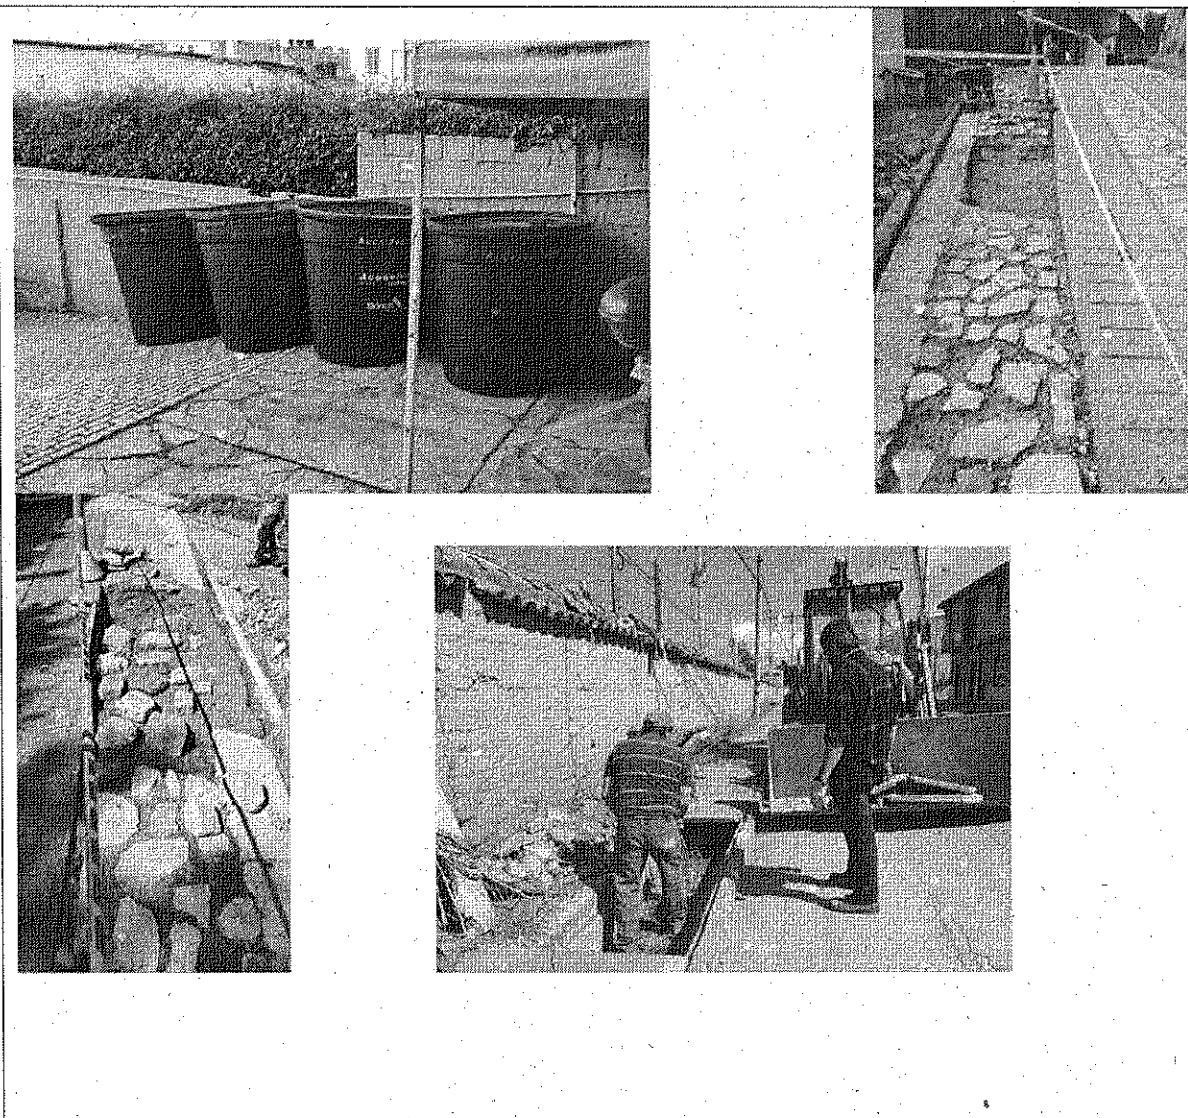

### AÑO 2022

**19.Meta de producto:** Realizar mantenimiento al 100% de infraestructuras deportivas, educativas, de salud, incluyentes, medioambientales, turísticas, de emprendimiento, agropecuarias, administrativas, culturales y de espacio público

**Descripción:** Mediante el contrato SA-2021-0570 se realizó el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la red de bibliotecas, concha acústica, campo de voleibol arena, instituciones educativas y centro de integración cultural C.I.C del municipio de Sopó, Cundinamarca, en cumplimiento del plan de desarrollo "Sopó es nuestro tiempo 2023".

En la ejecución de este contrato se realizaron actividades en las siguientes edificaciones:

- Red de Bibliotecas (Bibliotecas de San Gabriel, Chuscal, Hatogrande y Briceño): impermeabilización de cubierta, resanes y vinilo, desmonte e instalación de tejas.
- Batería sanitaria Concha acústica: se construyó la batería sanitaria con sus redes hidrosanitarias y eléctricas, carpintería metálica de puerta y ventanas, enchape y aparatos sanitarios. La batería está compuesta de dos (2) sanitarios, un (1) lavamanos, un (1) lavatraperos y un baño para personas con movilidad reducida compuesto de un (1) sanitario y un (1) lavamanos.
- Intervención en el campo de voleibol arena: se amplió la cancha de voleibol existente: se realizaron actividades de excavaciones, rellenos, demolición, sistema de drenaje, instalación de césped.
- Mantenimiento de instituciones educativas: se realizan actividades en el cerramiento del colegio Rafael Pombo Briceño, mantenimiento de la red hidráulica de la escuela de Meusa y el Colegio de la Violeta.
- Mantenimiento en el Centro de Interacción de Cultura - C.I.C.: Se realiza mantenimiento en los push de los baños, vinilo y ascensor.
- Intervención Casa de Bolívar: se realiza desmonte e instalación de nuevas canales y bajantes y limpieza de marquesinas.

Por otro lado, junto con el personal operativo se han adelantado las siguientes actividades, que fortalecen el mantenimiento de los espacios públicos:


- Polideportiva vereda Meusa: como complemento a la construcción de la cubierta de Meusa, se realiza la construcción del cerramiento perimetral y la rampa de acceso con el grupo operativo de la Secretaría de Infraestructura.
- Plaza de artesanos: se realizó el cambio en su totalidad del manto existente en la cubierta debido a que estaba presentado filtración en la edificación, para lo cual se realizó la nivelación del piso con concreto de 3000 PSI y se aplicó impermeabilizante fluido.
- Estación de policía de Sopó: El equipo profesional y operativo de la secretaría de Infraestructura solucionó los problemas de filtración que se presentaban, mediante la rehabilitación y cambio de la cubierta (242 M2) así como el mantenimiento de las baterías sanitarias.
- Centro Día: Se realizó la construcción del puente peatonal que de Centro Día conduce al predio contiguo correspondiente a La Trinidad, dicha intervención se realizó con los operarios de la secretaría de Infraestructura, de igual manera se realizó el traslado y recuperación del cuarto de herramientas de los usuarios, lo anterior al deterioro propio de la intemperie y del uso que venía sufriendo esta infraestructura.



- Complejo La Trinidad: se realizó el retiro y posterior instalación del parque infantil existente frente a las canchas de tenis, lo anterior se realizó debido al desarrollo de las obras del Skate Park.
- Casa de la Cultura: se realizó el traslado del muro divisorio en el archivo general ubicado en el segundo piso, debido a que el espacio existente no era suficiente, dicha ampliación se realizó con el personal operativo de la presente secretaría.

● **Registro Fotográfico**

Biblioteca San Gabriel:

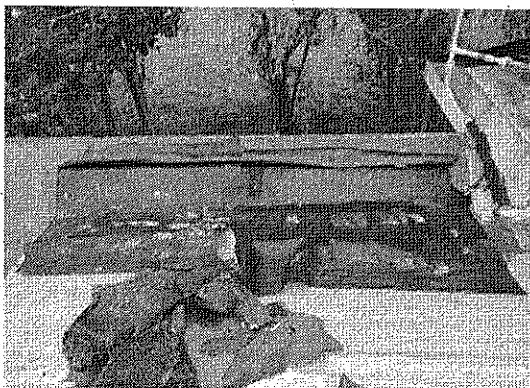

Retiro de manto existente



Instalación de impermeabilización

Batería sanitaria Concha acústica:




Terreno existente - estado inicial




Batería construida

Intervención en el campo de voleibol arena:



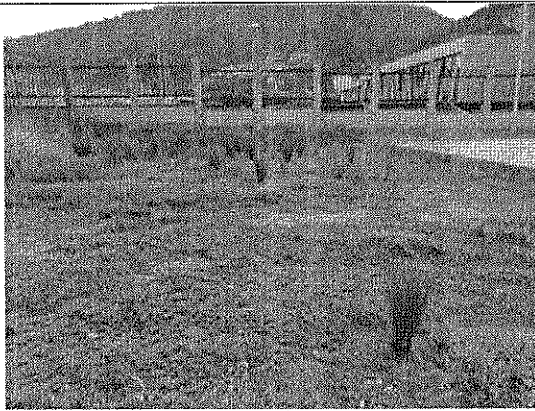


Estado inicial

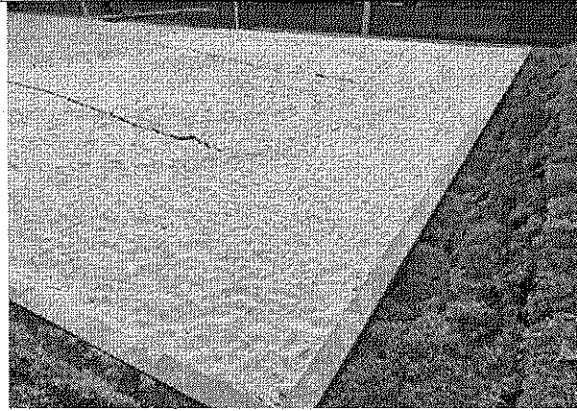


Intervención finalizada

Mantenimiento de instituciones educativas:

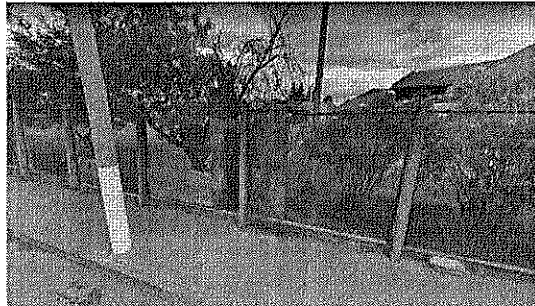


Estado inicial

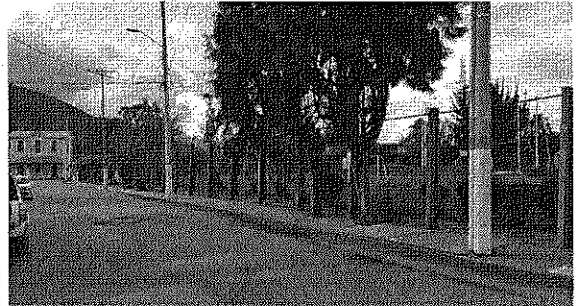


Estado final

Mantenimiento en el Centro de Interacción de Cultura C.I.C.:





Intervención Casa de Bolívar:

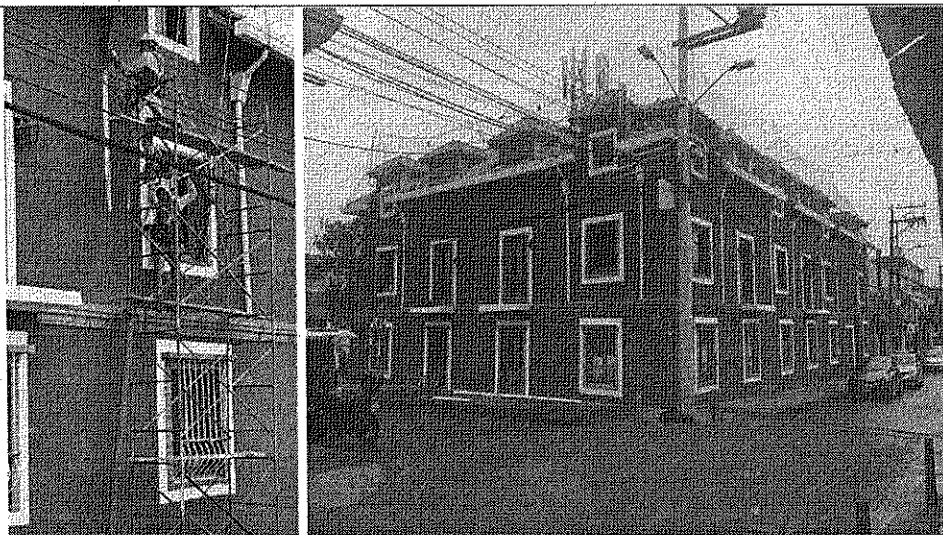

**Labores equipo operativo:**



Polideportiva vereda Meusa:

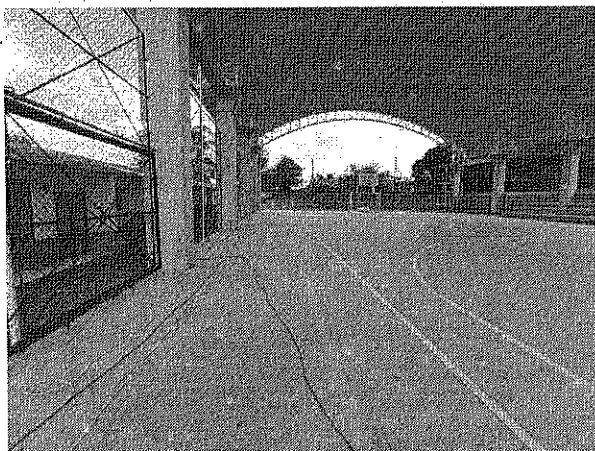

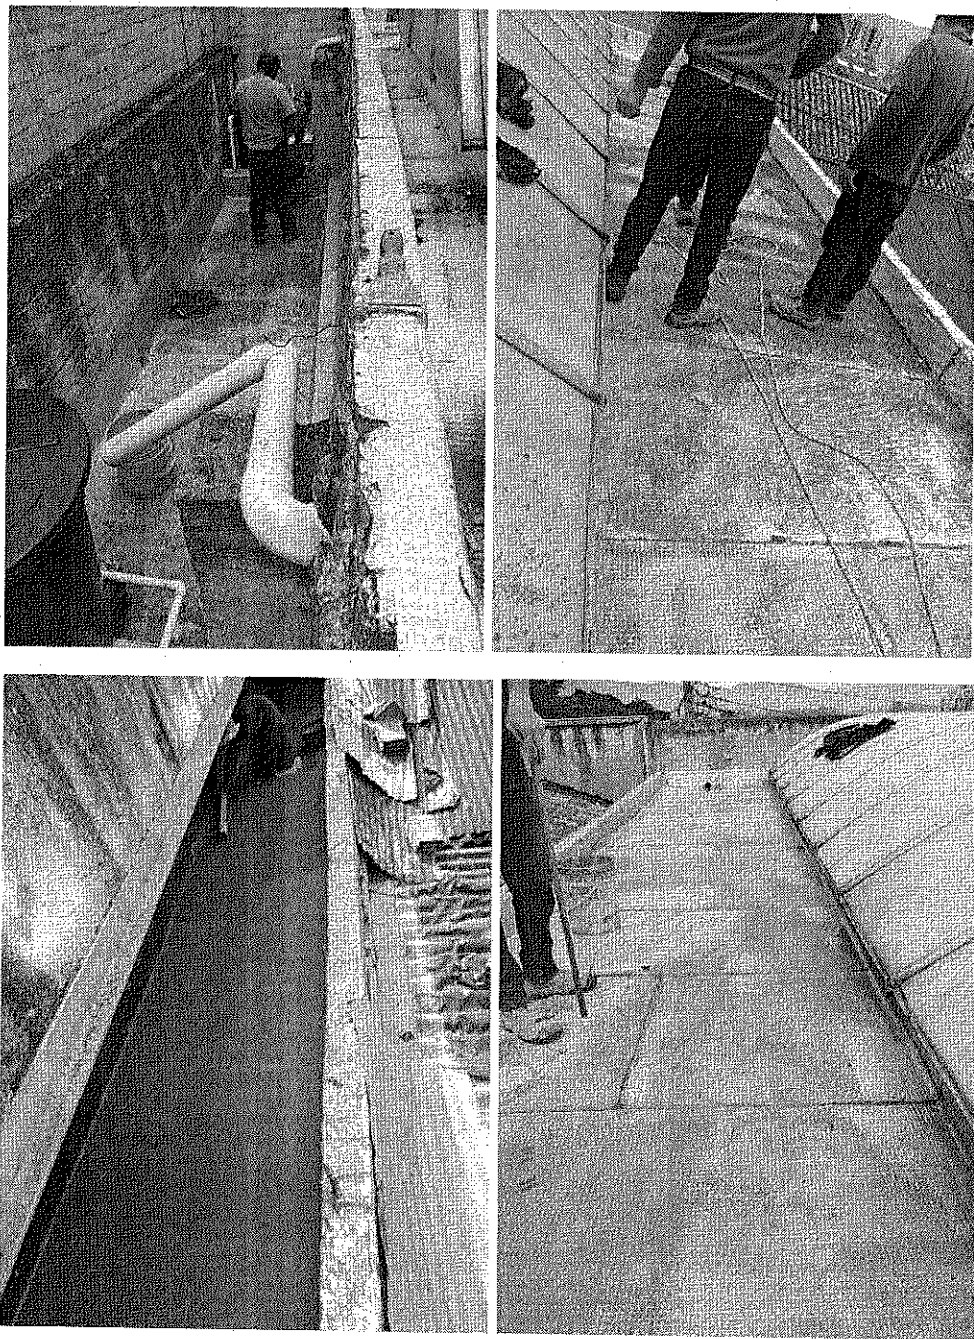


Estación de policía de Sopó:




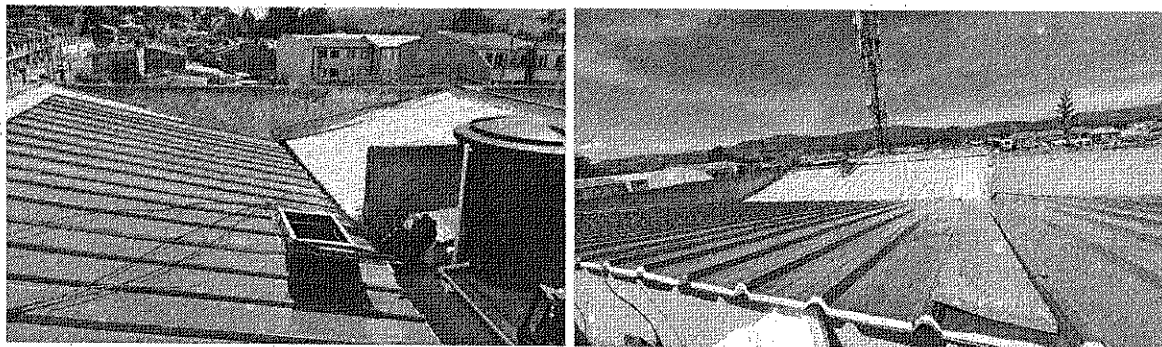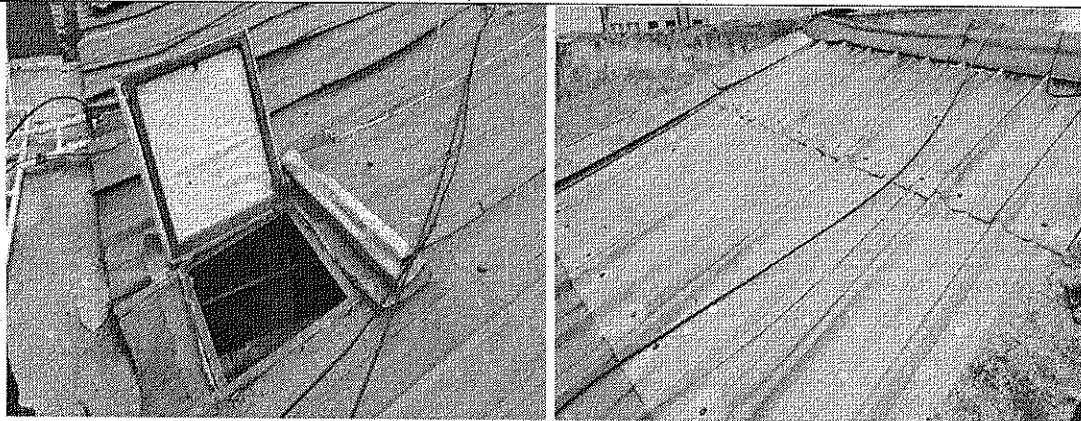



Centro Día:

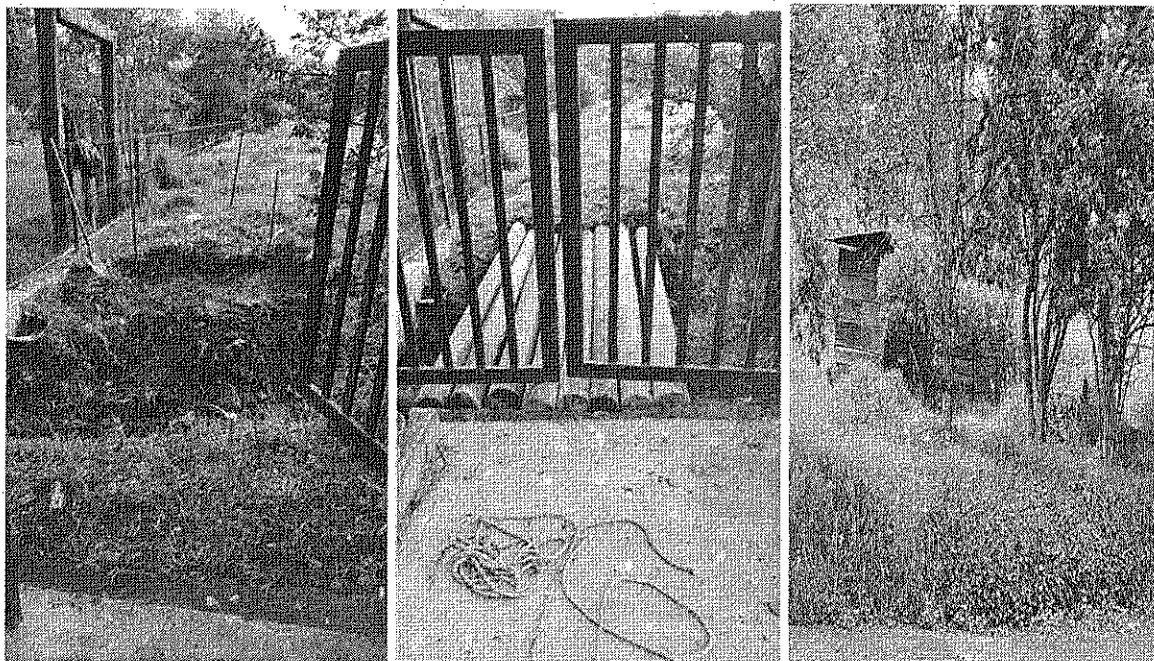

Complejo La Trinidad:

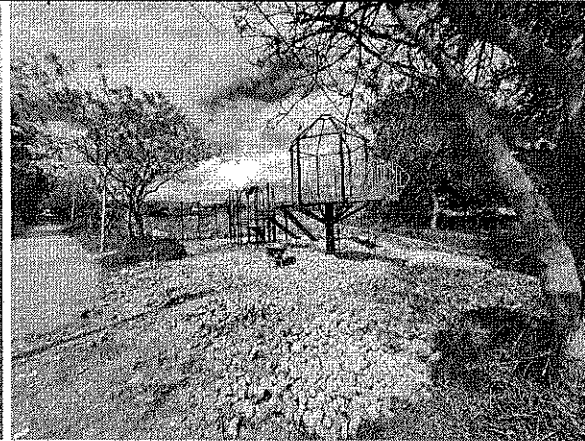

Casa de la Cultura:

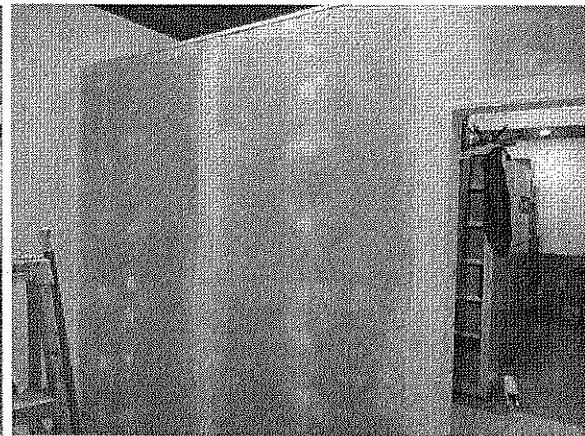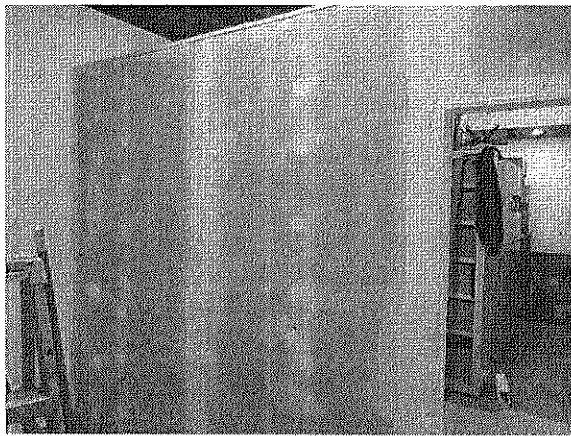

## **AÑO 2023**

**19.Meta de producto:** Realizar mantenimiento al 100% de infraestructuras deportivas, educativas, de salud, incluyentes, medioambientales, turísticas, de emprendimiento, agropecuarias, administrativas, culturales y de espacio público.

**Descripción:** para la vigencia con el personal operativo se adelantaron actividades que fortalecen el mantenimiento de los espacios públicos en:



- Mantenimiento en el parque la trinidad: se realiza instalación de parques infantiles, apoyo construcción de baños.
- Mantenimiento casa de la mujer: se realiza mantenimiento en el adoquín ubicado en la parte externa.
- Mantenimiento alcaldía: se realiza pintura en las instalaciones
- Mantenimiento salón interactivo de educación: apoyo en el arreglo locativo
- Mantenimiento en plaza artesanos: se realiza construcción de contrapiso y media caña, pañete y aplicación de Sika.




- Mantenimiento salón comunal de pueblo viejo: se realiza limpieza de cubierta e instalación de enchape.
- Mantenimiento cerrito: Se realiza instalación de enchape cuarto de basuras.
- Mantenimiento biblioteca San Gabriel: se realiza Demolición mesón
- Mantenimiento casa de la mujer: se realiza reparación de adoquín
- Mantenimiento área patinódromo: se realiza construcción media caña
- Mantenimiento coliseo chuscal: se realiza apoyo reparación teja.
- Mantenimiento Biblioteca Pública de Hatogrande: se realiza reparación de filtración de agua.
- Reparación adoquín de policía pompeyano: Se realiza el levantamiento del adoquín en mal estado se refuerza la superficie de apoyo con cemento y recebo.
- Mantenimiento puente peatonal parque de los pinos, cambio de tablas y tornillería

#### Registro fotográfico

#### Mantenimiento plaza de artesanos en la cubierta

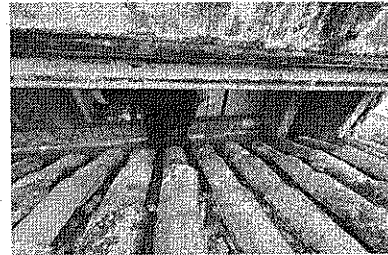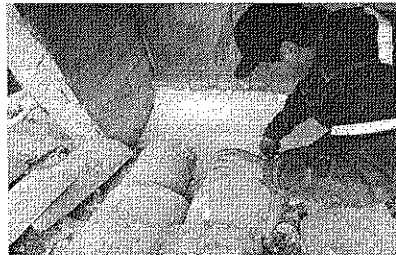



#### Mantenimiento área patinodromo:

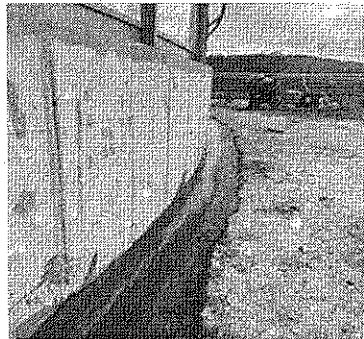


Mantenimiento biblioteca pública de hatogrande por filtración de agua



Mantenimiento cuarto de basuras cerrito:

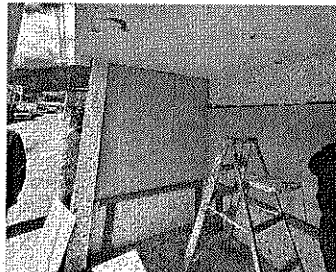


Mantenimiento biblioteca San Gabriel

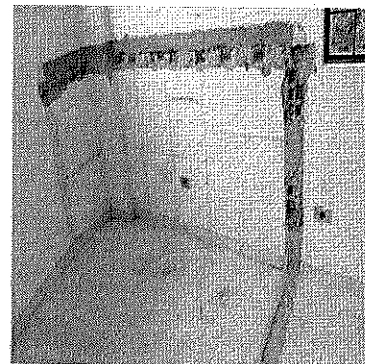

Reparación adoquín policía pompeyano



### Mantenimiento puente peatonal Parque de los Pinos

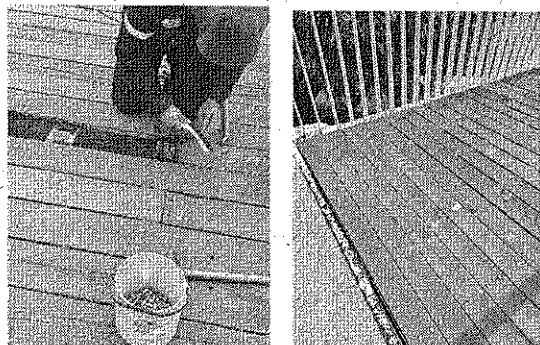

#### AÑO 2020

**20. Meta de producto:** Mantener y adecuar mínimo 30 km de vías rurales del municipio que permitan mejorar la conectividad entre los diferentes sectores

#### Descripción:

Se realizó el mantenimiento de la malla vial rural reconfigurando y reutilizando material existente en las vías en las veredas de Gabriel, Mercenario, Chuscal, Meusa. Se demostró eficacia en el rehúso de material dispuesto en las vías rurales, demostrando que con el material existente se dejan las vías en excelente estado.

Se gestionó e instaló con material de fresado en la vía del sector Sahdoval, Torres, Galvis, Guzmán y Prieto en la vereda Meusa mejorando la malla vial del sector.

Se realizó bacheo en el área rural.

Se realizó convenio interadministrativo con EMSERSOPO con el fin de realizar mantenimiento y limpieza de Box Culvert, rejillas, cunetas, cárcamos, sumideros y zonas duras de espacio público.

Se realizó mantenimiento de maquinaria amarilla.



Por otra parte, está en proceso de contratación el suministro de materiales granulares para el mantenimiento de las diferentes vías rurales.

NOMBRE DE LA VIA	TIPO MANTENIMIENTO	DE	FORMA EJECUCION	DE	KM
------------------	-----------------------	----	--------------------	----	----

VEREDA SAN GABRIEL, MERCENARIO, CHUSCAL, MEUSA	Mantenimiento reconformación vía	Compensación Asocentro	con	1.00
VEREDA MEUSA vía Sector Sandoval	Fresado	Compensación Asocentro	con	0.12
VEREDA MEUSA vía Sector Víctor Torres (antena)	Fresado	Compensación Asocentro	con	0.28
VEREDA MEUSA vía Sector Galvis	Fresado	Compensación Asocentro	con	0.20
VEREDA MEUSA vía Hernando Guzmán y Prieto	Fresado	Compensación Asocentro	con	0.15
Vía que conduce de la vereda San Gabriel - Sector Las Chucas	Reparqueo	Compensación Asocentro	con	0.01
Vía que conduce de la vereda La Violeta - vereda Meusa	Reparqueo	Compensación Asocentro	con	0.04
Vía Vereda Centro Alto sector el Carmen.	Reparación en concreto	Personal operativo Obras Públicas		0.06
<b>TOTAL</b>				<b>1.86</b>

➤ **Registro Fotográfico**



**Mantenimiento de la malla vial rural – San Gabriel**

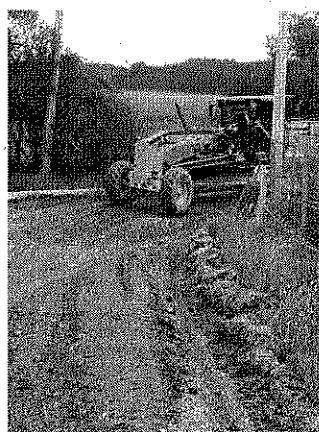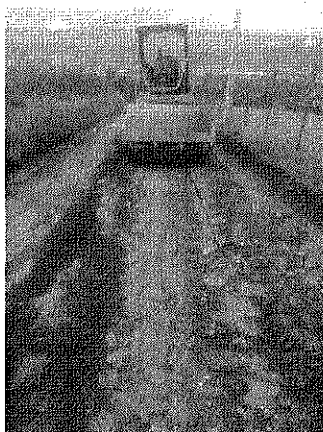



**Mantenimiento de la malla vial rural – Mercenario**



### **Mantenimiento de la malla vial rural – Chuscal**

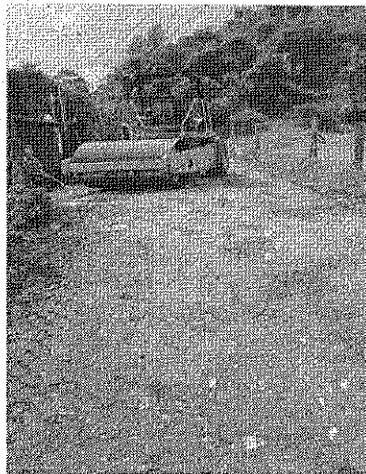
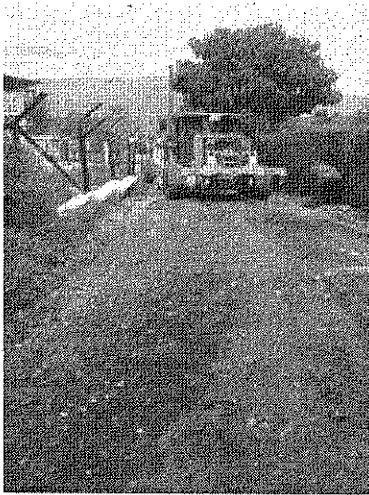


### **Mantenimiento de la malla vial rural – Meusa**

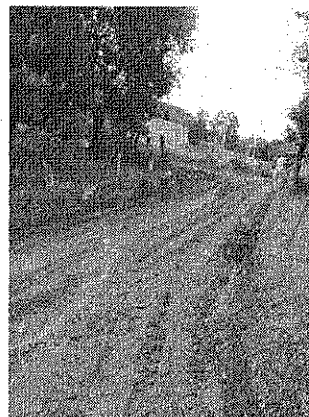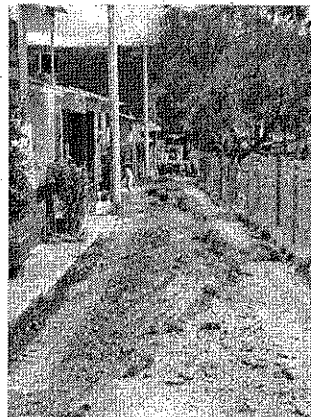




### **Mantenimiento vial mediante la instalación con material de fresado en la vereda Meusa**

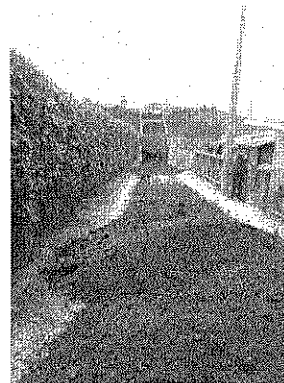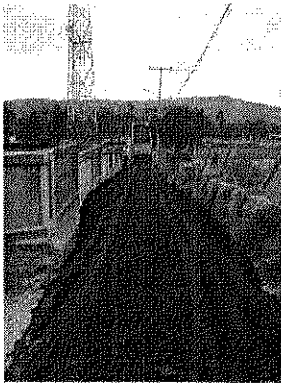


### **Parcheo zona rural**



### **Mantenimiento y limpieza de Box Culvert, rejillas, cunetas, cárcamos y sumideros de la red vial rural**

LIMPIEZA DE CUNETAS (16.004 ml)	Vereda La violeta, Vereda Mercenario, Vereda San Gabriel, vía que conecta Meusa – La Violeta y en ejecución el tramo San Felipe - La Virgen. La Virgen - Chuscal.
---------------------------------	---




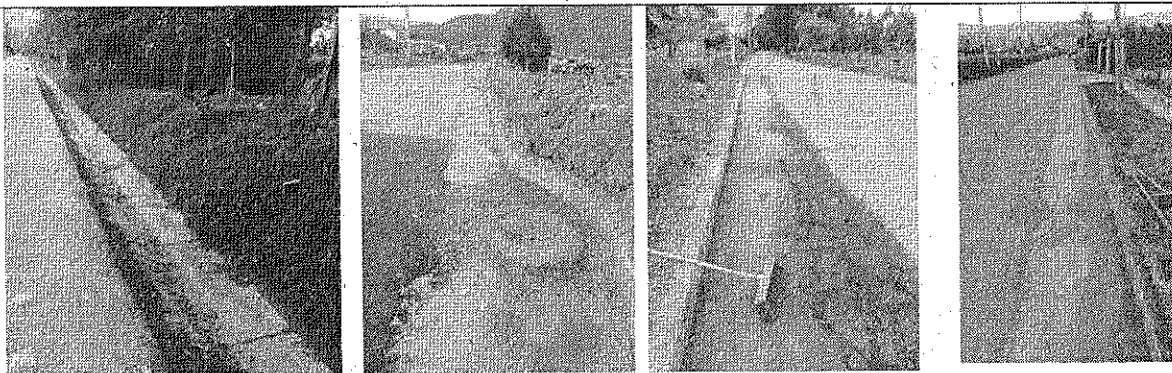


LIMPIEZA DE UNIDADES DE BOX COULVERT (87 unidades)	Quebrada Santa Elena	Cantidad 1
	Tres esquinas – Puente adobes	Cantidad 3
	Puente adobes – Quebrada Zapata	Cantidad 23
	Quebrada Zapata – San Gabriel	Cantidad 20
	Pionono Bellavista	Cantidad 11
	San Felipe	Cantidad 2
	Violeta Meusa	Cantidad 6
	Chuscal	Cantidad 21






LIMPIEZA DE UNIDADES DE REJILLAS DE AGUAS LLUVIAS (28 unidades)

Casco urbano del Municipio de Sopó se priorizaron en los sectores de (carreras 1-2-3-4-5 y calle 3 sur a calle 4)

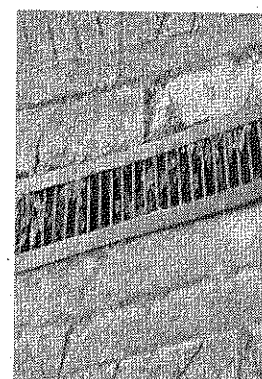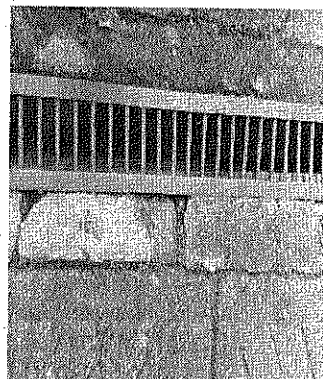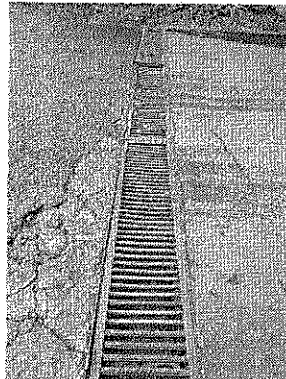

CARCAMOS (11 unidades)

Casco urbano del Municipio de Sopó se priorizaron en los sectores de (carreras 1-2-3-4-5 y calle 3 sur a calle 4)

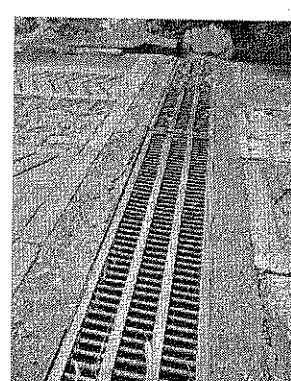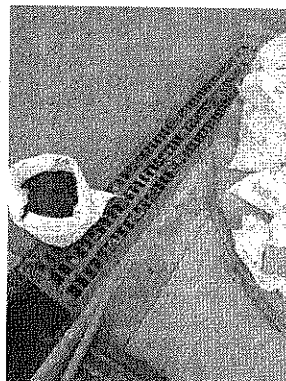

## AÑO 2021

**20.Meta de producto:** Mantener y adecuar mínimo 30 km de vías rurales del municipio que permitan mejorar la conectividad entre los diferentes sectores

**Descripción:** Para cumplir esta meta se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Retiro de material común como escombros, residuos, carga y retiro de sobrantes de la zona a intervenir.
- Conformación previa para uniformizar la superficie que recibirá la capa de relleno granular. Esta conformación se logra con un procedimiento de escarificado, extensión, conformación y compactación.
- En caso de encontrar zonas con pérdidas de espesor, se utiliza material de la misma conformación o con material de características similares para reemplazar el faltante (recebo/fresado).
- Los procedimientos para cumplir esta actividad podrán incluir excavación, cargue y transporte.
- La conformación de los utilizables y el suministro, colocación y compactación de los materiales de relleno que se requieran, para obtener la sección típica.
- Se deberá considerar sobreanchos en aquellos sitios en que se requiera para el caso de curvas o zonas que se necesite permitir el paso de dos vehículos al tiempo.
- En los casos necesarios, se realizarán acciones de Re parcheo que permitan recuperar la movilidad veredal como fue el caso de las veredas La Violeta, Mercenario y San Gabriel.
- Se realizó en un esfuerzo conjunto con Asocentro, para la intervención y rehabilitación de la vía Hato Grande, intervención dentro de la cual se construyó una nueva superficie de rodadura en asfalto.
- Se realizó la construcción de 300 metros lineales de placa huella y 1060 metros lineales de estabilización con suelo cemento en la vía de la vereda Comuneros la cual conduce al parque ecológico Pionono, de acuerdo al convenio interadministrativo No. D-CV-2021-0016 suscrito entre el Municipio de Sopó y la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS.
- La Secretaria de Infraestructura y la secretaria de Gobierno realizan acompañamiento, apoyo técnico y supervisión a la Junta de Acción Comunal de la vereda Comuneros con respecto al convenio suscrito por el IDACO No. 1132 DE 2021 PARA REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPACTO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN JURISDICCIÓN DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No IDACO 099-2021 (FONDECÚN 21-015) SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA – IDACO Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECUN.


Se suscribió contrato de suministro de materiales con los cuales se realizaron los mantenimientos a la malla vial rural y a continuación se relacionan las vías que contaron con intervención:


LOCALIZACIÓN	TIPO DE MEJORAMIENTO	ML DE INTERVENCIÓN
Pueblo viejo	Recebo	992
Carolina Alta (Sector Rivas) - Trabajo comunitario y gestión	Fresado	116
Carolina Alta (Sector Gomez) - Trabajo comunitario y gestión	Fresado	330
Centro Alto (Pionono)	Fresado	1778
Centro Alto ( Sector El Carmen)	Fresado	106
Hatogrande - Cajica	Asfalto	797
Aposentos	Recebo	8080
Aguacaliente	Recebo	4378
Piedra Herrada	Recebo	3622
Sector San Felipe - Chuscal	Rocería y desmonte	2520
Manzano	Recebo	1936
Chuscal Manas Bajas	Recebo	180
Briceño sector carrilera	Recebo	200
Meusa sector ayala	Fresado	103
Canavita-San Lorenzo	Rocería y desmonte	2000
Via tres esquinas puente adobes	Rocería y desmonte	4200
Via limite Calera-San Gabriel	Rocería y desmonte	4796
Calle 3 sur entre variante y estadio	Rocería y desmonte	1200
Via Centro Alto	Rocería y desmonte	1230
Vía Pueblo Viejo sector Niño	Rocería y desmonte	1160
Vía Meusa Alta	Rocería y desmonte	4250
Vía Pionono hasta sector Ospina	Rocería y desmonte	8820

Vía Pionono parque Ecológico	Estabilización con suelo cemento	1060
Vía Pionono parque Ecológico	Placa Huella	300
Vía vereda comuneros	Placa Huella	80


- **Registro Fotográfico**



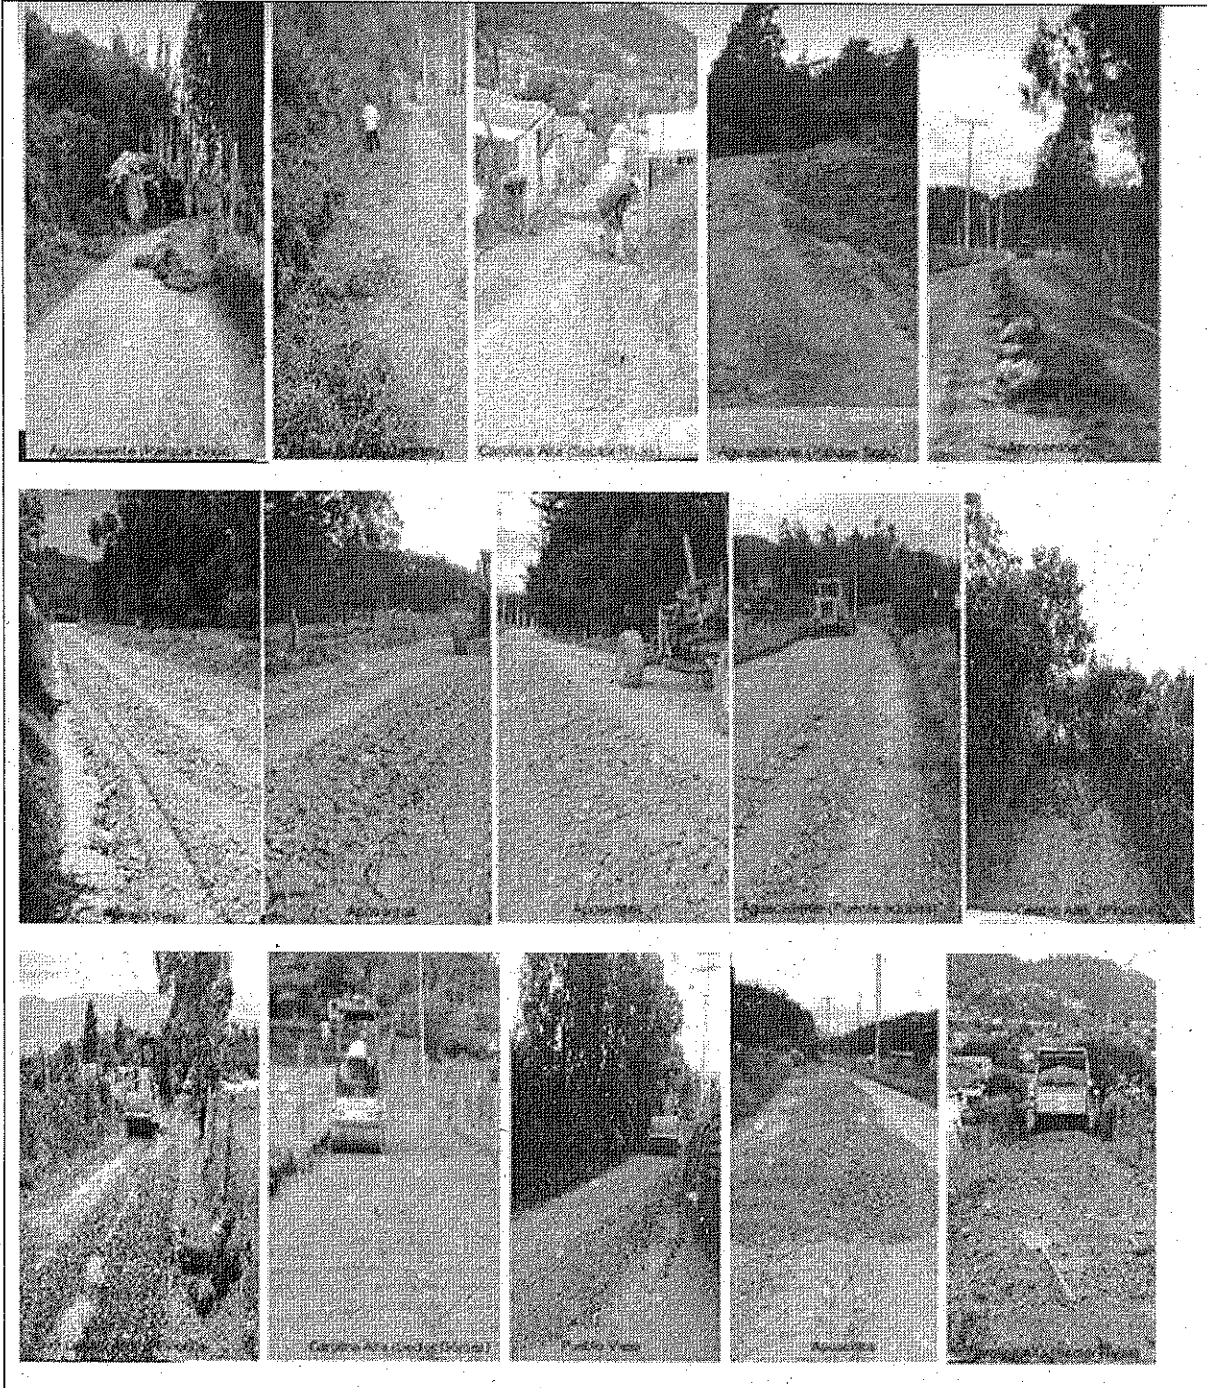

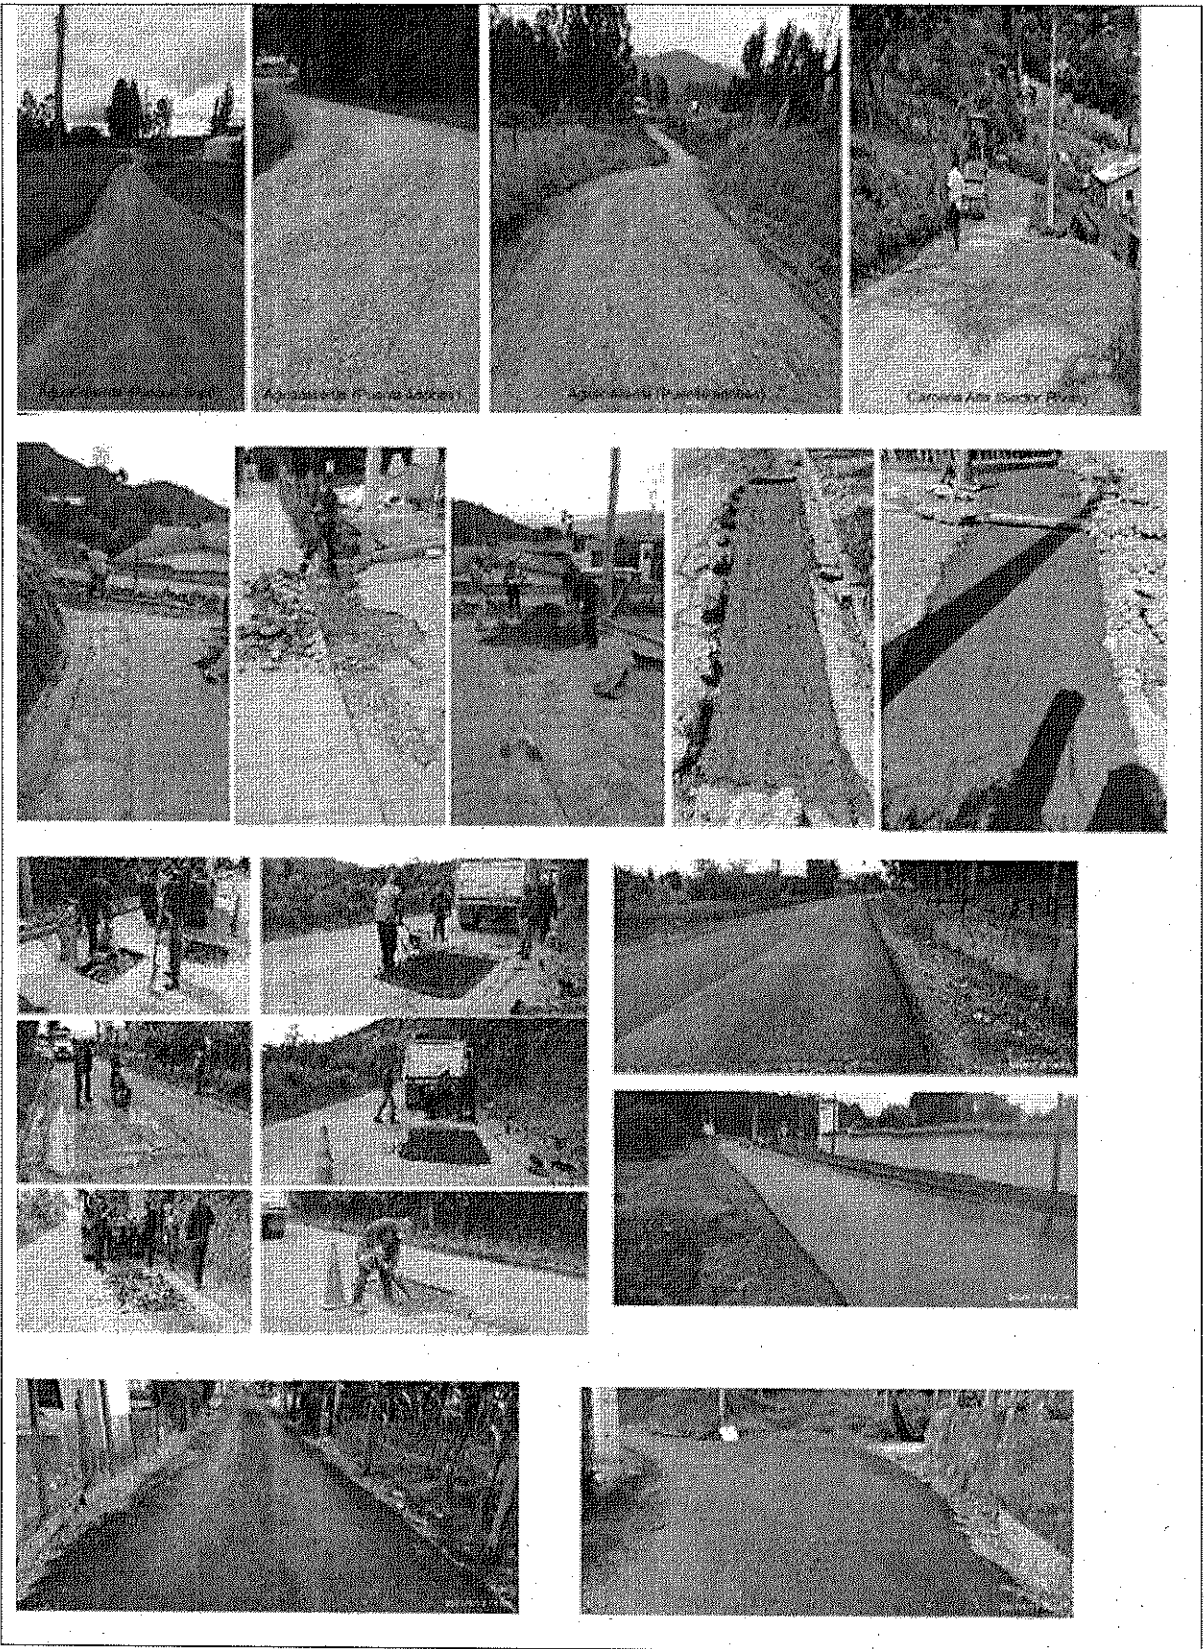






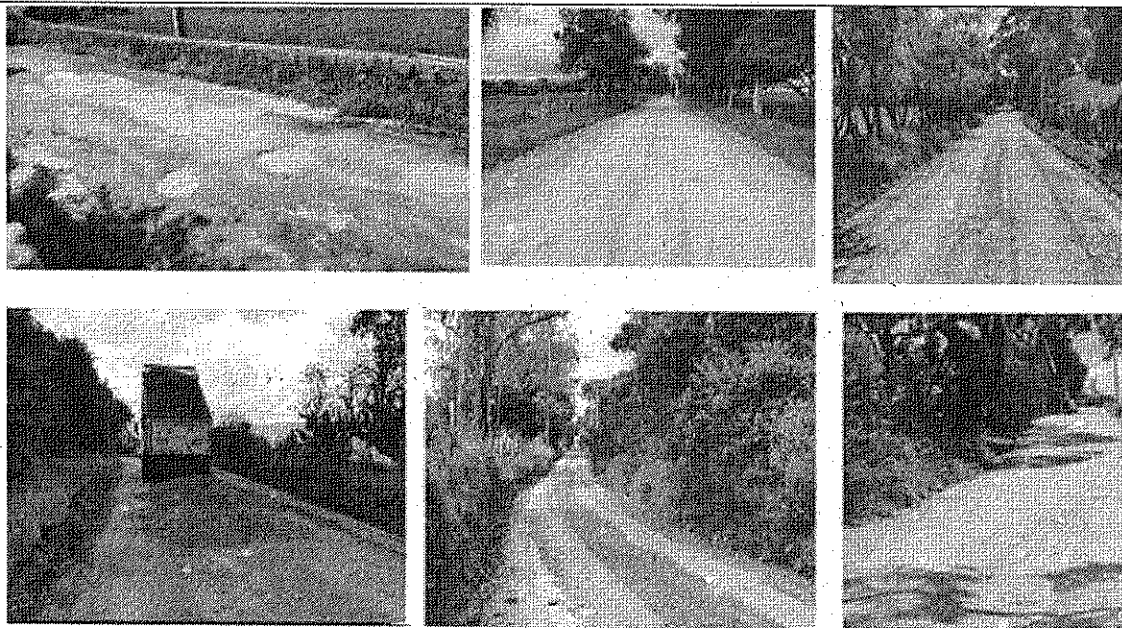


**TOTAL: 54234**




**Mejora miento de 1060 ML con estabilización con suelo cemento convenio Ejercito Nacional**

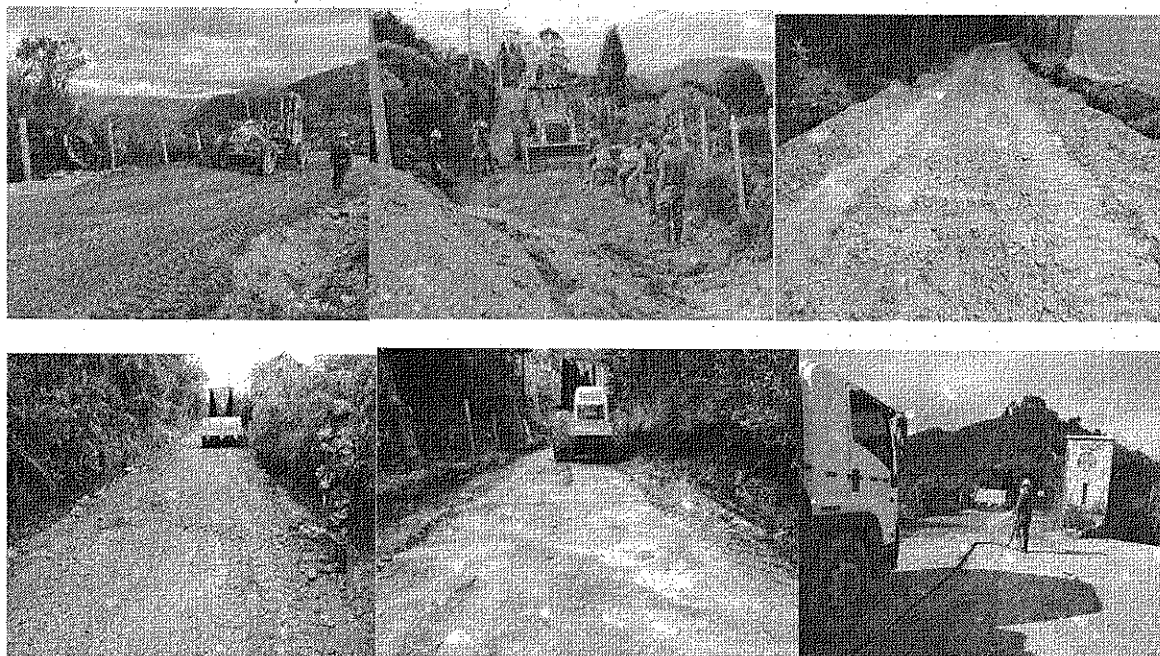

**Construcción de 300 ML de placa huella convenio Ejercito Nacional**

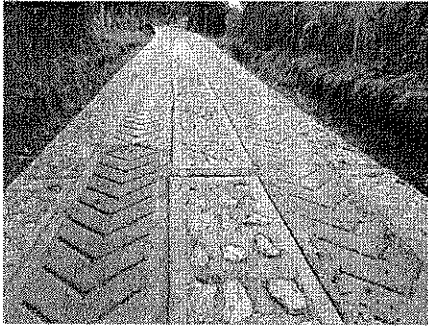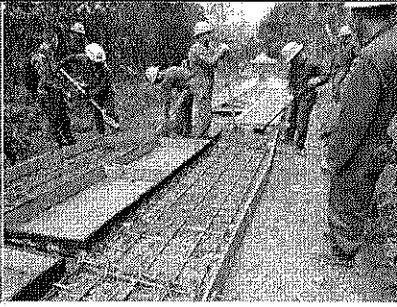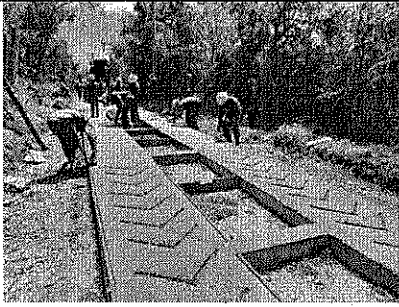

**Construcción de 80 ML de placa huella convenio IDACO**

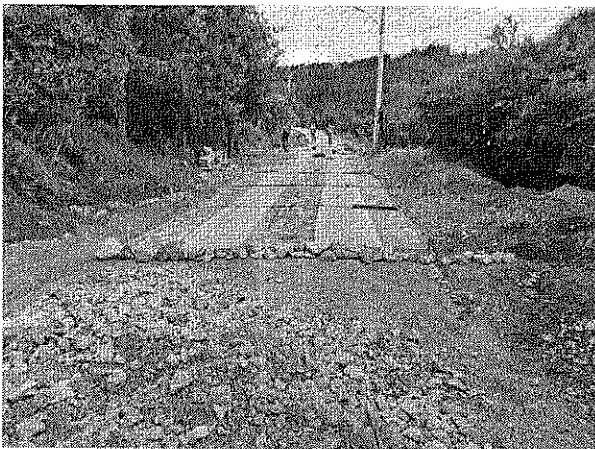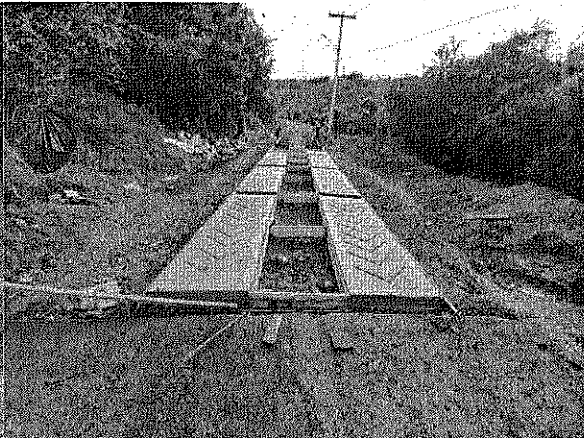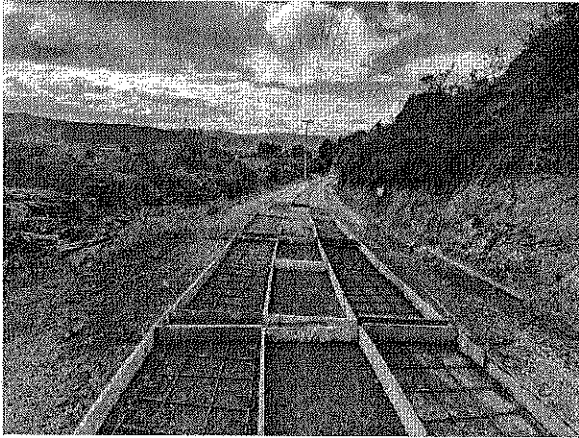

**AÑO 2022**

**20.Meta de producto:** Mantener y adecuar mínimo 30 km de vías rurales del municipio que permitan mejorar la conectividad entre los diferentes sectores

**Descripción:** Para cumplir esta meta se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Se suscribe convenio No. D-CV-2022-0010 suscrito entre el Municipio de Sopó y la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA QUE SE EFECTÚE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOPÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA." con fecha de inicio del 01 de noviembre de 2022, con el fin de realizar la construcción de 2000 metros lineales de placa huella en la vía Piedra Herrada, 1100 metros lineales de placa huella en la vía El Manzano, y 850 metros lineales de rehabilitación de la carpeta asfáltica vía Meusa - La Violeta. A la fecha, se han ejecutado 100 ml en el sector de Piedra Herrada, realizando actividades de conformación de la calzada, mejoramiento con subbase e instalación de geotextil.
- La Secretaria de Infraestructura realiza el acompañamiento, en el proceso de viabilización y visita técnica del proyecto presentado ante la convocatoria IDACO No. 005-2022 para la construcción de placa huella en vía Manas Bajas vereda El Chuscal, el cual se encuentra en proceso de viabilización técnica por parte del IDACO.
- Se suscribió contrato de suministro de materiales con los cuales se realizaron los mantenimientos a la malla vial rural, realizando el mantenimiento en recebo o fresado a las superficies que lo requieran. A continuación, se relacionan las vías que contaron con intervención:

LOCALIZACIÓN	TIPO DE MEJORAMIENTO	ML DE INTERVENCIÓN
Centro alto, sector el Carmen	Placa huella	50
San Agustín	Placa huella	50
Vereda Bellavista	Placas en concreto	40



Agua Caliente	Afirmado	6800
Vereda pueblo Viejo	Afirmado	900
Chuscal Alto (Camino del Indio)	Afirmado	1500
Vía el Manzano	Afirmado	1880
Carrera 4	Asfalto	70
Vereda San Gabriel, Sector La Carolina	Afirmado	2100
Vía Aposentos	Afirmado	5000
Vía Meusa - la violeta	Asfalto	100
Vía Hatogrande - Cajicá	Geodrán	60
Barrio Sauces	Asfalto	50
<b>TOTAL</b>		<b>18600,00</b>

- A través del convenio D-CV-2022-0009, entre el Municipio de Sopó y la empresa de servicios públicos EMSERSOPÓ, el cual tiene como objeto **"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos, ambientales y financieros para la realización de actividades de ornato, mantenimiento y adecuación del espacio público en general, zonas verdes públicas y zonas verdes de las IED del municipio de Sopó."** Se realizan labores de ornato en las cuales cabe para esta meta resaltar la limpieza y mantenimiento de las cunetas y senderos peatonales a lo largo de las vías del municipio.

#### RESUMEN ÁREAS INTERVENIDAS

SECTOR	CANTIDAD (ML)
--------	---------------


<b>VÍAS RURALES</b>	
Vía Meusa la Violeta	3.224,00
Vía Tres esquinas San Gabriel	10.771,00
Vía Canavita San Lorenzo desde Jardín del norte	998,00
Vía Centro Alto el Carmen	833,00
Vía Pueblo viejo sector Niño	875,00
Vía Meusa la Violeta	3.224,00
<b>TOTAL, VÍAS RURALES</b>	<b>16701,00</b>

- **Registro Fotográfico**



Centro alto, sector el Carmen





San Agustín

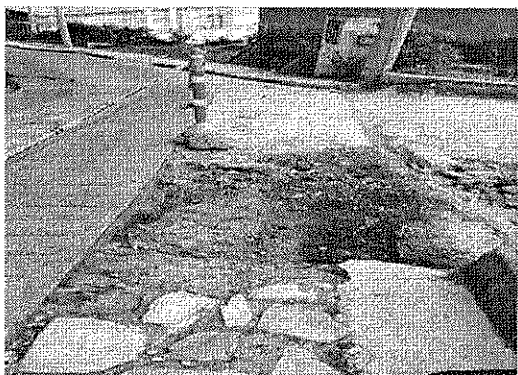


Vereda Bellavista

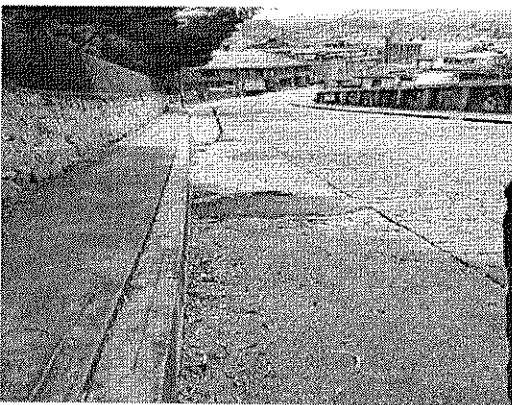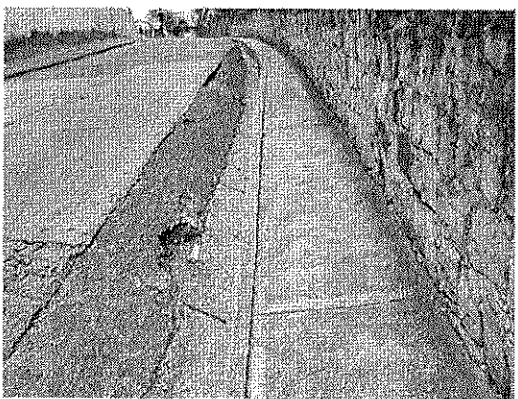


Agua Caliente

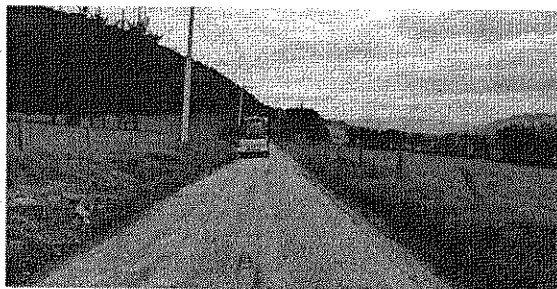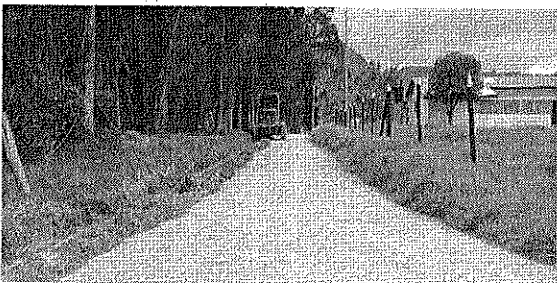


Vereda pueblo Viejo

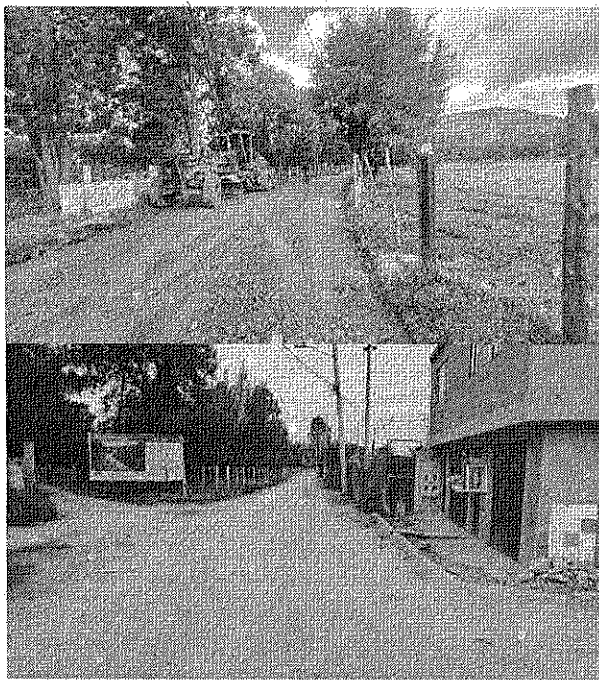



Chuscal Alto (Camino del indio)

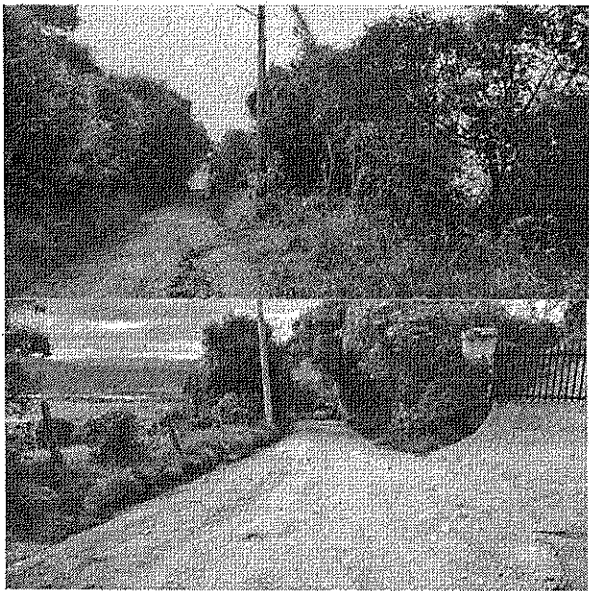

Vía el Manzano

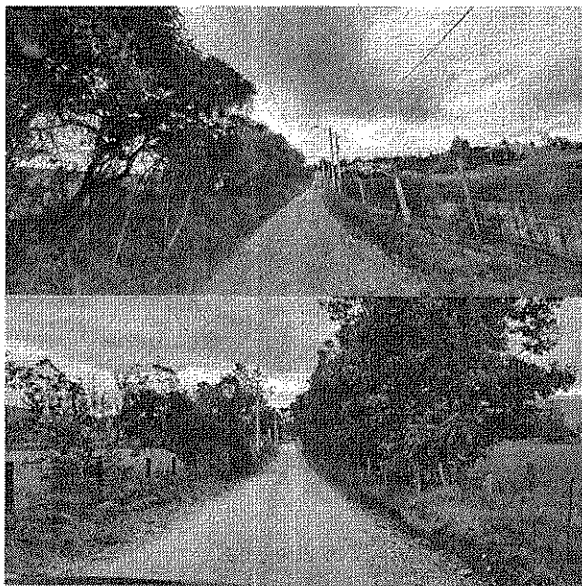


Carrera 4

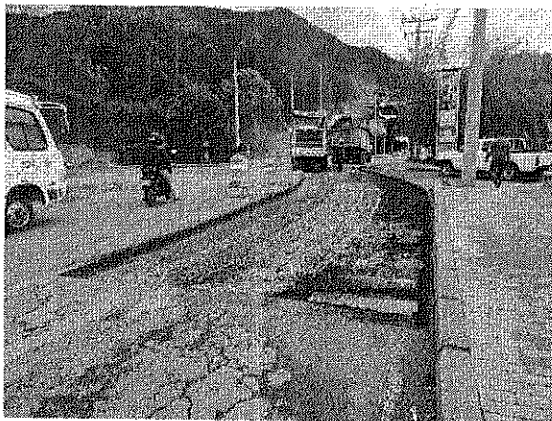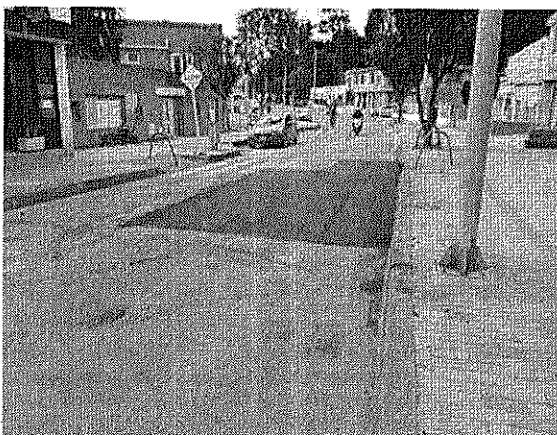


Vereda San Gabriel, Sector La Carolina




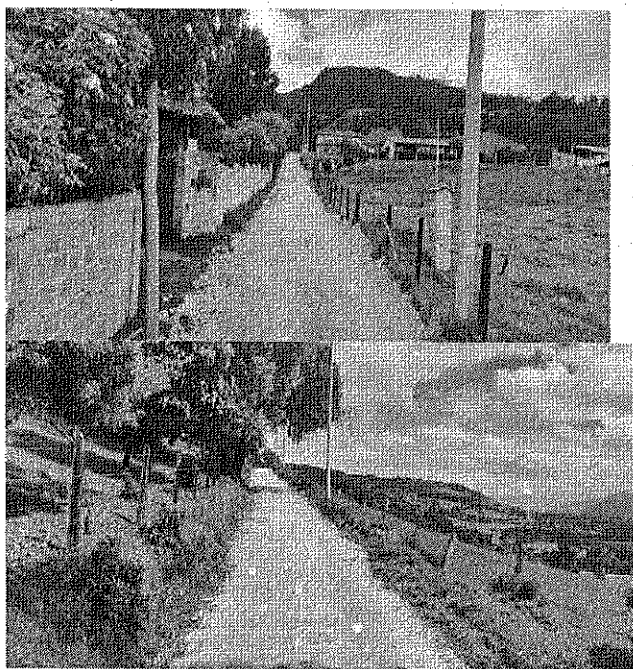


Vía Aposentos

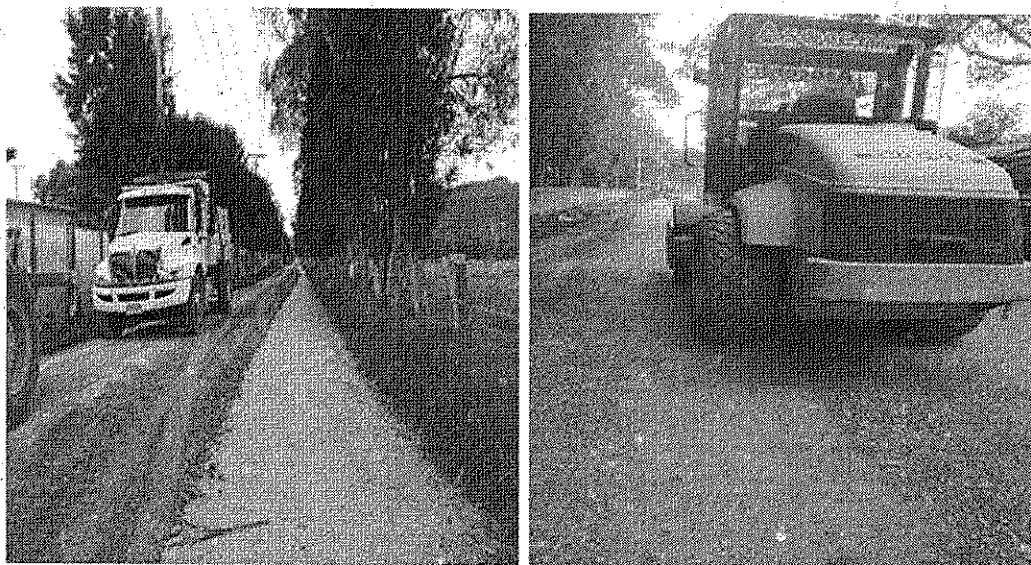



Vía Meusa - La Violeta

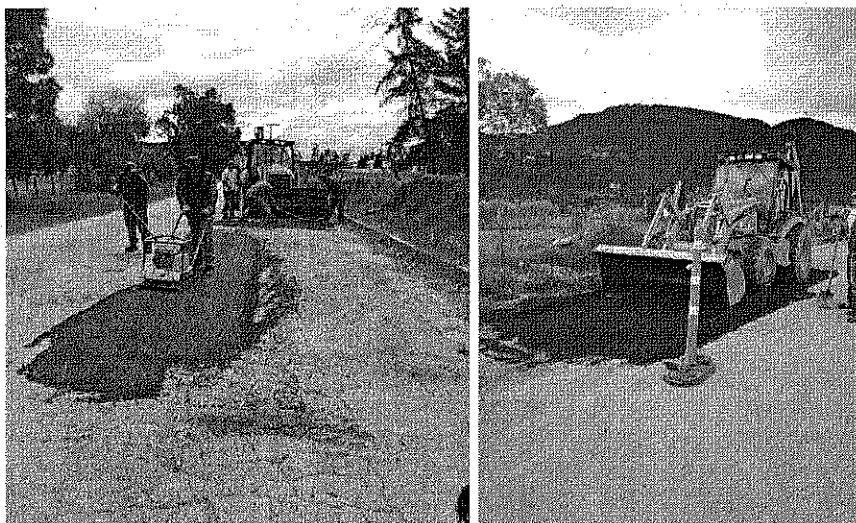


Vía Hatogrande - Cajicá

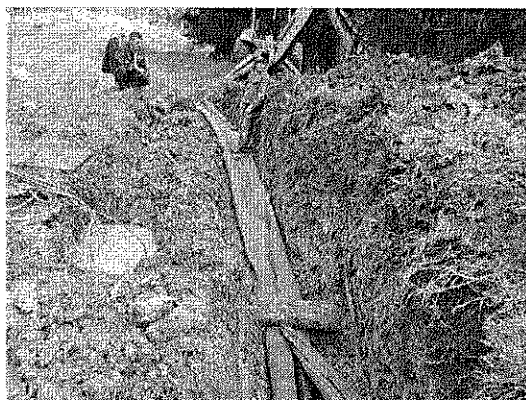

Barrio Sauces

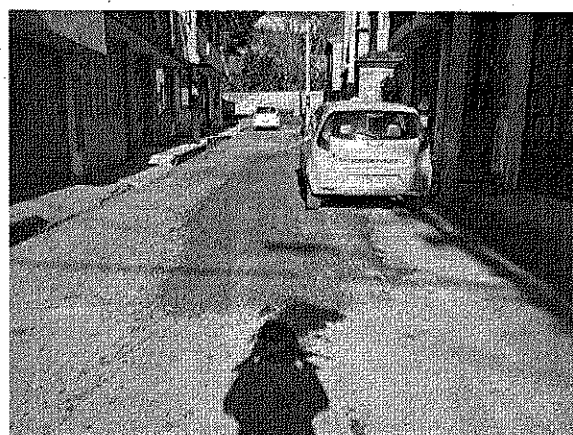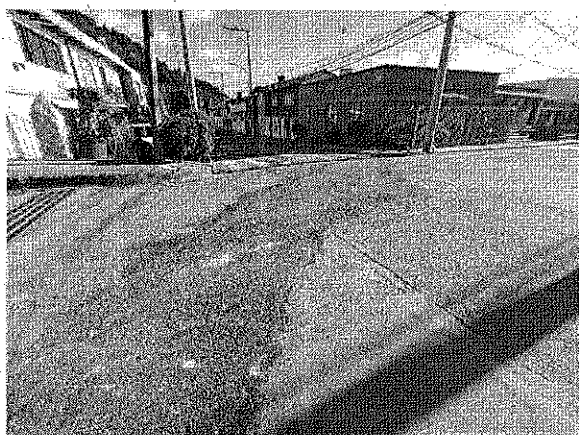

Limpieza de Box Culvert - Vía San Gabriel:

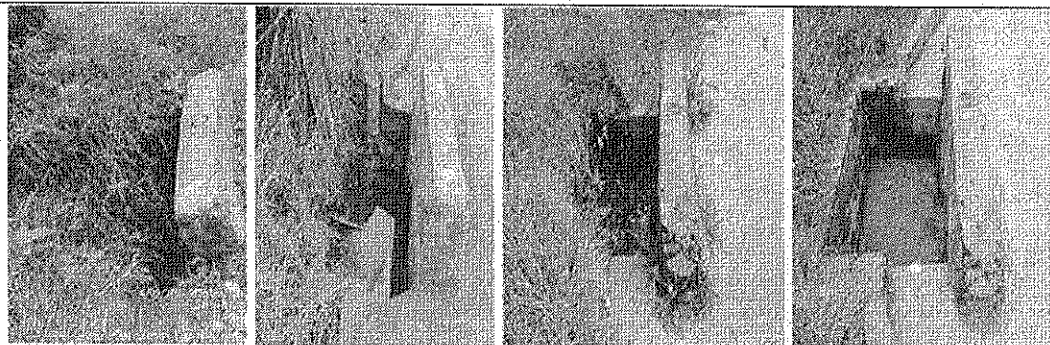


ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

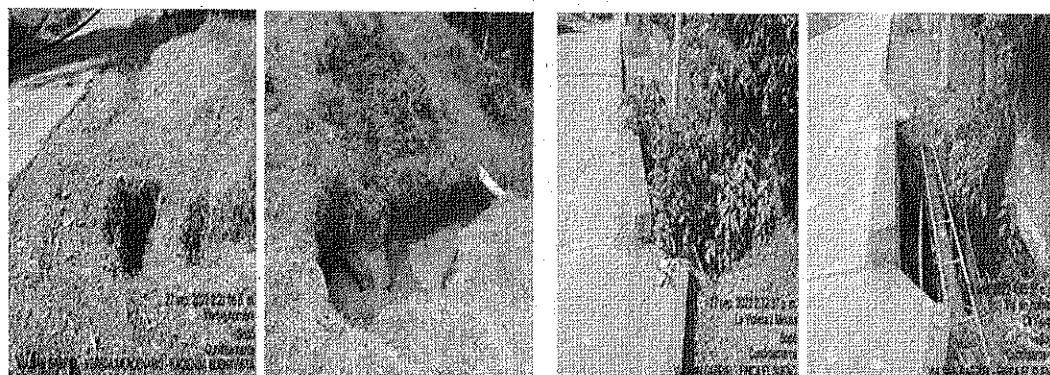


ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

Limpieza de Box Culvert - Vía Meusa Alta:

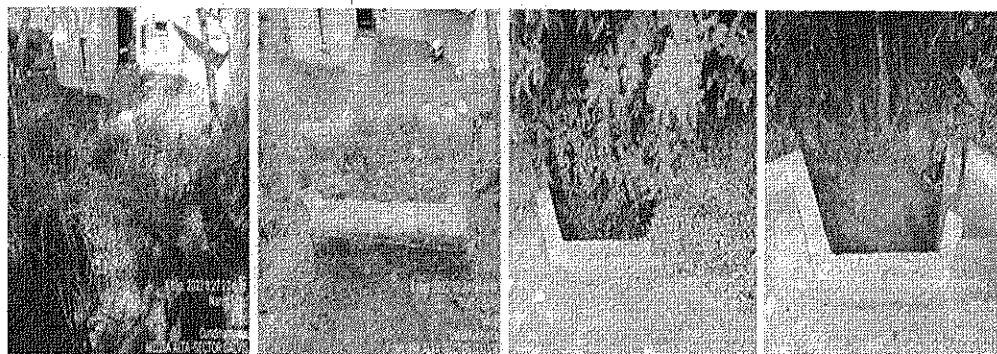


ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS






ANTES



DESPUÉS

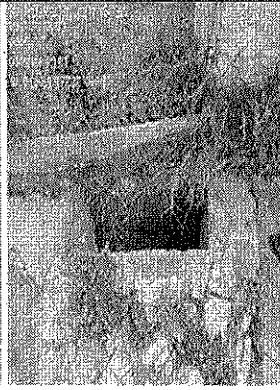

ANTES



DESPUÉS

Limpieza de Box Culvert - Vía Aposentos:



ANTES



DESPUÉS






ANTES



DESPUÉS

Inicio de la construcción de 2000 ML de placa huella convenio Ejercito Nacional:

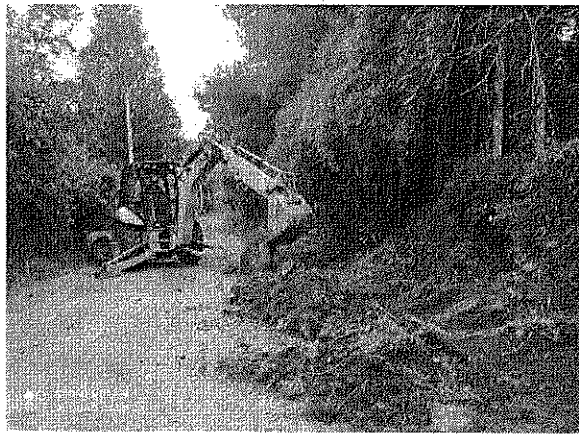

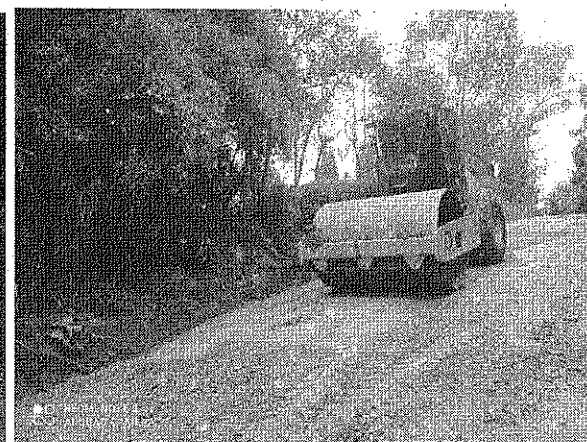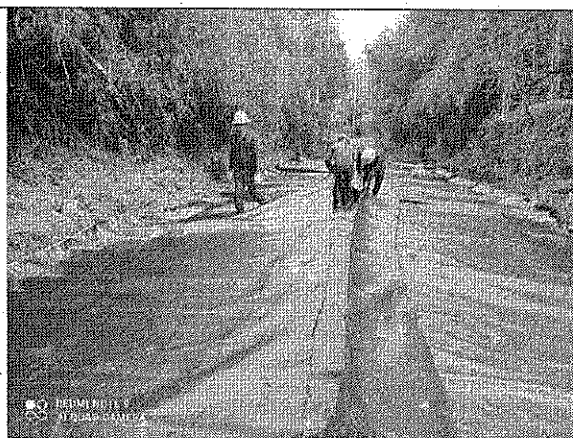

Visita de viabilización técnica para la construcción de placa huella convenio IDACO - JAC El Chuscal:





**AÑO 2023**

**20.Meta de producto:** Mantener y adecuar mínimo 30 km de vías rurales del municipio que permitan mejorar la conectividad entre los diferentes sectores

**Descripción:** Para cumplir esta meta se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Se suscribe convenio No. D-CV-2022-0010 suscrito entre el Municipio de Sopó y la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA QUE SE EFECTÚE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOPÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA." con fecha de inicio del 01 de noviembre de 2022, con el fin de realizar la construcción de 2000 metros lineales de placa huella en la vía Piedra Herrada, 1100 metros lineales de placa huella en la vía El Manzano, y 850 metros lineales de rehabilitación de la carpeta asfáltica vía Meusa - La Violeta. A la fecha, se han ejecutado 14000 ml en el sector vía piedra herrada
- Se continua con el contrato de suministro de materiales con los cuales se realizaron los mantenimientos a la malla vial rural, realizando el mantenimiento en recebo o fresado a las superficies que lo requieran con el personal operativo. A continuación, se relacionan las vías que contaron con intervención:


NOMBRE DE LA VÍA	TIPO DE INTERVENCIÓN.	METROS LINEALES
San Lorenzo	Aplicación y compactación de recebo	200
Manzanos	Aplicación y compactación de recebo	
agua caliente	Aplicación y compactación de recebo	
las margaritas	Aplicación y compactación de recebo	1000
casa blanca	Aplicación y compactación de recebo	
tramo de vía en Briceño (pavimento).	Cambio carpeta asfáltica	76
vía pueblo viejo sector niño	Mejoramiento de la vía	80

Piedra herrada


Aplicación y compactación  
de recebo

### REGISTRO FOTOGRAFICO.


#### San Lorenzo

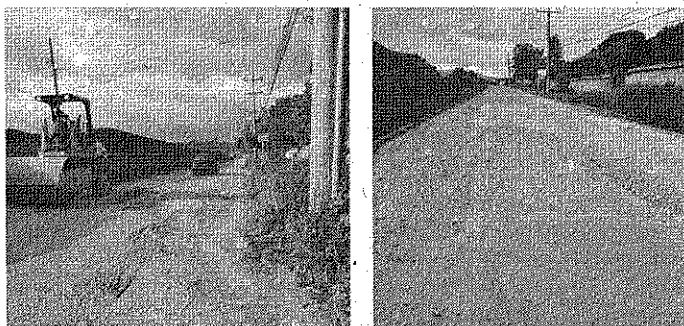


#### Piedra Herrada

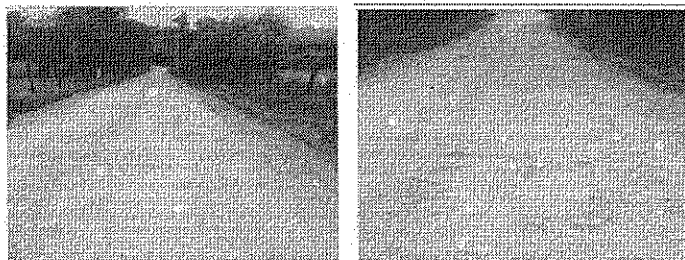


#### Manzanos

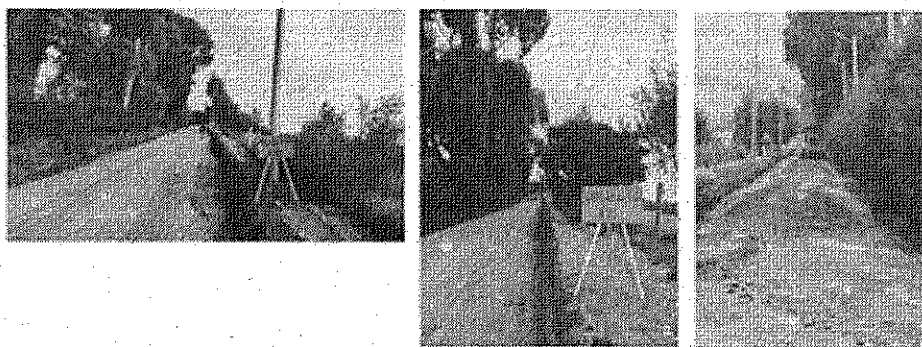


#### Agua caliente

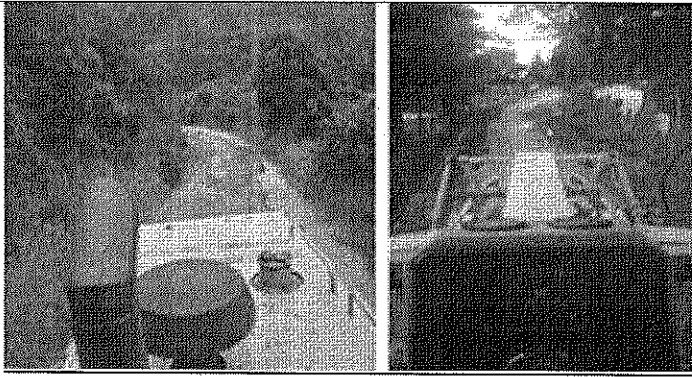


Las margaritas

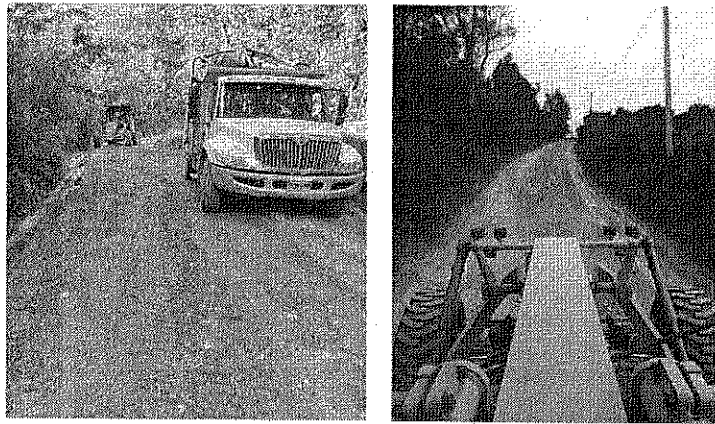

Tramo de vía en Briceño (pavimentación)

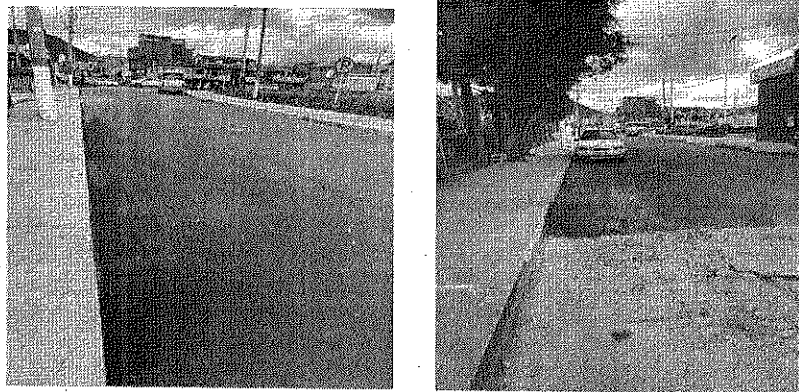

### Vía pueblo viejo sector niño

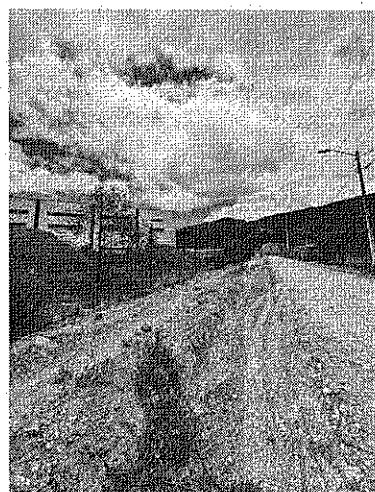

#### **AÑO 2020**

**21.Meta de producto:** Construir una Unidad Funcional de Infraestructura para la movilidad de medios de transporte no motorizados (ciclo ruta) garantizar su correcto funcionamiento

**Descripción:** Se encuentra en ejecución la consultoría para realizar los estudios y diseños de la ciclo ruta – sendero peatonal por Briceño-Sopó y su interventoría.

Simultáneamente se trabaja en la consecución de recursos con autorización de Honorable Concejo Municipal de una Operación de Crédito y con la Gobernación de Cundinamarca.

#### **AÑO 2021**

**21.Meta de producto:** Construir una Unidad Funcional de Infraestructura para la movilidad de medios de transporte no motorizados (ciclo ruta) garantizar su correcto funcionamiento





**Descripción:** Se realizaron los estudios y diseños de la ciclorruta de Briceño al casco urbano de Sopó. Mediante contrato CM-2021-0504 se ejecutó la interventoría de los estudios y diseños de la ciclo ruta y sendero peatonal.

Se gestionaron recursos en la Gobernación de Cundinamarca y ante el Concejo Municipal de Sopó se realizó la gestión para la expedición del Acuerdo 001 del 25 de enero de 2021 "Por el cual se autoriza al Alcalde Municipal de Sopó para obtener recursos a través de una operación de crédito público, se le otorgan algunas facultades y se dictan otras



disposiciones” y del Acuerdo 27 del 1 de diciembre de 2021 “Por el cual se faculta al alcalde para que declare la utilidad pública y la existencia de condiciones de urgencia por motivos de utilidad pública, y se autoriza al alcalde municipal de sopó para la adquisición de una franja de predio de importancia estratégica para futuro desarrollo vial”

- **Registro Fotográfico**

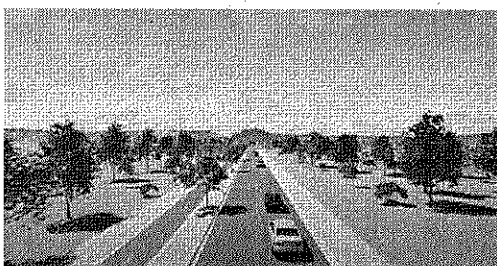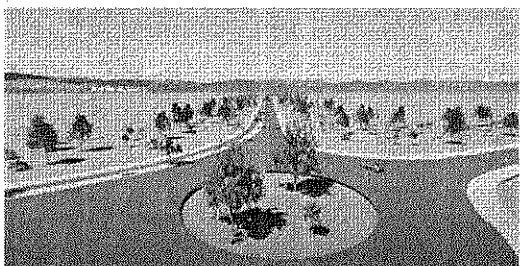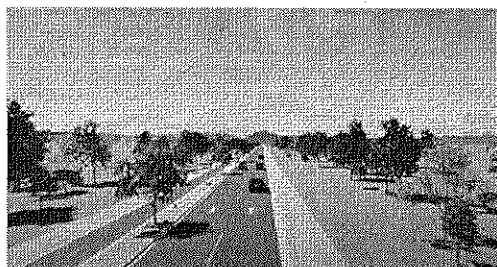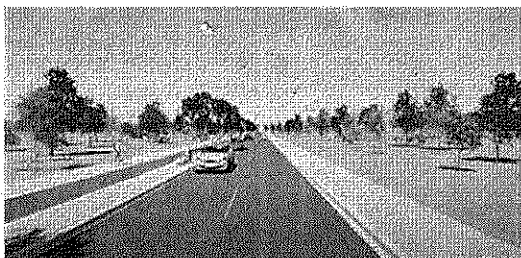

## AÑO 2022

**21.Meta de producto:** Construir una Unidad Funcional de Infraestructura para la movilidad de medios de transporte no motorizados (ciclo ruta) garantizar su correcto funcionamiento

**Descripción:** Mediante contrato CM-2020-0500 se realizaron los estudios y diseños de la ciclorruta de Briceño al casco urbano de Sopó y mediante contrato CM-2021-0504 se ejecutó la interventoría de los estudios y diseños de la ciclo ruta y sendero peatonal.

Paralelo a la ejecución del contrato de los diseños de la vía longitudinal y ciclo ruta; se realiza la gestión ante el Concejo Municipal de Sopó y se expide el Acuerdo No. 001 del 25 de enero de 2021 “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE SOPÓ PARA OBTENER RECURSOS A TRAVÉS DE UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, SE LE OTORGAN ALGUNAS FACULTADES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Una vez se reciben los diseños se inicia la gestión en la Administración Municipal para el trámite de obtener los recursos para la construcción del proyecto.



En la gestión del proyecto realizada por la Administración Municipal encontramos lo siguiente:

- Socialización del proyecto: este proyecto ha sido socializado en lo corrido del periodo de administración y ha sido aceptado por los propietarios de los predios y la comunidad Soposeña que conoce la problemática y también es consciente que la única solución es construir nuevas vías que sean alternas y complementarias a las existentes mejorando, con ello, la movilidad.
- Socialización de los diseños con los propietarios de los predios involucrados en el proyecto: a los propietarios se les explicó todo el proyecto y se les enseñó la ficha predial en donde se indicaba el área de cesión. Todos los propietarios aceptaron positivamente el proyecto. Se cuenta con las actas de reuniones de las áreas sobre las cuales está la vía constituida.
- Se gestionó ante el concejo Municipal el Acuerdo Municipal número 012 de 2022 del 13 de junio de 2022 "POR EL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA, SE FIJA LA COMPETENCIA PARA DECRETAR LAS ESPECIALES CONDICIONES DE URGENCIA POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE GESTIÓN PREDIAL" de los predios que hacen parte del proyecto.
- Se expidió el Decreto Municipal número 065 de 2022, "POR EL CUAL SE DECLARA LA UTILIDAD PÚBLICA Y LA EXISTENCIA DE CONDICIONES DE URGENCIA POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA DE UNOS PREDIOS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA FUTURO DESARROLLO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES "





Actualmente nos encontramos en la organización de los productos de acuerdo a los requerimientos para la creación de la MGA y los requisitos del Instituto de Infraestructura y de Concesiones de Cundinamarca - ICCU, se está tramitando el permiso ante el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y se avanza en la gestión de cofinanciación del proyecto ante la Gobernación de Cundinamarca, contando con el aval para la obtención de todos los recursos necesarios para llevar a la finalización este proyecto.

Durante el mes de octubre se gestionó ante el Honorable Concejo Municipal el Acuerdo No. 021 del 27 de octubre de 2022 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO NO. 001 DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", con el fin de autorizar al alcalde del municipio de Sopó para suscribir operaciones de crédito público con la banca nacional para el financiamiento de proyectos de inversión incluidos en el Plan de Desarrollo, como lo es la CONSTRUCCIÓN DE LA CICLO-RUTA Y ANDÉN EN EL COSTADO NORTE DE LA VÍA 50CN03 BRICEÑO-SOPÓ por un valor de \$6.750.000.000. Así mismo, se firmó ante el Concejo Municipal el Acuerdo No. 022 del 27 de octubre de 2022 "POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE SOPÓ PARA OBTENER RECURSOS A TRAVÉS DE UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO, SE LE OTORGAN ALGUNAS FACULTADES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" para el financiamiento de proyectos de inversión incluido en el Plan de Desarrollo como lo es la CONSTRUCCIÓN DE LA CICLO-RUTA Y ANDÉN EN EL COSTADO NORTE DE LA VÍA 50CN03 BRICEÑO-SOPÓ por un valor de \$1.250.000.000; es decir se tienen un valor de \$8.000.000.000 de crédito público aprobado para la

## CONSTRUCCIÓN DE LA CICLO-RUTA Y ANDÉN EN EL COSTADO NORTE DE LA VÍA 50CN03 BRICEÑO-SOPÓ.

Paralelamente, la secretaría de Hacienda se encuentra realizando la gestión ante la entidad financiera para la viabilización y aprobación del crédito. Una vez se tenga la aprobación se deberá incorporar los recursos al presupuesto del municipio y así tener a disposición dichos recursos para la contratación de la obra.

- **Registro Fotográfico**

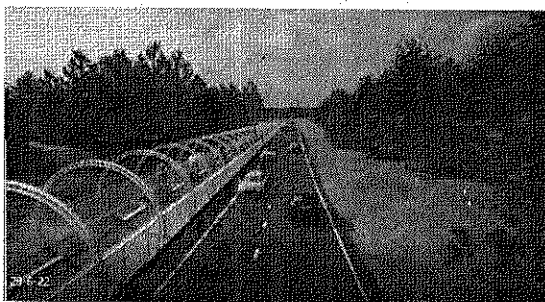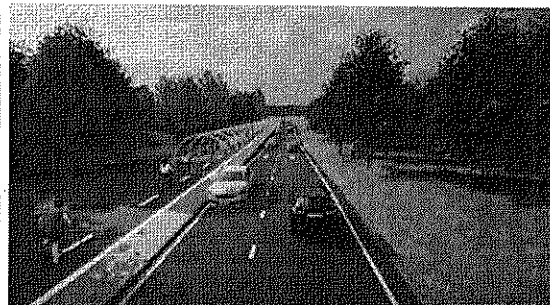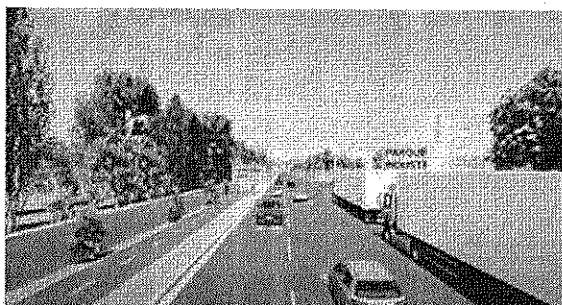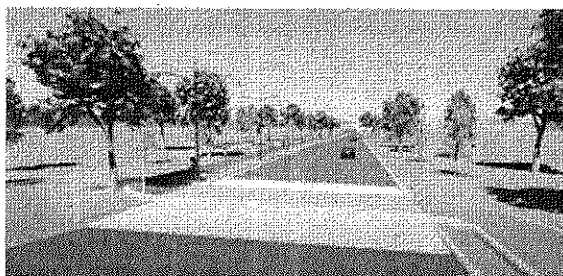

### AÑO 2023

**21.Meta de producto:** Construir una Unidad Funcional de Infraestructura para la movilidad de medios de transporte no motorizados (ciclo ruta) garantizar su correcto funcionamiento







**Descripción:** Para la vigencia 2023 se adjudicó el proceso de obra No L-2023-0862 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE LA CICLO RUTA Y SENDEROS PEATONALES EN EL TRAMO BRICEÑO – SOPÓ EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN

67





CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023." Y el proceso de interventoría No CM-2023-0863 cuyo objeto es: " INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL, Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA CICLO RUTA Y SENDEROS PEATONALES EN EL TRAMO BRICEÑO - SOPÓ EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023".

En la ejecución se realizan actividades como localización y replanteo, excavaciones varias, relleno en recebo común, instalación de tubería PVC alcantarillado, material granular filtrante, pozos de inspección, cajas de inspección, ducto eléctrico, instalación de sardineles y bordillos, instalación de adoquín de arcilla, tableta táctil y loseta toperol y señalización. Hasta el 9 de noviembre se cuenta con el 67.65% de avance de obra.



Diseños Vía longitudinal y ciclorruta- sendero peatonal de Briceño - Sopó

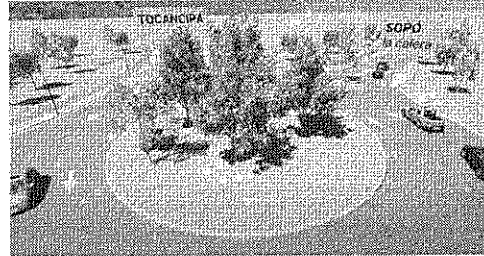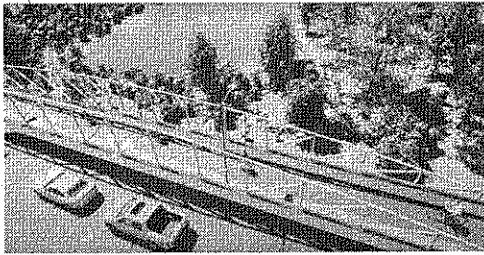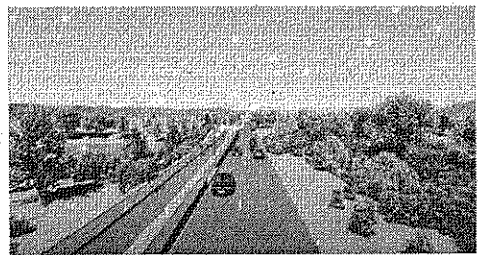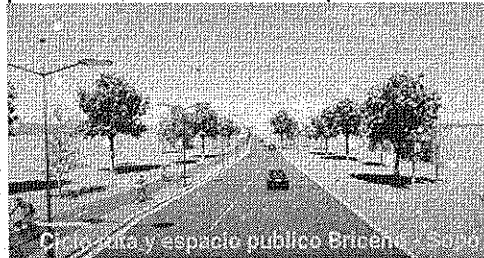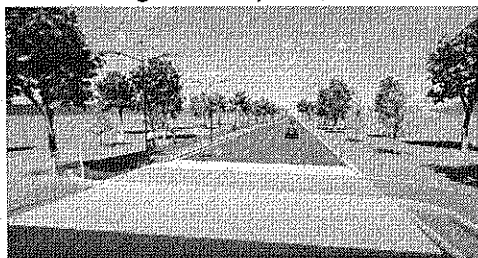



Antes

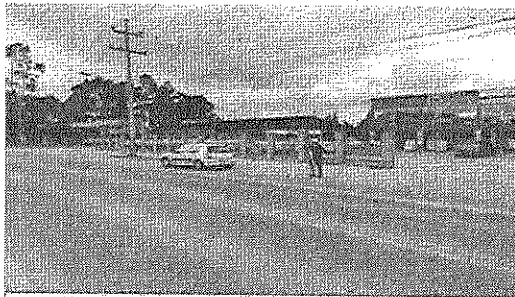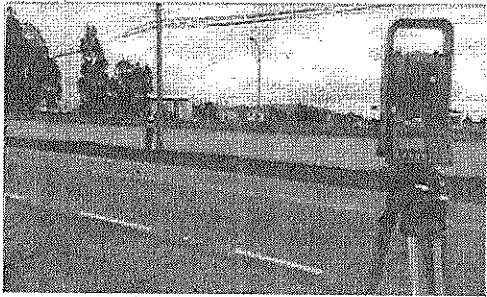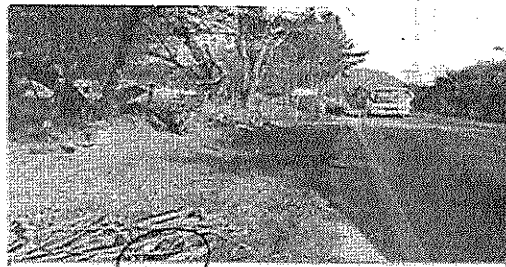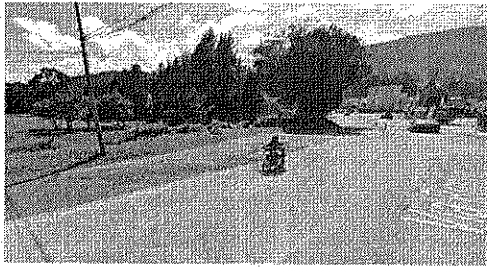


Durante

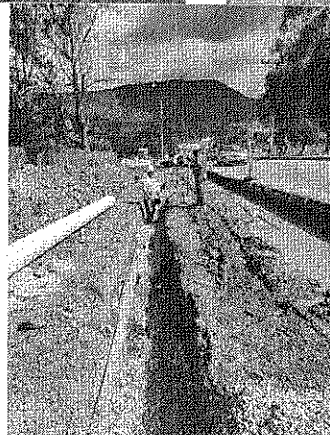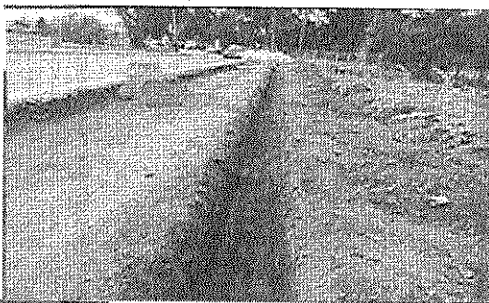



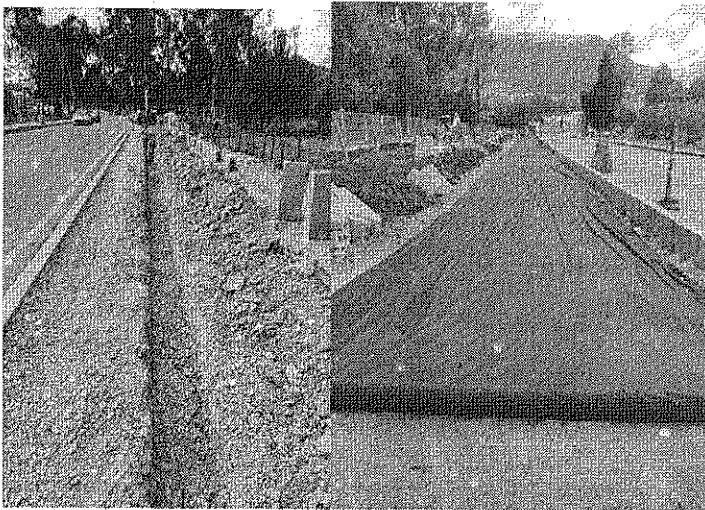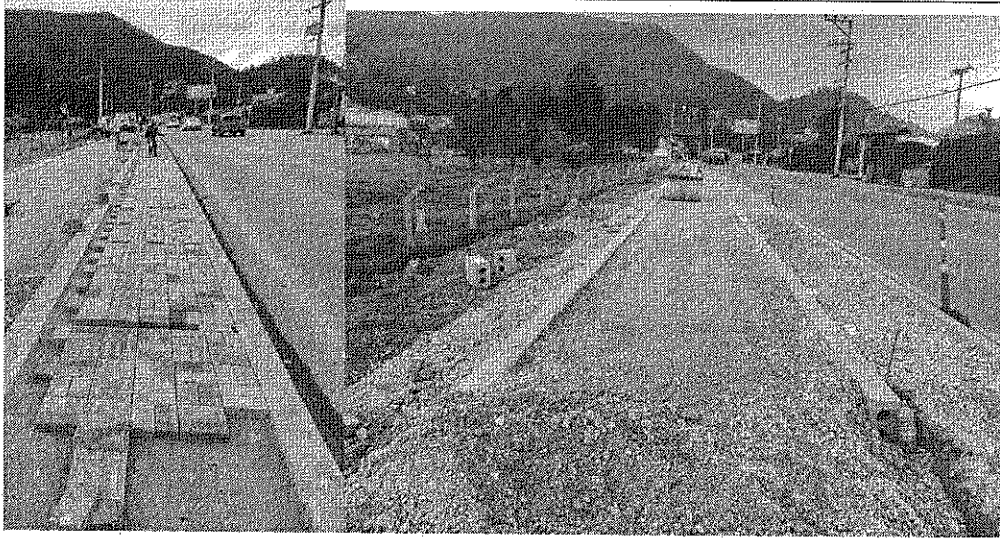

Después

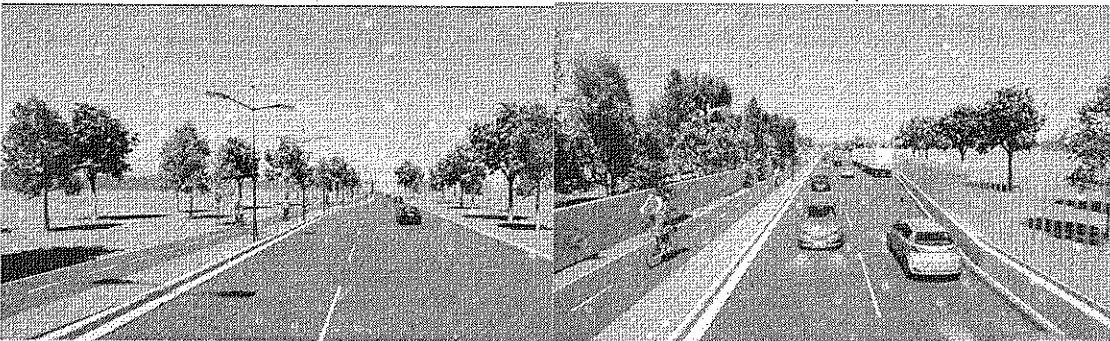



## **AÑO 2021**

**22.Meta de producto:** Construir 1 km de vías urbanas y rurales del municipio

**Descripción:** Se realizó el diseño de la vía y se dio inicio a la gestión de los recursos para su ejecución.


## **AÑO 2022**

**22.Meta de producto:** Construir 1 km de vías urbanas y rurales del municipio

- **Descripción:** Se suscribe convenio No. D-CV-2022-0010 suscrito entre el Municipio de Sopó y la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA QUE SE EFECTÚE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOPÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA." con fecha de inicio del 01 de noviembre de 2022, con el fin de realizar la construcción de 2000 metros lineales de placa huella en la vía Piedra Herrada, 1100 metros lineales de placa huella en la vía El Manzano, y 850 metros lineales de rehabilitación de la carpeta asfáltica vía Meusa - La Violeta. A la fecha, se han ejecutado 100 ml en el sector de Piedra Herrada, realizando actividades de conformación de la calzada, mejoramiento con subbase e instalación de geotextil.

- **Registro Fotográfico**

Inicio de la construcción de 2000 ML de placa huella convenio Ejército Nacional:

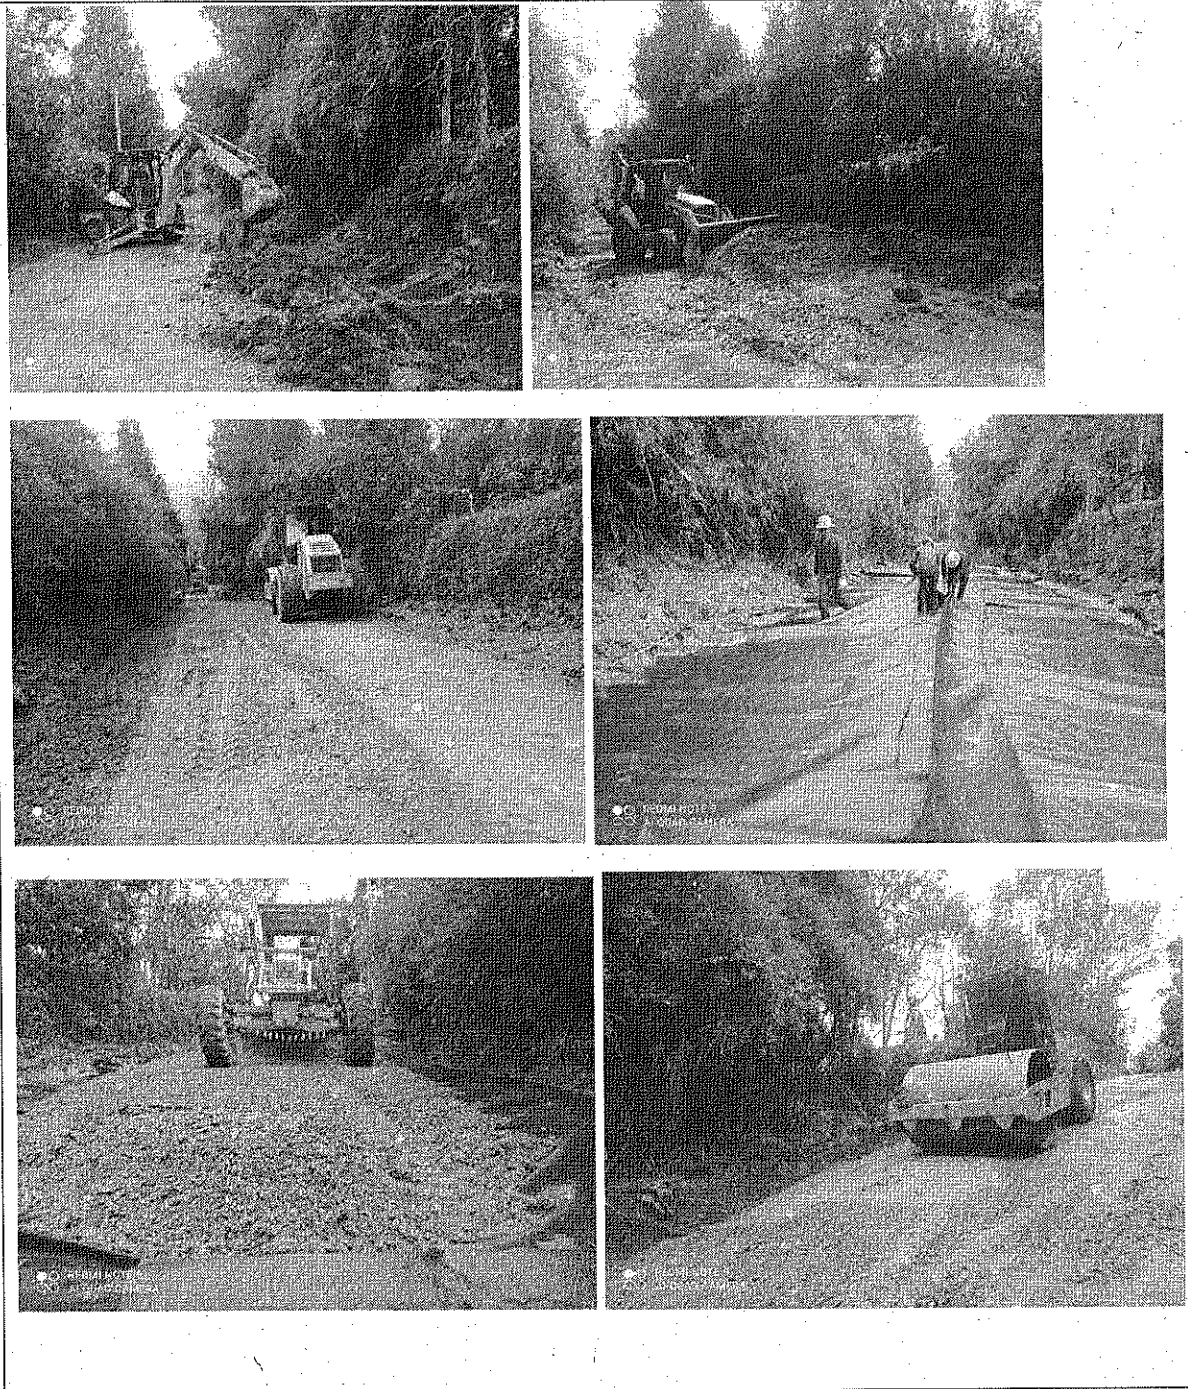




## AÑO 2023

**22. Meta de producto:** Construir 1 km de vías urbanas y rurales del municipio

**Descripción:** para la vigencia 2022 se suscribe convenio No. D-CV-2022-0010 suscrito entre el Municipio de Sopó y la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA QUE SE EFECTÚE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O

CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOPÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA." con fecha de inicio del 01 de noviembre de 2022, con el fin de realizar la construcción de 1800 metros lineales de placa huella en la vía Piedra Herrada. Para el año 2023 se continuaron realizando actividades en la vía piedra herrada con la conformación de la calzada existente, excavaciones varias, instalación de geotextil, extendido y compactación de material granular, armado de acero de refuerzo, construcción de huella, construcción de concreto ciclópeo, y concreto para cuneta; con una ejecución final del 75% de lo planeado inicialmente en el convenio, el cual queda liquidado.

#### REGISTRO FOTOGRAFICO

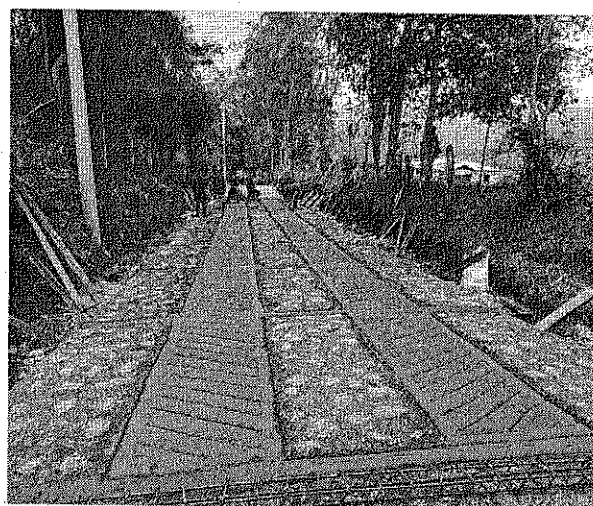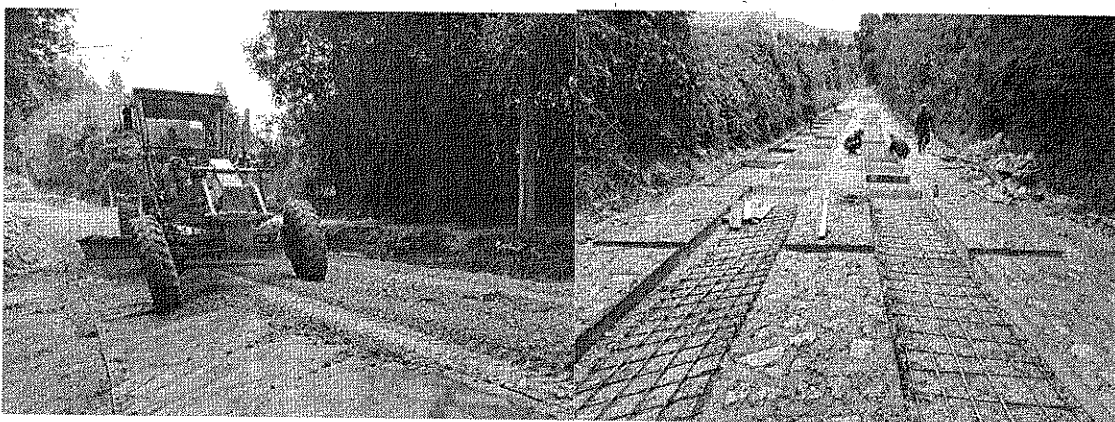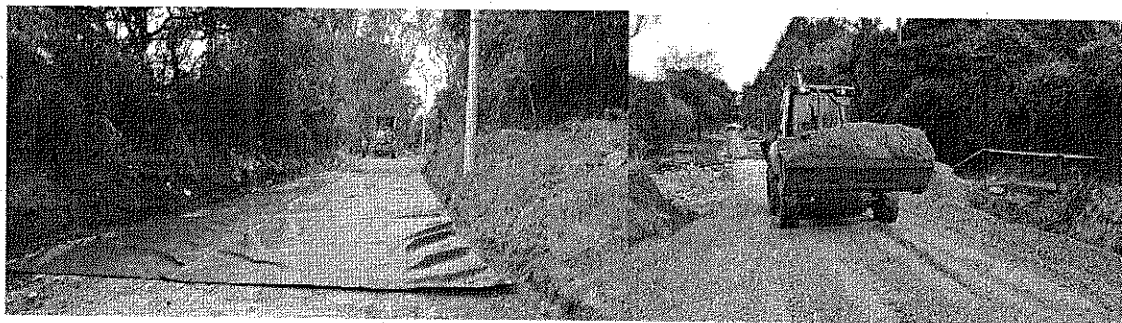

**AÑO 2020**

**23.Meta de producto:** Adecuar y/o mejorar 3 kilómetros vías urbanas y rurales del municipio

**Descripción:** Se construyó la placa huella con 283.7 ml en la vía que conduce de la vereda Centro Alto sector Comuneros al sector Soto y sector Santuario.

Se construyeron las placas huellas con 247 ml en la vía que conduce de la vereda Mercenario a la vereda San Gabriel sector El Manzano, ampliando el perfil existente a 5.5 ml.

Se realizó bacheo en el área urbana.

Por otra parte, se demolió y reparó el concreto de la intersección en el sector Lara gestionado directamente por la administración Municipal.

Se construyó cárcamo y se sellaron juntas en la placa huella del sector el Carmen con mano de obra de la entidad.

Se realizó convenio interadministrativo con EMSERSOPO con el fin de realizar actividades de ornato, mantenimiento y adecuación de la red vial.

Se encuentra en proceso de contratación el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la malla vial urbana y rural y su interventoría.



Se adelanta el convenio interadministrativo con el Ejercito Nacional - CENAC para el mejoramiento de la vía terciaria en donde se realizará un tramo de 300m en placa huella y el otro tramo de 1060m con estabilización con suelo cemento en la vía que conduce al parque ecológico Pionono.

NOMBRE DE LA VIA	TIPO DE MANTENIMIENTO	FORMA DE EJECUCION	DE	KM
Transversal - Glorieta de Alpina - Carrera 4 - Calle 3 sur - Calle 2 sur con carrera 3- Carrera 3 - Calle 2 sur.	Reparqueo	Compensación Asocentro	con	0.135
<b>TOTAL</b>				<b>0.135</b>




➤ **Registro Fotográfico**





### **Placa Huella sector Comuneros**

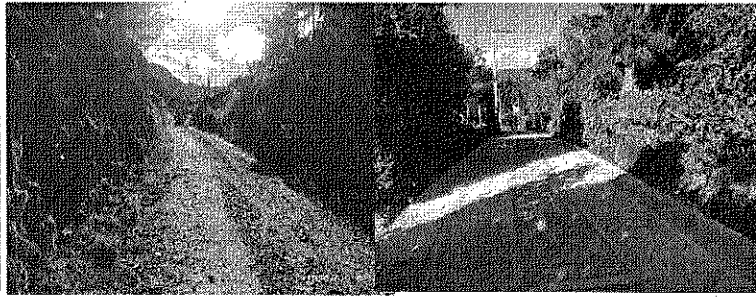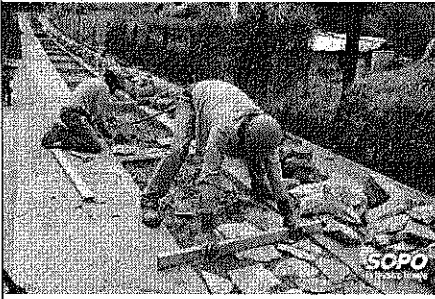

### **Placa Huella sector El Manzano**

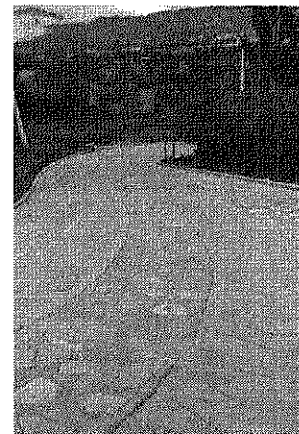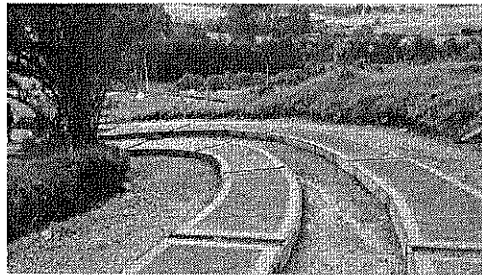
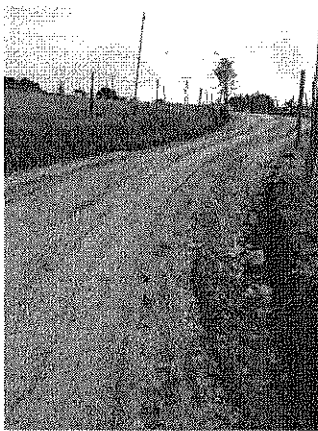


### **Parcheo zona urbana**

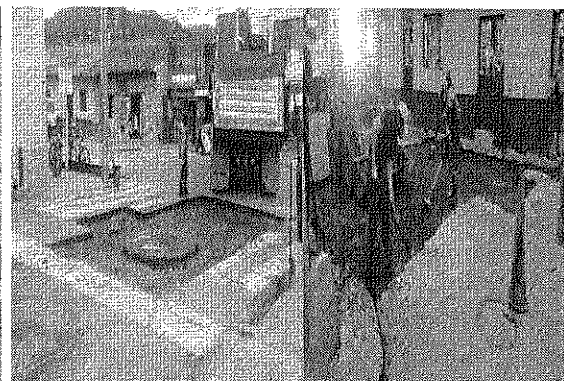
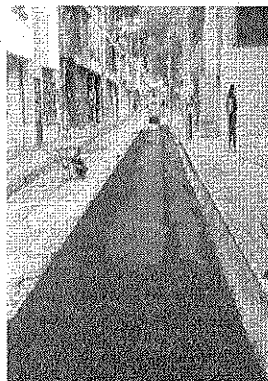


### **Placa en Concreto sector Lara**



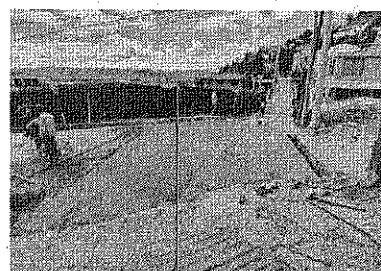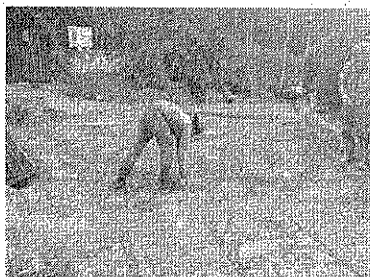





### **Cárcamo y juntas sector El Carmen**

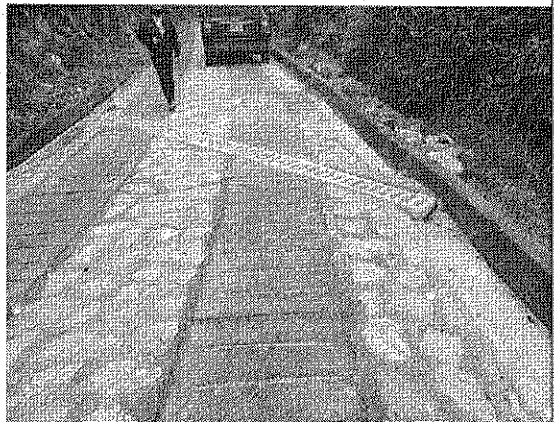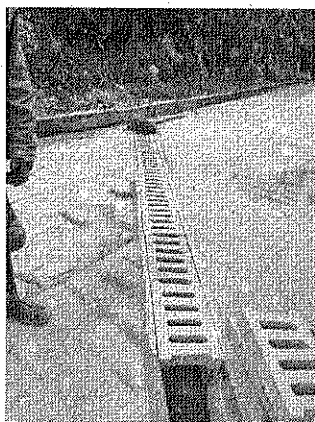

### **Ornato, mantenimiento y adecuación de la infraestructura vial**



Actividades de ornato, mantenimiento y adecuación del espacio público adyacente a la red vial, zonas públicas, zonas verdes de las instituciones educativas departamentales.

Vía Trinidad – Cerro Fuerte, Vía carolina Alta – Alpina, Vía Centro Alto, Capilla, Sector El Carmen, Glorieta de Alpina, Parque principal, Vía San Gabriel Mercenario, vía Chuscal Alto – La Virgen, Vía Bellavista – Los Españoles, Carrera 5, carrera 3 sur, transversal 6, vía salón San Agustín.

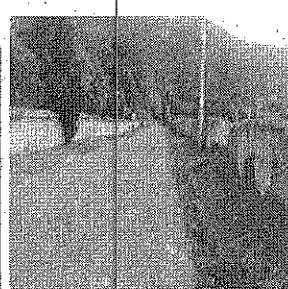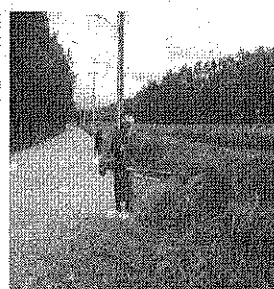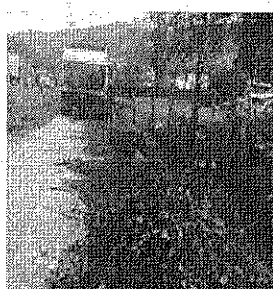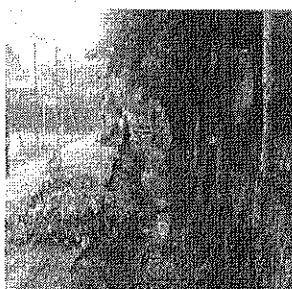

FUMIGACIÓN DE VIAS RURALES  
(16.004 ml)

Vereda La violeta, Vereda Mercenario, Vereda San Gabriel y en ejecución el tramo San Felipe - La Virgen. La Virgen - Chuscal.



## AÑO 2021

**23.Meta de producto:** Adecuar y/o mejorar 3 kilómetros vías urbanas y rurales del municipio

**Descripción:** Se realizó la formulación de proyectos para la construcción de placa huellas en las veredas San Gabriel, Piedra Herrada, Comuneros, San Agustín, Carolina Alta y Pueblo los cuales fueron presentados ante el Ministerio del Interior, a la fecha se encuentran en revisión.

Se realiza intervención en sector Hato Grande, la cual contó con mejoramiento de la capa granular existente y el reemplazo de la superficie de rodadura, por una completamente nueva. Esto gracias al trabajo conjunto con ASOCENTRO.

A través del convenio D-CV-2021-0010, entre el Municipio de Sopó y la empresa de servicios públicos EMSERSOPÓ, el cual tiene como objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ORNATO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ADYACENTE A LA RED VIAL, ESPACIO PÚBLICO EN GENERAL, ZONAS VERDES PÚBLICAS Y ZONAS VERDES DE LAS IED DEL MUNICIPIO DE SOPÓ", se realizan labores de ornato en las cuales cabe para esta meta resaltar la limpieza y mantenimiento de las cunetas y senderos peatonales a lo largo de las vías del municipio.

Se realizaron labores de Re parcheo en la vía La Violeta - San Gabriel, donde se buscó reparar los puntos más críticos y brindar nuevamente el confort para el uso de la vía existente. Esta jornada se realizó con el apoyo del personal operativo de la secretaría de infraestructura.

**AÑO 2022**

**23.Meta de producto:** Adecuar y/o mejorar 3 kilómetros vías urbanas y rurales del municipio

- **Descripción:** Mediante el convenio No. 1132 de 2021 suscrito entre la JAC de Comuneros y el IDACO se realizó la construcción de 84 ml de placa huella.
- Mediante el convenio No. 1492 de 2021 suscrito entre la JAC de Piedra Herrada y el IDACO se realizó la construcción de 40 ml de placa huella.
- Se recibieron los productos de los diseños del contrato de consultoría No. CM-2021-0519, con objeto "CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MERCENARIO SECTOR PIEDRA HERRADA HASTA VEREDA SAN GABRIEL SECTOR YERBABUENA (8Km) Y LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA GRATAMIRA SECTOR MARGARITAS HASTA EL LÍMITE CON EL MUNICIPIO GUASCA EN LA VEREDA MEUSA (5Km) EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020 – 2023"
- Se realizó la formulación y radicación de proyectos ante la convocatoria del IDACO No. 005-2022 para la gestión de recursos para la construcción de placa huella en las veredas, Comuneros, El Chuscal, Meusa, Carolina Alta, Hatogrande II, y mantenimiento salón comunal Hato Grande, Adecuación escenario deportivo Pueblo Viejo, y adecuación parque Jardín del Norte.

De acuerdo a los proyectos presentados a la convocatoria del IDACO, solo quedó viabilizado la placa huella de la vereda El Chuscal, en espera de aprobación técnica de acuerdo a la visita realizada por el IDACO para la suscripción del convenio.

- Se cuenta con la aprobación de los recursos del presupuesto participativo para la construcción de dos placas huellas, una en la vereda Pueblo Viejo y otra en la vereda Meusa Alta y la instalación de barreras de protección en la vereda Centro Alto sector San Felipe y en la vereda Carolina Alta sector Rivas.
- Se suscribe convenio No. D-CV-2022-0010 suscrito entre el Municipio de Sopó y la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA QUE SE EFECTÚE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOPÓ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA." con fecha de inicio del 01 de noviembre de 2022, con el fin de realizar la construcción de 2000 metros lineales de placa huella en la vía Piedra Herrada, 1100 metros lineales de placa huella en la vía El Manzano, y 850 metros lineales de rehabilitación de la carpeta asfáltica vía Meusa - La Violeta. A la fecha, se han ejecutado 100 ml en el sector de Piedra Herrada, realizando actividades de conformación de la calzada, mejoramiento con subbase e instalación de geotextil.
- A través del convenio D-CV-2022-0009, entre el Municipio de Sopó y la empresa de servicios públicos EMSERSOPÓ, el cual tiene como objeto "**Aunar esfuerzos**

técnicos, administrativos, jurídicos, ambientales y financieros para la realización de actividades de ornato, mantenimiento y adecuación del espacio público en general, zonas verdes públicas y zonas verdes de las IED del municipio de Sopó." Se realizan labores de ornato en las cuales cabe para esta meta resaltar la limpieza y mantenimiento de las cunetas y senderos peatonales a lo largo de las vías del municipio.

RESUMEN ÁREAS INTERVENIDAS	
SECTOR	CANTIDAD (ML)
<b>VÍAS URBANAS</b>	
Transversal sexta	1.388,00
Calle 3 Sur entre variante y estadio	742,00
<b>TOTAL, VÍAS URBANAS</b>	<b>2130,00</b>

- La Secretaria de Infraestructura suscribió contrato de suministro de materiales con los cuales se realizaron los mantenimientos a la malla vial rural y urbanas, realizando el mantenimiento en asfalto a las superficies que lo requieran, lo anterior se realizó con maquinaria propia de la Secretaría y el equipo operativo con el que se cuenta. A continuación, se relacionan las vías que contaron con intervención:


LOCALIZACIÓN	TIPO MEJORAMIENTO	DE ML INTERVENCIÓN
Carrera 1 con calle 2	Asfalto	30
Carrera 6, San Agustín	Asfalto	200
Briceño, Calle 3 con cra 7	Asfalto	250

Jardín del norte	Asfalto	200
Calle 3 sur entre cra 3 y 1A	Asfalto	100
Calle 2 entre cra 3 y 1A	Asfalto	50
Carrera 5, Rincón del Norte	Asfalto	150
Carrera 2 entre calle 4 y 5	Asfalto	230
Carrera 2 entre calle 1 y 2	Asfalto	100
Carrera 4	Asfalto	70
Pueblo viejo	Fresado	315
Barro Sauces	Asfalto	50
Calle 2 entre cra 4 y 3	Asfalto	50
Comuneros	Placa huella	84
Piedra Herrada	Placa huella	40
<b>TOTAL</b>		<b>1919,00</b>



- **Registro Fotográfico**

Inicio de la construcción de 2000 ML de placa huella convenio Ejercito Nacional:





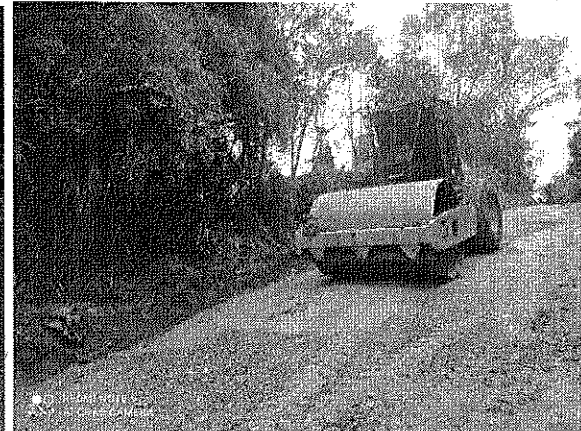


Placa Huella vereda Comuneros:

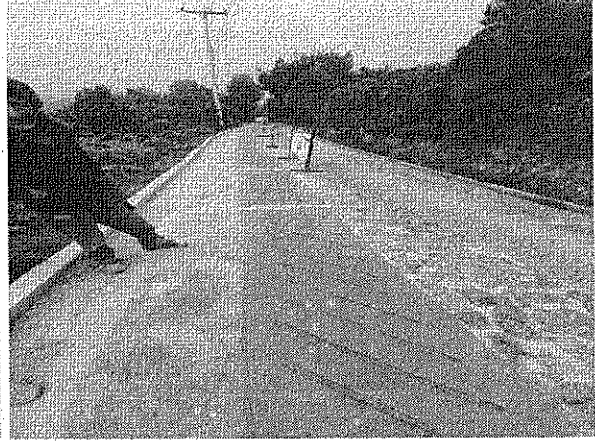
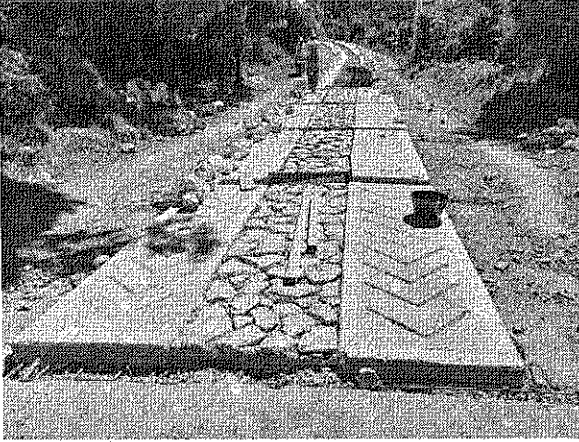


Placa Huella Piedra Herrada:

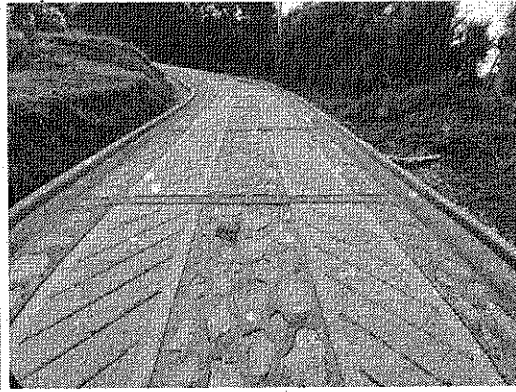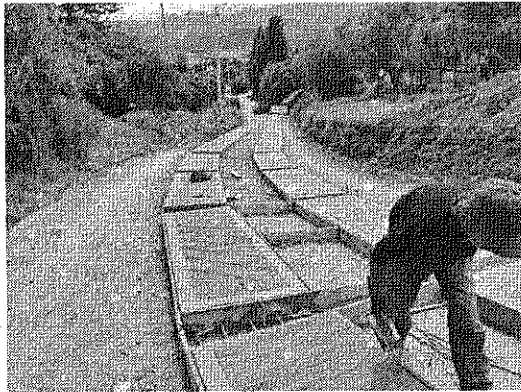

Transversal sexta:






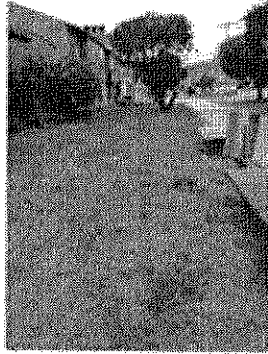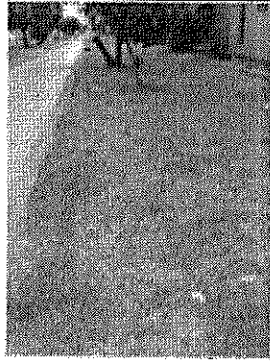

ANTES

Calle 3 sur entre variante y estadio:


DESPUÉS




ANTES

DESPUÉS


Carrera 1 con calle 2

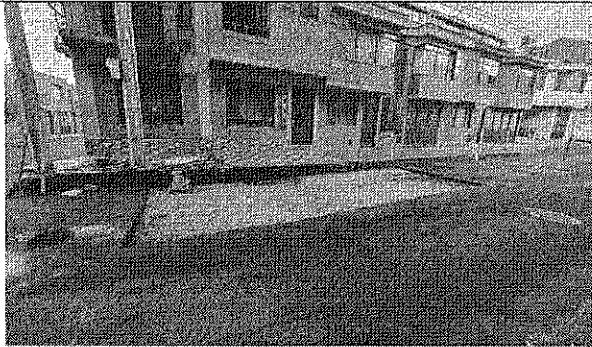

Carrera 6, San Agustín

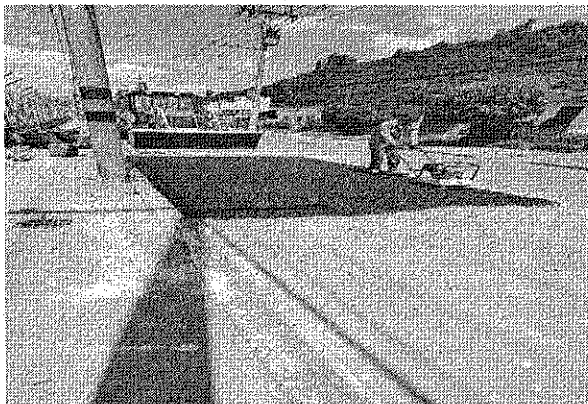


Briceño, Calle 3 con cra 7

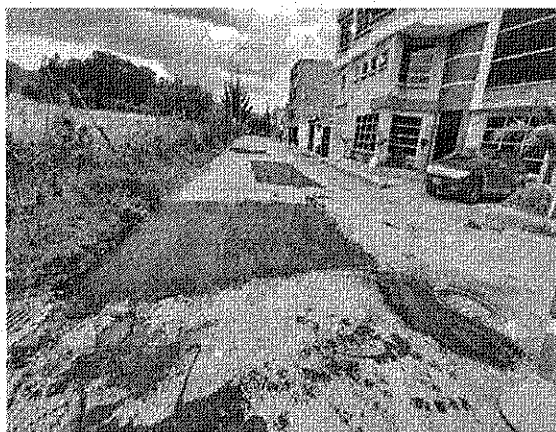





Jardín del norte

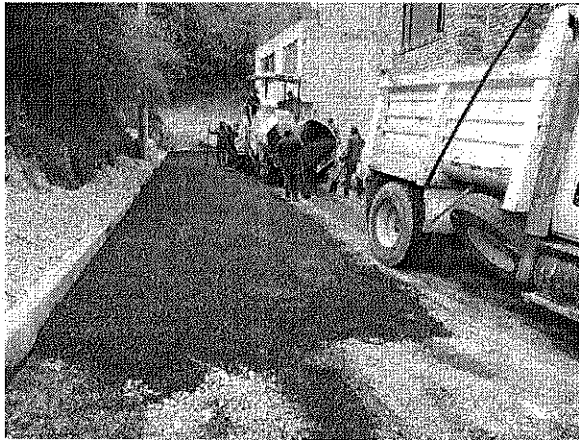

Calle 3 sur entre cra 3 y 1A

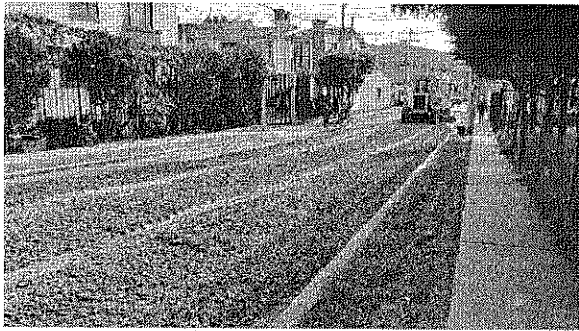


Carera 5, Rincón del Norte

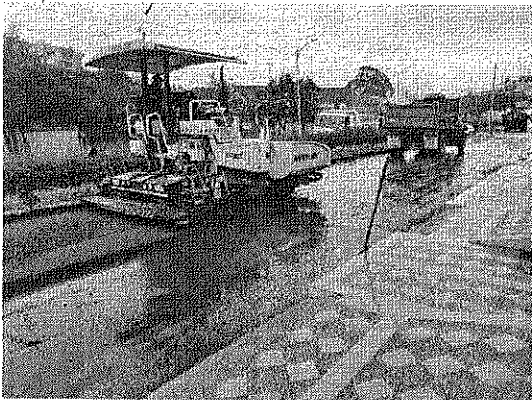

Carrera 2 entre calle 4 y 5




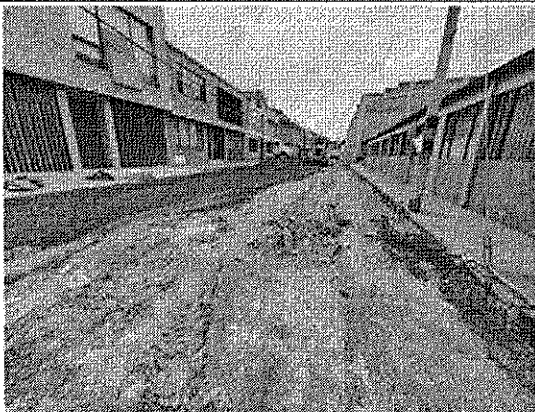


Carrera 2 entre calle 1 y 2




Carrera 4

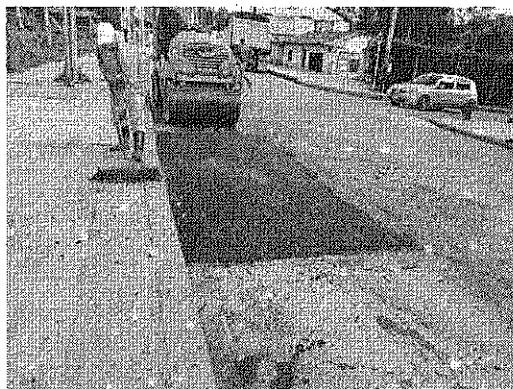

Pueblo viejo

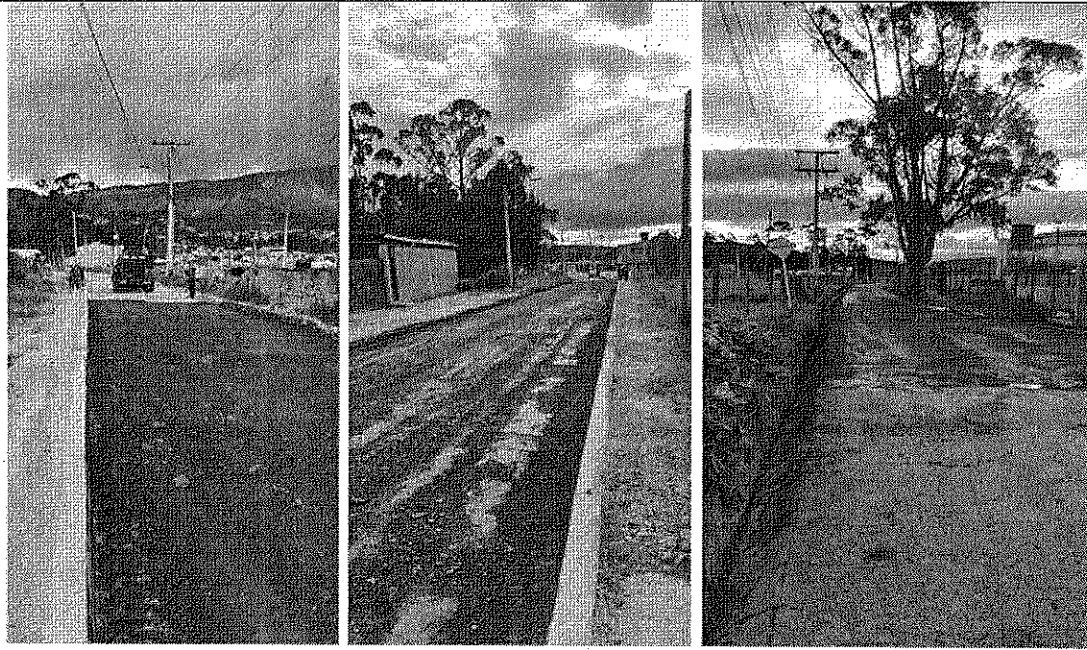

Barro Sauces

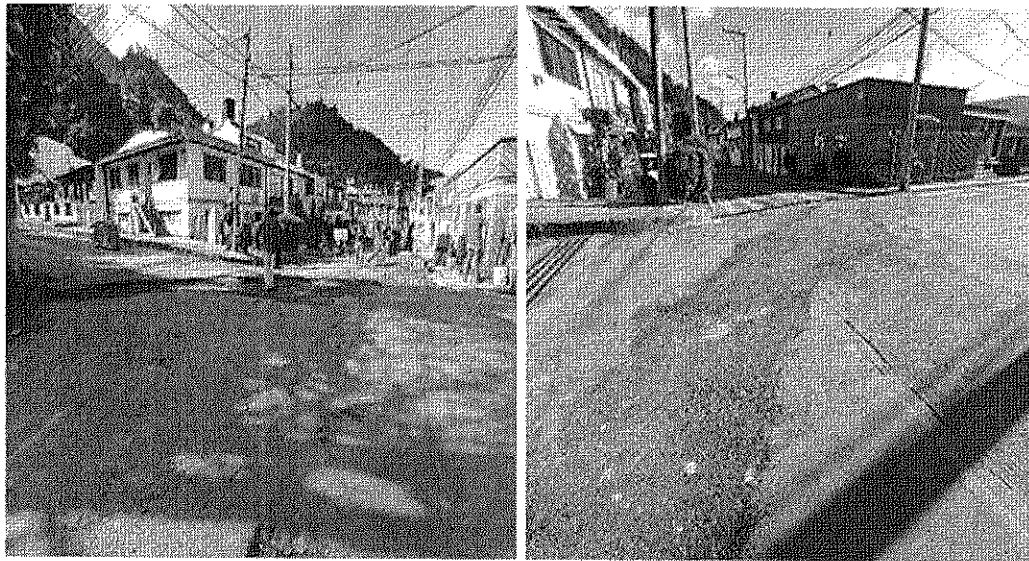

Calle 2 entre cra 4 y 3



A través del convenio D-CV-2021-0010, entre el Municipio de Sopó y la empresa de servicios públicos EMSERSOPÓ, el cual tiene como objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ORNATO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO ADYACENTE A LA RED VIAL, ESPACIO PÚBLICO EN GENERAL, ZONAS VERDES PÚBLICAS Y ZONAS VERDES DE LAS IED DEL MUNICIPIO DE SOPÓ", se realizan labores de ornato en las cuales cabe para esta meta resaltar la limpieza y mantenimiento de las cunetas y senderos peatonales a lo largo de las vías del municipio.

Se realizaron labores de Re parcheo en la vía La Violeta - San Gabriel, donde se buscó reparar los puntos más críticos y brindar nuevamente el confort para el uso de la vía existente. Esta jornada se realizó con el apoyo del personal operativo de la secretaría de infraestructura.

## AÑO 2023.

**23.Meta de producto:** Adecuar y/o mejorar 3 kilómetros vías urbanas y rurales del municipio



- **Descripción:** para la vigencia 2023 la secretaria de Infraestructura suscribió contrato de suministro de materiales con los cuales se realizaron los mantenimientos a la malla vial rural y urbanas, realizando el mantenimiento en asfalto a las superficies que lo requieran, lo anterior se realizó con maquinaria propia de la Secretaría y el equipo operativo con el que se cuenta. A continuación, se relacionan las vías que contaron con intervención:

LOCALIZACIÓN	TIPO DE MEJORAMIENTO	ML DE INTERVENCIÓN.
San Agustín carrera 1	Mejoramiento de carpeta asfáltica	162
Los Sauces	Mejoramiento de carpeta asfáltica	87
Quintas de Ceramita	Mejoramiento de carpeta asfáltica	44
Carrera 4	Mejoramiento de carpeta asfáltica	300


Trinidad	Mejoramiento de carpeta asfáltica	50
La Glorieta	Mejoramiento de carpeta asfáltica	20
Calle 3 entre Carrera 6 y 5	Mejoramiento de carpeta asfáltica	76

#### REGISTRO FOTOGRAFICO:

##### San Agustín carrera 1

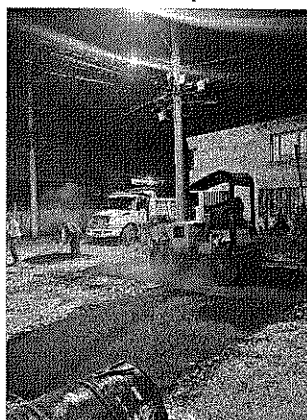
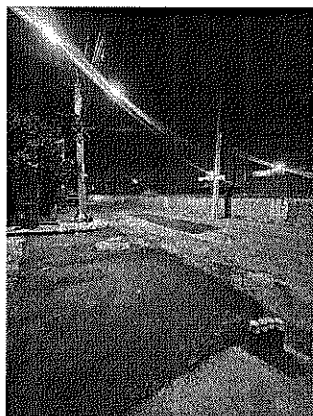


##### Los Sauces


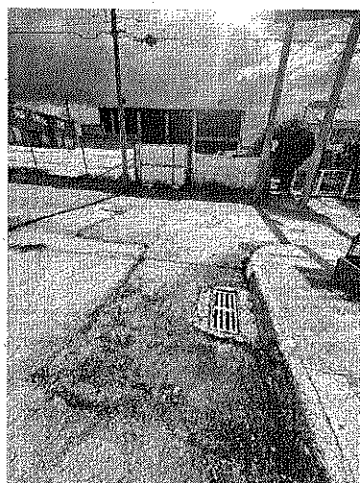


##### Quintas de ceramita



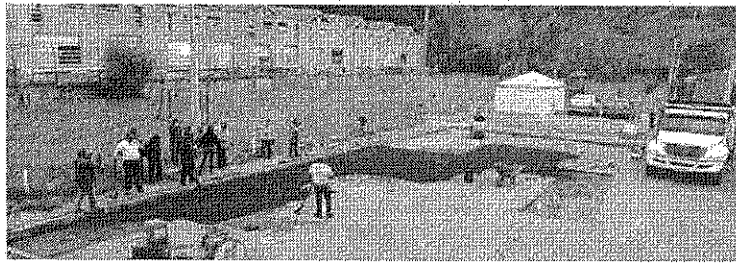
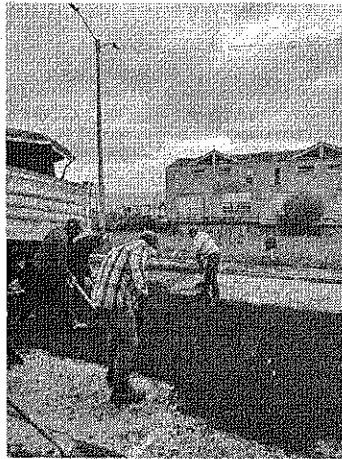


Carrera 4

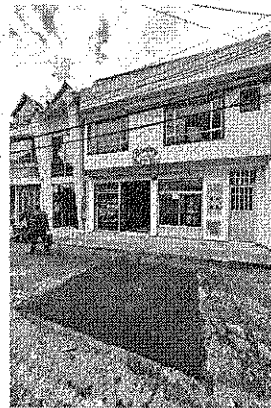
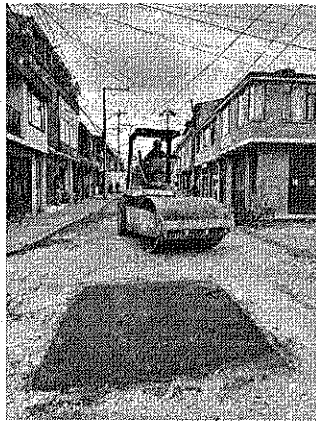




### Trinidad

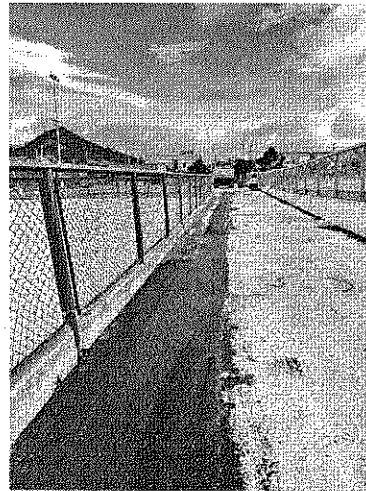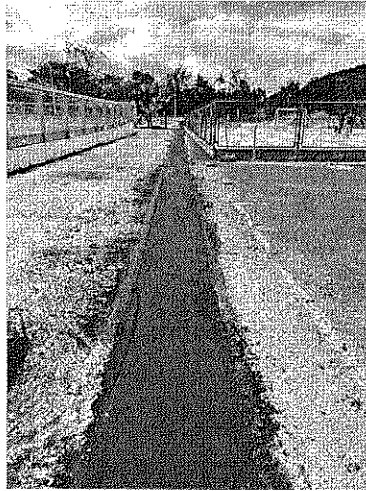

### La Glorieta

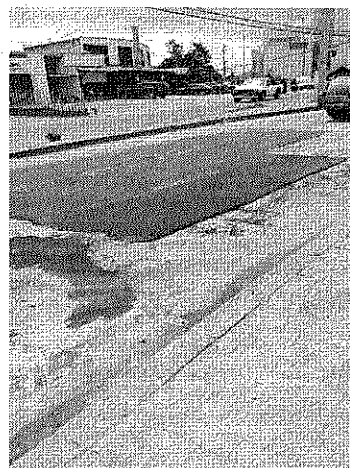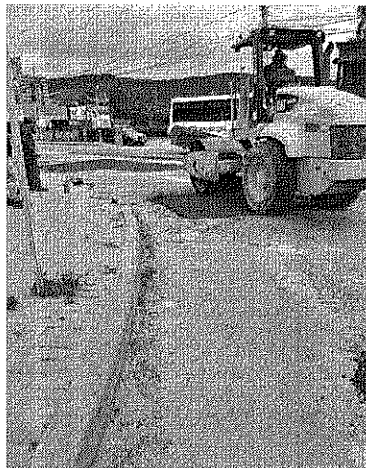

### **AÑO 2020**

**24.Meta de producto:** Ejecutar los estudios y diseños de las unidades funcionales viales en el municipio de Sopó que garanticen a mediano plazo su construcción

**Descripción:** Está en ejecución el contrato la consultoría para realizar los estudios y diseños de la vía longitudinal por la Diana, Pueblo Viejo, Centro Alto a Aposentos.

Se radicó y presentó ante el Honorable Concejo Municipal la solicitud de aprobación de autorización de una operación de crédito en tres ocasiones siendo negada por la comisión de presupuesto del Concejo.

Se adelantan gestiones en la Gobernación de Cundinamarca con el fin de que sea cofinanciada la ejecución de esta importante obra para el Municipio de Sopó.





## **AÑO 2021**

**24. Meta de producto:** Ejecutar los estudios y diseños de las unidades funcionales viales en el municipio de Sopó que garanticen a mediano plazo su construcción

**Descripción:** En la ejecución del contrato CM-2020-0500 se realizaron los estudios y diseños de la vía Longitudinal por la Diana, Pueblo Viejo, Centro Alto a Aposentos. El diseño de la vía consta de una circulación vehicular con un ancho de calzada de 7.00 m. y zona peatonal y ciclo ruta para un total de 17.20m. Que permitirá una mejor movilidad de los vehículos que transitan por este trazado vial, adicionalmente se desarrolló una propuesta urbanística, arquitectónica, paisajística y ecológica con la idea de orden, confort y calidad de vida para beneficio y servicio a la comunidad; teniendo en cuenta la proyección del mejoramiento de la calidad de vida y salud de los habitantes de las comunidades que habitan el sector, adecuando estas zonas como espacio público y estableciendo una relación con el entorno.

Mediante el contrato No. CM-2021-0519, se elaboran los estudios y diseños para el mejoramiento y rehabilitación de la vía que conduce de la vereda Mercenario sector Piedra Herrada hasta vereda San Gabriel sector Yerbabuena y la vía que conduce de la vereda Gratamira sector Margaritas hasta el límite con el municipio Guasca en la vereda Meusa en el municipio de Sopó.

### **• Registro Fotográfico**

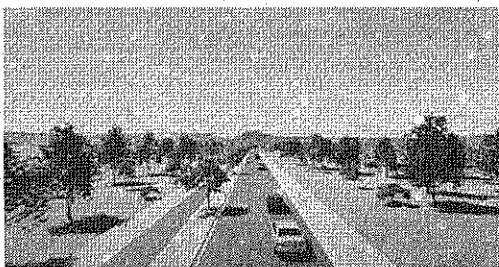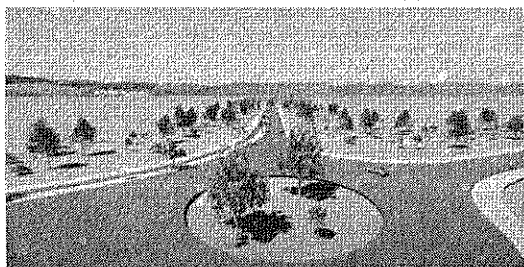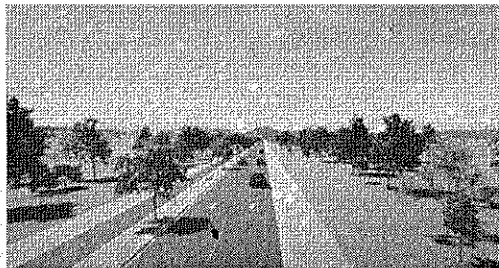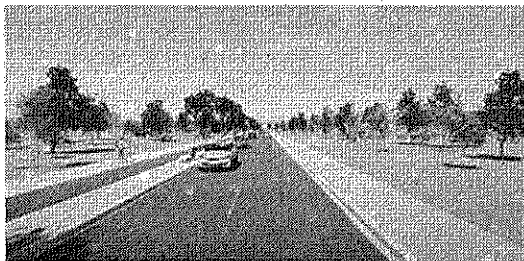



## AÑO 2022

**24. Meta de producto:** Ejecutar los estudios y diseños de las unidades funcionales viales en el municipio de Sopó que garanticen a mediano plazo su construcción

- **Descripción:** En la ejecución del contrato CM-2020-0500 se realizaron los estudios y diseños de la vía Longitudinal por la Diana, Pueblo Viejo, Centro Alto a Aposentos. El diseño de la vía consta de una circulación vehicular con un ancho de calzada de 7.00 m. y zona peatonal y ciclo ruta para un total de 17.20m. Que permitirá una mejor movilidad de los vehículos que transitan por este trazado vial, adicionalmente se desarrolló una propuesta urbanística, arquitectónica, paisajística y ecológica con la idea de orden, confort y calidad de vida para beneficio y servicio a la comunidad; teniendo en cuenta la proyección del mejoramiento de la calidad de vida y salud de los habitantes de las comunidades que habitan el sector, adecuando estas zonas como espacio público y estableciendo una relación con el entorno. Se cuenta con los recursos por empréstito para la ejecución de la ciclo ruta.
- Mediante el contrato No. CM-2021-0519, se elaboran los estudios y diseños para el mejoramiento y rehabilitación de la vía que conduce de la vereda Mercenario sector Piedra Herrada hasta vereda San Gabriel sector Yerbabuena y la vía que conduce de la vereda Gratamira sector Margaritas hasta el límite con el municipio Guasca en la vereda Meusa en el municipio de Sopó. De acuerdo a los estudios y diseños de la vía Piedra Herrada se realiza la construcción de placa huella con la suscripción del convenio interadministrativo con el Ejército Nacional.

- **Registro Fotográfico**

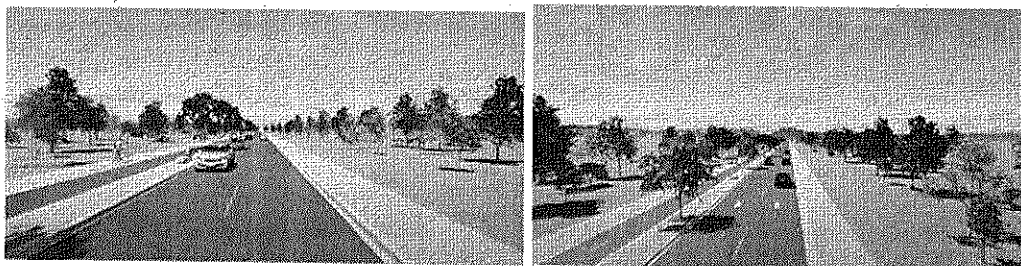

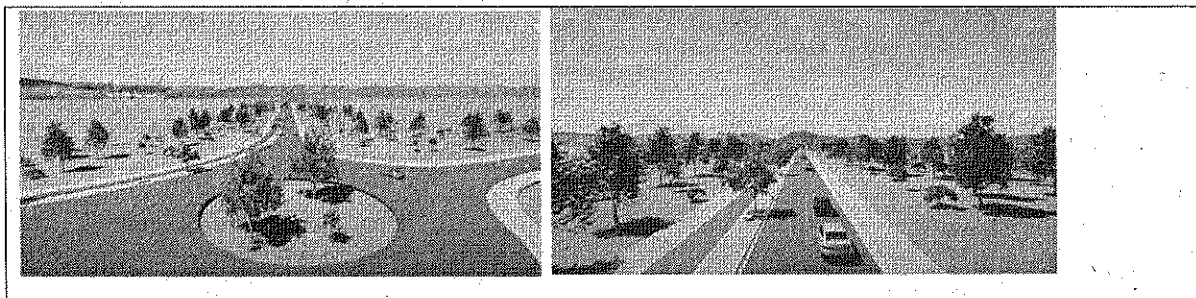

## AÑO 2023

**24. Meta de producto:** Ejecutar los estudios y diseños de las unidades funcionales viales en el municipio de Sopó que garanticen a mediano plazo su construcción

**Descripción:** para la vigencia 2023 se adelantó proceso de consultoría adjudicado con contrato No CM-2023-0869 cuyo objeto es ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES Y URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020 – 2023, con un porcentaje de ejecución del 100% , donde se realizaron los estudios y diseños de las vías: Sector Gómez, Sector Ramírez y Coflexpo, perimetral de oriente guasca y vía longitudinal.

## AÑO 2020

**25. Meta de producto:** Eje Desarrollar un programa de mejoramiento de espacios públicos y entornos comunitarios, involucrando a las JAC y todas las dependencias de la Administración Municipal

**Descripción:** La secretaria en conjunto con la administración municipal ha liderado jornadas de limpieza y mantenimiento al salón comunal, campo deportivo, vías del centro poblado Mercenario, vía a San Gabriel, Paradero y Shut de Basuras en coordinación con la Junta de Acción Comunal de la vereda Mercenario.

Se suministra pintura por parte de la Secretaria de Infraestructuras y Obras Públicas y la Secretaria de Gobierno, para que la comunidad del sector de San Agustín y la vereda de San Gabriel realicen el respectivo mantenimiento a los reductores de velocidad.


La Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas y la secretaria de Gobierno realizan acompañamiento, apoyo técnico y supervisión a la Junta de Acción Comunal de la vereda San Gabriel con respecto al convenio suscrito por el IDACO No. 091-2020 CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IMPACTO SOCIAL PARA LA




CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA SAN GABRIEL DEL MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° IDACO 091-2020 (FONDECÚN 20-010) SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA – IDACO Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN.

➤ **Registro Fotográfico**

**Jornadas de limpieza y mantenimiento Salón Comunal Mercenario**



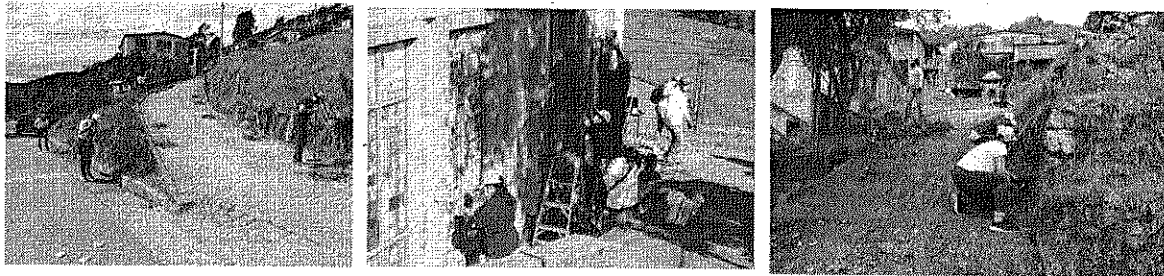


**Reductores de velocidad sector San Agustín**

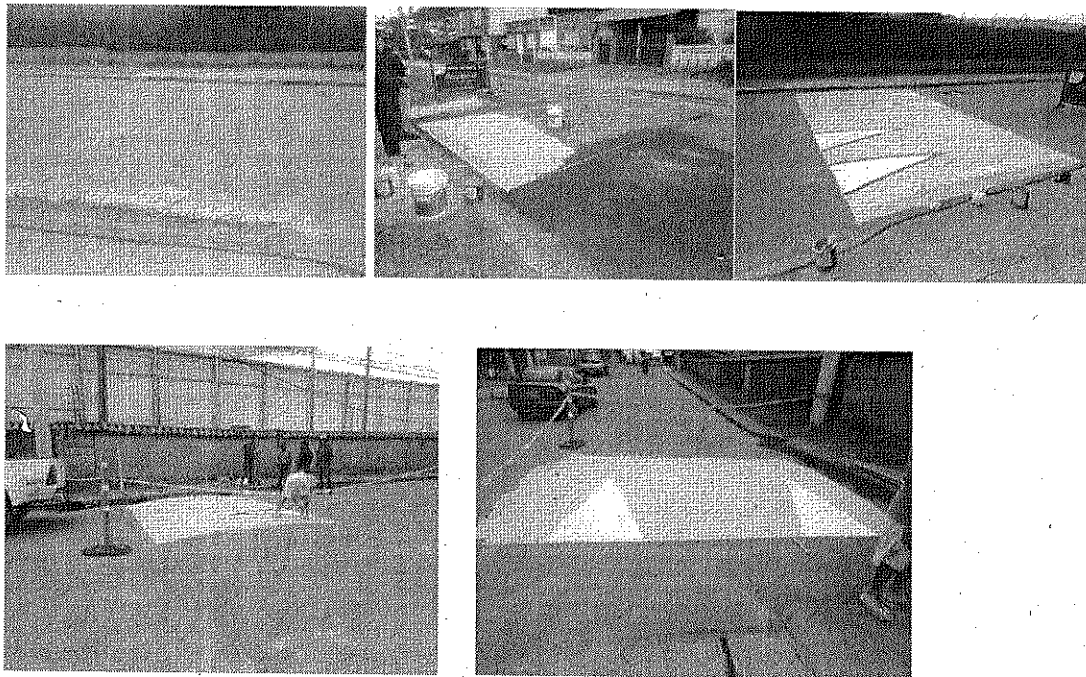





### Reductores de velocidad de la vereda San Gabriel

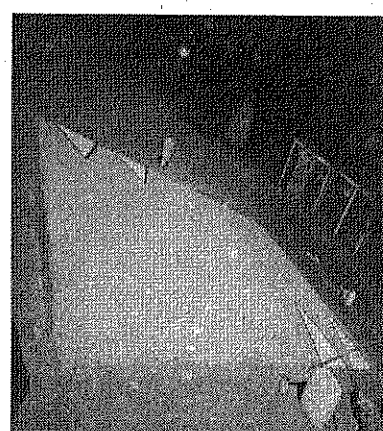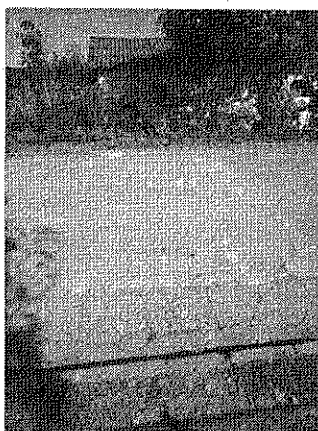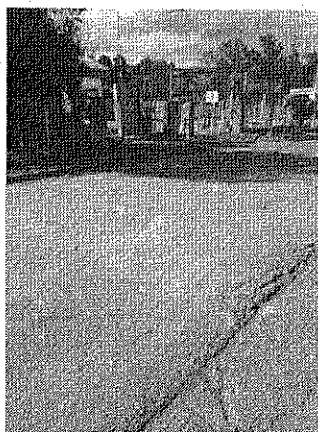

### Placa huella JAC San Gabriel convenio con el IDACO

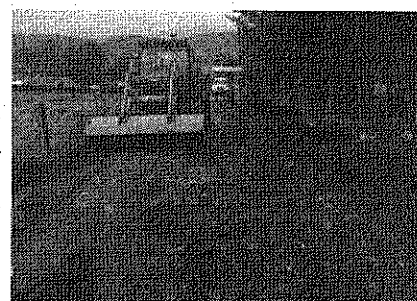

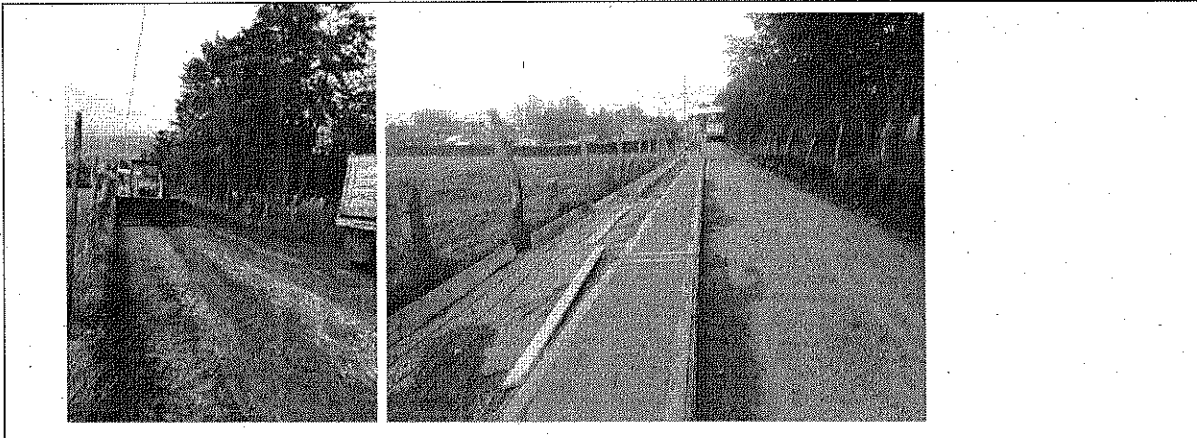

#### **AÑO 2021.**

**25.Meta de producto:** Desarrollar un programa de mejoramiento de espacios públicos y entornos comunitarios, involucrando a las JAC y todas las dependencias de la Administración Municipal.

**Descripción:** La administración municipal desarrolló el programa de Jornadas de Embellecimiento en las diferentes zonas del municipio de Sopó, en donde se contó con el apoyo de la comunidad, de las juntas de acción comunal y del personal de la alcaldía, en donde se desarrollaron jornadas durante la vigencia 2021 en los siguientes sectores, realizando actividades de rocería, podas, aseo del espacio público, tala de árboles entre otros:

Mercenario

Centro Alto

Carolina Alta


Mirador

Pueblo Viejo

Hato grande

Chuscal

Comuneros

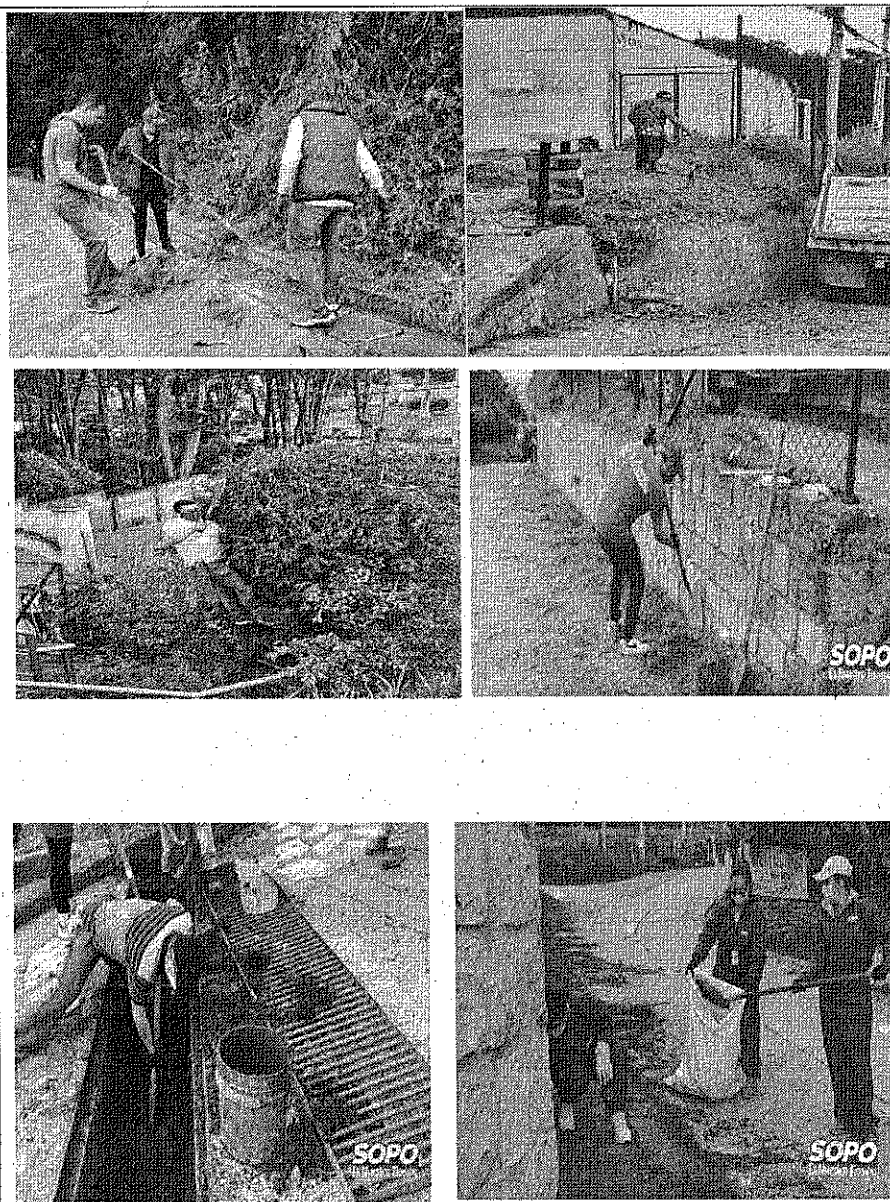

## AÑO 2022

**25.Meta de producto:** Eje Desarrollar un programa de mejoramiento de espacios públicos y entornos comunitarios, involucrando a las JAC y todas las dependencias de la Administración Municipal

**Descripción:** La administración municipal desarrolló el programa de Jornadas de Embellecimiento en las diferentes zonas del municipio de Sopó, en donde se contó con el apoyo de la comunidad, de las juntas de acción comunal y del personal de la alcaldía, en donde se desarrollaron jornadas durante la vigencia 2022 en los siguientes sectores,

realizando actividades de rocería, podas, aseo del espacio público, tala de árboles, pintura entre otros:

Las Quintas de Ceramita - 6, 7 y 8 de abril de 2022



Gratamira - 10 de julio de 2022

Briceño - 09 de agosto de 2022

Comuneros - 11 de septiembre de 2022

- **Registro Fotográfico**

Las Quintas de Ceramita:

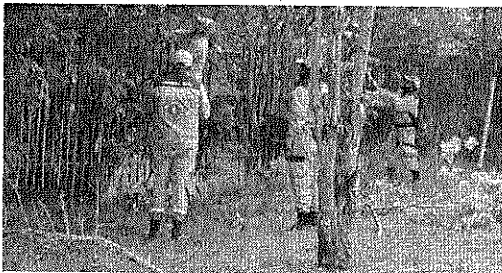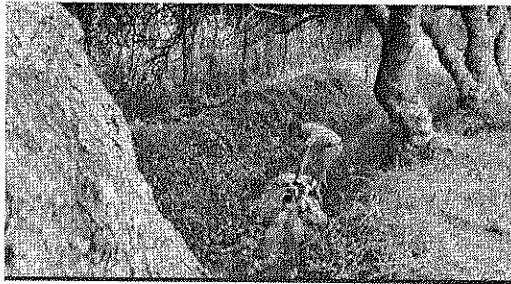




Gratamira:








Briceño:

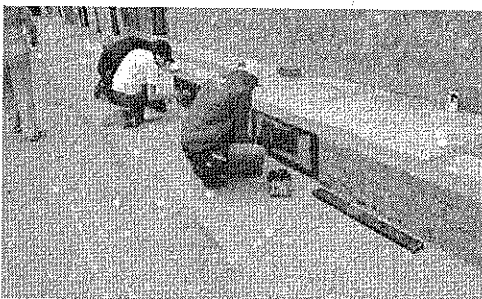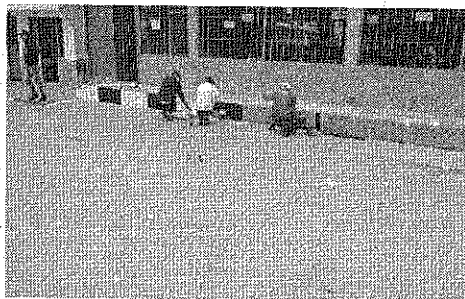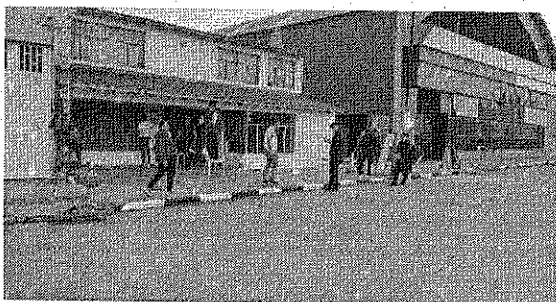

Comuneros:





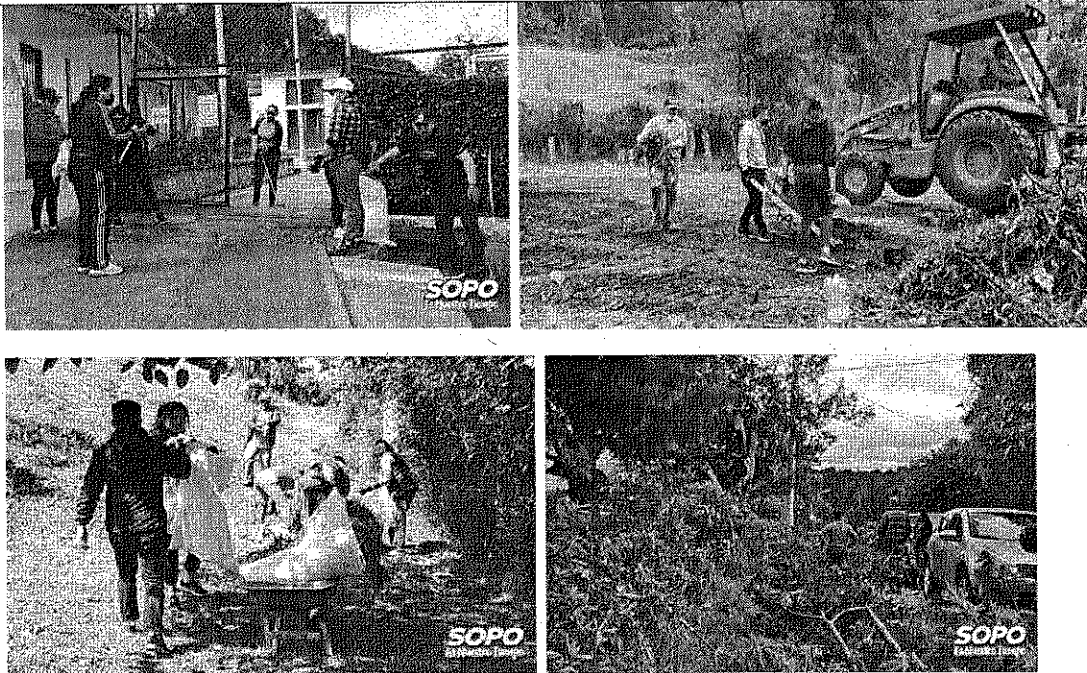

#### AÑO 2023

**25.Meta de producto:** Desarrollar un programa de mejoramiento de espacios públicos y entornos comunitarios, involucrando a las JAC y todas las dependencias de la Administración Municipal


**Descripción:** La administración municipal desarrolló el programa de Jornadas de Embellecimiento en las diferentes zonas del municipio de Sopó, en donde se contó con el apoyo de la comunidad, de las juntas de acción comunal y del personal de la alcaldía, en donde se desarrollaron jornadas durante la vigencia 2023.

#### AÑO 2020

**25.Meta de producto:** Instalar en por lo menos un escenario deportivo iluminación con tecnología LED de tipo profesional

**Descripción:** Esta meta es transversal, y aplica para todos los estudios y diseños y ajustes de Preinversión que son liderados y ejecutados desde la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y la iluminación deberá ser ejecutadas con la tecnología LED en cada uno de los proyectos de infraestructura.



AÑO 2021
<b>25.Meta de producto:</b> Instalar en por lo menos un escenario deportivo iluminación con tecnología LED de tipo profesional
<b>Descripción:</b> Se realiza la construcción de placa para cancha múltiple una gradería y cubierta para polideportivo vereda Meusa en el municipio de Sopó mediante el contrato de obra No.L-2021-0423 y la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social, y seguridad y salud en el trabajo mediante el contrato No. CM-2021-0429, los cuales llevan un 80% de ejecución, en este escenario se tiene contemplado iluminación con tecnología LED tipo profesional la cual se encuentra en ejecución

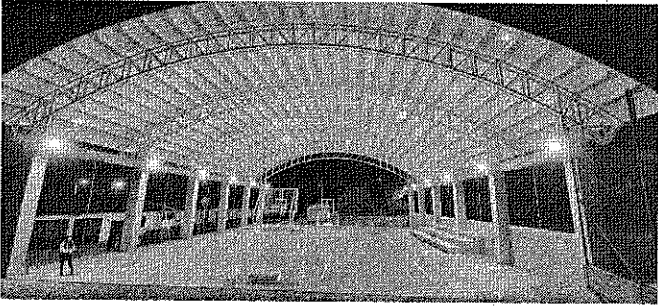AÑO 2022
<b>25.Meta de producto:</b> Instalar en por lo menos un escenario deportivo iluminación con tecnología LED de tipo profesional
<b>Descripción:</b> Se realizó la construcción de placa para cancha múltiple, una gradería y cubierta para polideportiva vereda Meusa en el municipio de Sopó mediante el contrato de obra No. L-2021-0423 y la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social, y seguridad y salud en el trabajo mediante el contrato No. CM-2021-0429, los cuales se encuentran liquidados a la fecha, en este escenario deportivo se contempló la iluminación con tecnología LED tipo profesional la cual se encuentra en funcionamiento.
<p>Por otra parte, se encuentra en ejecución la construcción del escenario deportivo en el centro poblado de Briceño sector Cerro Fuerte mediante contrato de obra No. L-2021-0569 y contrato de interventoría No. CM-2021-0572, el cual se tiene contemplada la instalación de iluminación LED.</p>


AÑO 2023
<b>25.Meta de producto:</b> Instalar en por lo menos un escenario deportivo iluminación con tecnología LED de tipo profesional

**Descripción:** Se realizó la construcción de placa para cancha múltiple, una gradería y cubierta para polideportiva vereda Meusa en el municipio de Sopó mediante el contrato de obra No. L-2021-0423 y la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social, y seguridad y salud en el trabajo mediante el contrato No. CM-2021-0429, los cuales se encuentran liquidados a la fecha, en este escenario deportivo se contempló la iluminación con tecnología LED tipo profesional la cual se encuentra en funcionamiento.

Por otra parte, se encuentra se realiza la entrega de la construcción del escenario deportivo en el centro poblado de Briceño sector Cerro Fuerte mediante contrato de obra No. L-2021-0569 y contrato de interventoría No. CM-2021-0572, el cual contempla instalación de iluminación LED, se encuentre en funcionamiento.

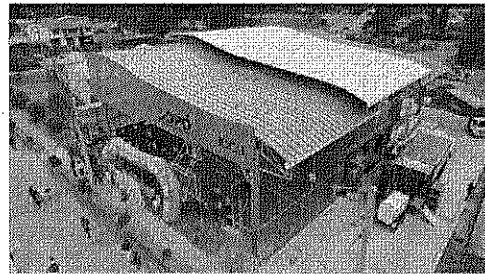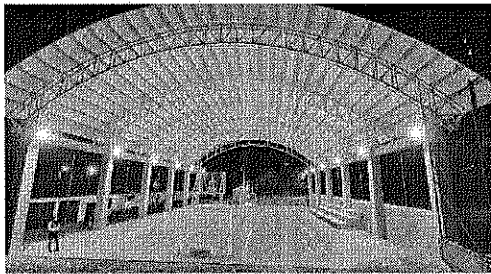


## AÑO 2020

**26.Meta de producto:** Realizar en por lo menos 3 veredas (Gratamira, Meusa y Chuscal Manas Altas y Manas Bajas) y un sector de la Zona Urbana la ampliación de la cobertura de gas natural

**Descripción:** Se está realizando en la actualidad la coordinación con la Empresa Gas Natural para la expansión de las redes en los centros poblados de Mercenario y La Violeta.

### ➤ Registro Fotográfico

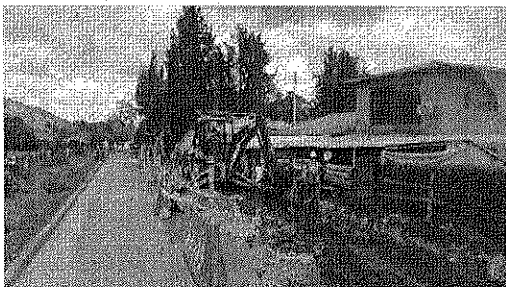

#### 4.SITUACIÓN DE LOS RECURSOS - BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

AÑO 2020

Detalle de cumplimiento de metas del plan de desarrollo vigencia 2020:

Descripción de la meta de producto	Meta de la vigencia	Avance Meta 2020
Ejecutar el 100% de la nueva infraestructura del colegio Pablo VI garantizando una adecuada operación en el servicio educativo.	31%	31%
Modernizar y/o adecuar en un 50% la Infraestructura existente del complejo deportivo La Trinidad, articulando los espacios por medio de una integración paisajística y generando su reactivación deportiva	43%	43%
Construir y adecuar en 4 sectores rurales espacios recreo deportivos	10%	10%
Realizar los estudios, diseños y la construcción de 4 escenarios de alto impacto deportivo y competitivo	10%	10%
Implementar un sistema de iluminación de bajo consumo y/o sostenible en el escenario deportivo Estadio Municipal José Vicente Rodríguez Riaño	NP	NP
Elaborar los estudios y diseños que permitan la construcción a mediano plazo de la Unidad Funcional "La ciudad de los niños" con parques, juegos y atracciones que permitan el aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo de habilidades básicas motrices por medio de la recreación	10%	10%
Realizar los estudios y diseños de la Casa de la Justicia en el municipio de Sopó que garantice a mediano plazo su construcción, dotación y funcionamiento	10%	10%
Realizar el mantenimiento y/o adecuación de la infraestructura comunal del municipio	1	1
Realizar los estudios y diseños de la Casa de la Mujer en el municipio de Sopó que garantice a mediano plazo su construcción, dotación y funcionamiento	10%	10%

Realizar los estudios y diseños del proyecto Sacúdete al parque en el Municipio de Sopó, que garantice a mediano plazo su construcción, dotación y funcionamiento	25%	25%
Realizar el mantenimiento y/o dotación y/o adecuación de la concha acústica durante el cuatrienio	15%	15%
Hacer que el 100% de la infraestructura nueva cumpla con la normatividad de accesibilidad para PcD	100%	100%
Ejecutar un proceso de elaboración de Estudios y Diseños de la UAI en el municipio de Sopó que garantice a mediano plazo su construcción	NP	NP
Desarrollar un proyecto comunitario que garantice la ampliación de la cobertura de educación para primera infancia	0,25	0,25
Realizar los estudios y diseños de un parque infantil especializado por rangos de edad que garantice a mediano plazo su construcción, dotación y funcionamiento	10%	10%



Construir 600 Mts2 de alameda sobre la carrera 4 del municipio de Sopó	NP	NP
Construir 1000 metros lineales de andenes y rampas de acceso a lugares públicos buscando una consolidación urbanística e infraestructura inclusiva.	NP	NP
Desarrollar 4 proyectos de espacio público efectivo	NP	NP
Mantener y/o mejorar integralmente 20.000 mts2 de espacio público existente	20.000	23.893
Realizar mantenimiento al 100% de infraestructuras deportivas, educativas, de salud, incluyentes, medioambientales, turísticas, de emprendimiento, agropecuarias, administrativas, culturales y de espacio público	20%	20%
Diseñar, formular e implementar la primera fase de un megaproyecto de impacto regional cultural, de innovación económica y tecnológica que fortalezca la productividad, competitividad y comercialización de productos del sector agropecuario	NP	NP
Mantener y adecuar mínimo 30 km de vías rurales del municipio que permitan mejorar la conectividad entre los diferentes sectores	2	1,86
Construir una Unidad Funcional de Infraestructura para la movilidad de medios de transporte no motorizados (ciclo ruta) garantizar su correcto funcionamiento	10%	10%
Construir 1 km de vías urbanas y rurales del municipio	NP	NP
Adecuar y/o mejorar 3 kilómetros vías urbanas y rurales del municipio	3	4,03

Ejecutar los estudios y diseños de las unidades funcionales viales en el municipio de Sopó que garanticen a mediano plazo su construcción	0,1	0,1
Desarrollar un programa de mejoramiento de espacios públicos y entornos comunitarios, involucrando a las JAC y todas las dependencias de la Administración Municipal	0,05	0,05
Instalar en por lo menos un escenario deportivo iluminación con tecnología LED de tipo profesional	NP	NP
Realizar en por lo menos 3 veredas (Gratamira, Meusa y Chuscal Manas Altas y Manas Bajas) y un sector de la Zona Urbana la ampliación de la cobertura de gas natural	0,25	0,25

### **AÑO 2022.**

<b>Meta de producto</b>	<b>Presupuesto programado</b>	<b>Presupuesto ejecutado</b>
Ejecutar el 100% de la nueva infraestructura del colegio Pablo VI garantizando una adecuada operación en el servicio educativo	\$4.737.683.249	\$4.737.683.249
Ejecutar los estudios y diseños de las unidades funcionales viales en el municipio de Sopó que garanticen a mediano plazo su construcción	\$676.059	\$676.059
Garantizar el funcionamiento de un punto de atención de la Policía	\$37.800.000	\$37.800.000

Judicial y de Inteligencia, y de la Fiscalía Local en el Municipio		
Mantener y adecuar mínimo 30 km de vías rurales del municipio que permitan mejorar la conectividad entre los diferentes sectores	\$3.691.811.428	\$3.691.811.428
Mantener y/o mejorar integralmente 20.000 mts2 de espacio público existente	\$279.779.954	\$279.779.954
Realizar mantenimiento al 100% de infraestructuras deportivas, educativas, de salud, incluyentes, medioambientales, turísticas, de emprendimiento, agropecuarias, administrativas, culturales y de espacio público	\$682.003.840	\$682.003.840
Adecuar y/o mejorar 3 kilómetros vías urbanas y rurales del municipio	\$2.052.623.843	\$2.052.623.843
Construir 600 Mts2 de alameda sobre la carrera 4 del municipio de Sopó	\$14.236.711	\$14.236.711
Construir 1 km de vías urbanas y rurales del municipio	\$31.706.192	\$31.706.192
Desarrollar 4 proyectos de espacio público efectivo	\$10.000.000	\$10.000.000
Hacer que el 100% de la infraestructura nueva cumpla con la normatividad de accesibilidad para PcD	\$34.980.000	\$34.980.000
Implementar un proceso de mantenimiento, mejoramiento y/o	\$33.812.459	\$33.812.459

construcción de la planta física de la administración municipal		
---	--	--

## AÑO 2023

Meta de producto	Presupuesto Programado (Pesos)	Presupuesto Ejecutado (Pesos)
Ejecutar el 100% de la nueva infraestructura del colegio Pablo VI garantizando una adecuada operación en el servicio educativo	\$4.256.162.220	\$4.256.162.220
Hacer que el 100% de la infraestructura nueva cumpla con la normatividad de accesibilidad para PcD	\$11.872.021	\$11.872.021
Construir 600 Mts2 de alameda sobre la carrera 4 del municipio de Sopó	\$977.809.803	\$977.809.803
Construir 1000 metros lineales de andenes y rampas de acceso a lugares públicos buscando una consolidación urbanística e infraestructura inclusiva.	\$435.478.227	\$435.478.227
Mantener y/o mejorar integralmente 20.000 mts2 de espacio público existente.	\$ 637.777.673,05	\$ 637.777.673,05
Realizar mantenimiento al 100% de infraestructuras deportivas, educativas, de salud, incluyentes, medioambientales, turísticas, de emprendimiento, agropecuarias, administrativas, culturales y de espacio público.	\$379.147.470	\$379.147.470
Mantener y adecuar mínimo 30 km de vías rurales del municipio que permitan mejorar la conectividad entre los diferentes sectores.	\$3.723.135.767	\$3.723.135.767
Construir una Unidad Funcional de Infraestructura para la movilidad de medios de transporte no motorizados (ciclo ruta) garantizar su correcto funcionamiento.	\$8.027.329.727	\$8.027.329.727
Construir 1 km de vías urbanas y rurales del municipio.	\$382.709.043	\$382.709.043
Adecuar y/o mejorar 3 kilómetros vías urbanas y rurales del municipio.	\$2.861.898.100	\$2.861.898.100
Ejecutar los estudios y diseños de las unidades funcionales viales en el municipio de Sopó que garanticen a mediano plazo su construcción.	\$14.821.400	\$14.821.400
Desarrollar un programa de mejoramiento de espacios públicos y entornos comunitarios, involucrando a las JAC y todas las dependencias de la Administración Municipal	N/A	N/A
Instalar en por lo menos un escenario deportivo iluminación con tecnología LED de tipo profesional.	N/A	N/A

## 5. PLANTA DE PERSONAL

Número del proceso	Contratista	Objeto	Valor
DI-2023-0112	Juan Sebastián Garzón Guerrero	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO	\$ 27.500.000,00

		TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA.	
DI-2023-0137	WILLIAM ALBERTO GALVIZ BUESAQUILLO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. D-CV-2022-0010 PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA.	\$13.200.000
DI-2023-0308	Johana Morantes Rojas	<u>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u> PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO AL SEGUIMIENTO EN LOS AVANCES DE LAS METAS DE INFRAESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	\$ 46,710,000.00
DI-2023-0305	Karen Lorena Báez Torres	<u>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u> PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA INTERVENCIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.	\$22,096,800.00
DI-2023-0324	OSCAR ALFONSO GOMEZ RODRIGUEZ	<u>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u> PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRACTUALES A CARGO DE ESTA SECREARATIRA	\$25.987.500.00

Nombre del funcionario	Cargo
Ligia Patricia Medrano Moreno	Auxiliar Administrativo



Yomaira Asprilla Sánchez	Profesional Universitario
Jorge Enrique Rodríguez Ceballos	Profesional Universitario
Jorge Armando Neuta Cárdenas	Conductor
Juan Carlos Pantano Sanabria	Operario
José Martín Prieto García	Conductor
Germán Sandoval Flautero	Operario
Jairo Enrique Sarmiento Torres	Operario

## 5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS.

**Año 2020.**

INFORME FINAL DE PROYECTOS EXTERNOS 2020					
COD BPIM	ID MGA WEB	NOMBRE DE PROYECTO	VALOR PROYECTO	PRESENTADO A	ESTADO
2020	621 - 2018	ADICIÓN CONVENIO NO. ICCU - 621 - 2018 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BLOQUES B, C Y RESTAURANTE DE PREEESCOLAR DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA PARA LA IED PABLO VI DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA".	\$ 1.499.957.786,00	ICCU	APROBADO
2020-259981	259981	CONSTRUCCIÓN DE PATINODRONO FASE I EN EL CENTRO RECREODEPORTIVO LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE SOPÓ- CUNDINAMARCA.	\$ 2.042.000.000,00	MIN DEPORTE	VIABILIZADO
2020-261638	261638	CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK	\$ 1.069.240.897,00	INDEPORTES	VIABILIZADO
2020-263731	263731	ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 3 DEL MUNICIPIO DE SOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$ 1.001.313.438,00	MINISTERIO DEL INTERIOR	EN VERIFICACIÓN

2020-270919	270919	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA DE LA VEREDA MEUSA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	\$ 730.250.287,00	INDEPORTES	APROBADO
2020-294666	294666	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MERCENARIO A LA VEREDA PIEDRA HERRADA SECTOR APOSENTOS DE YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA"	\$ 173.819.289,00	ICCU	EN VERIFICACIÓN
2020-335640	335640	MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA IED PABLO VI SEDE ESCUELA RURAL CENTRO ALTO SECTOR COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$ 667.176.081,00	EDUCACION GOBERNACIÓN	VIABILIZADO
		MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CENTRO ALTO SECTOR RIVAS DEL MUNICIPIO DE SOPO			FORMULACIÓN
		MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS CLL 7 K3 Y 2A Y K3 ENTRE CALLE 6 Y 7			
		CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE ATLETISMO EN EL COMPLEJO RECREO DEPORTIVO LA TRINIDAD		MINDEPORTE	
		CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA MEUSA SAN GABRIEL EN UNA LONGITUD DE 2 KM	\$ 1.720.000.000,00	INVIAS	PRESENTADO
		"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MERCENARIO A LA VEREDA PIEDRA HERRADA SECTOR APOSENTOS DE YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA"	\$173.819.289,00	ICCU	EN AJUSTES
		INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL	\$ 151.754.978,00	SGR	FORMULACIÓN

		MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA			
		CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL Y PLANETARIO	\$ 6.000.000.000,00	CTEI	FORMULACIÓN
		MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO ALTO AL PARQUE ECOLOGICO PIONONO SECTOR COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA		ICCU	VISITA TÉCNICA PARA FORMULACION
		MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA VIOLETA SECTOR ZAMORA A LA VEREDA PIEDRA HERRADA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA		ICCU	VISITA TÉCNICA PARA FORMULACION
		MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS CLL 7 K3 Y 2A Y K3 ENTRE CALLE 6 Y 7		ICCU	TIENE ESTUDIOS Y DISEÑOS, PERO NO TIENE REDES DE SERVICIOS ACTUALIZADAS
		CONSTRUCCIÓN / ADECUACIÓN DE JARDÍN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA			EN PROCESO PARA CONTRATAR ESTUDIOS Y DISEÑOS
		CONSTRUCCIÓN PARQUE PARA LOS NIÑOS (PREDIO LA TRINIDAD)	\$ 2.000.000.000,00	INDEPORTES	
		MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE BRICEÑO		INDEPORTES	
		CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA EL ESCENARIO DEPORTIVO DE CENTRO ALTO		INDEPORTES	
		CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA EL ESCENARIO DEPORTIVO DE GRATAMIRA		INDEPORTES	
		CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA EL ESCENARIO DEPORTIVO DE MERCENARIO		INDEPORTES	
		CONSTRUCCIÓN PARQUE PARA MASCOTAS		SEC MEDIO AMBIENTE	

	CONSTRUIR 600M2 DE ALAMEDA EN LA CARRERA 4 DEL ÁREA URBANA	\$ 4.000.000.000,00	ICCU	
	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA LONGITUDINAL LA DIANA - BRICEÑO	\$23.000.000.000,00	ICCU	
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN AGUSTÍN A TOCANCIPÁ		INVIAS	
	CAMPO DEPORTIVO PUEBLO VIEJO (SALON COMUNAL)		INDEPORTES	
	CAMPO DEPORTIVO SECTOR NIÑO		INDEPORTES	
	VIA PUEBLO VIEJO ANZOLA		ICCU	
	COMPLEJO ACUATICO	\$ 7.000.000.000,00	ICCU	FORMULACIÓN
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>		<b>\$51.229.332.045,00</b>		

**Año 2021.**

<b>TOTAL, PROYECTOS 2021</b>			
<b>CÓDIGO DEL PROYECTO</b>	<b>VALOR DEL PROYECTO</b>	<b>PRESENTADO A</b>	<b>ESTADO</b>
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANISMO EN LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PABLO VI DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA	\$ 4.675.000.000,00	ICCU	SUSCRITO
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO ALTO AL PARQUE ECOLÓGICO PIONONO SECTOR COMUNEROS DEL	\$50.000.000,00	BATALLÓN BARAYA - MIN DE JUSTICIA	SUSCRITO

MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA			
ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE - TIPO 2, OPCIÓN 3 DEL MUNICIPIO DE SOPÓ DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	\$ 1.371.630.000,00	MIN DEL INTERIOR	VIABILIZADO
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR MEDIO DE ESTABILIZACIÓN QUÍMICA DE LA VÍA VEREDAL MEUSA - LA VIOLETA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	\$ 2.600.000.000,00	DPS	APROBADO
"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MERCENARIO A LA VEREDA PIEDRA HERRADA SECTOR APOSENTOS DE YERBABUENA DEL MUNICIPIO	\$ 206.612.279,00	INVIAS	VIABILIZADO



MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E.D PABLO VI SEDE ESCUELA RURAL CENTRO ALTO SECTOR COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	\$ 970.767.816,00	ICCU	VIABILIZADO
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA"	\$12.594.035.231,00	ICCU	EN REVISIÓN
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA"	\$ 6.445.780.003,00	MIN DEPORTE	VIABILIZADO
CONSTRUCCIÓN DE WOULD SKATE PARK FASE II	\$1.130.195.208,00	ICCU - MIN DEPORTE	EN REVISIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA"	\$ 9.673.315.739,00	DPS	EN REVISIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA Y PLANETARIO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA"	\$ 16.305.675.022,00	COCREA	EN REVISIÓN
CONSTRUCCIÓN PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA"	\$ 5.200.000.000,00	ICCU	EN FORMULACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA"	\$ 7.500.000.000,00	MINISTERIO DE JUSTICIA	EN REVISÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA"	\$ 1.050.000.000,00	ASODAMAS	SUSCRITO
PLACA PARA CANCHA MÚLTIPLE, UNA GRADERÍA Y CUBIERTA PARA EL POLIDEPORTIVO DE BRICEÑO	\$ 1.615.734.122,00	ICCU	SUSCRITO
PLACA PARA CANCHA MÚLTIPLE, UNA GRADERÍA Y CUBIERTA PARA EL POLIDEPORTIVO DE CAROLINA ALTA	\$1.445.705.786,00	MIN. DEL DEPORTE	EN REVISÓN
CONSTRUCCIÓN PARQUE PARA MASCOTAS	\$ 345.521.784,00	ICCU	VIABILIZADO
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA COMUNEROS A PIONONO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA. IDACO A TRAVÉS DE LA JAC	\$ 40.500.000,00	IDACO-FONDECUN	SUSCRITO

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PIEDRA HERRADA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA. IDACO A TRAVÉS DE LA JAC	\$ 40.500.000,00	IDACO-FONDECUN	SUSCRITO
CONSTRUCCIÓN PARQUE ROSALES 1 (PARQUE PARA MASCOTAS)	\$ 345.000.000,00	ICCU	EN FORMULACIÓN
CONSTRUCCIÓN PARQUE JARDÍN DEL NORTE	\$ 75.000.000,00	ICCU	EN FORMULACIÓN
CONSTRUCCIÓN PARQUE EL CHUSCAL	\$ 500.000.000,00	ICCU	EN FORMULACIÓN
CONSTRUCCIÓN PARQUE ROSALES 2	\$ 235.000.000,00	ICCU	EN FORMULACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN 8 DIFERENTES SECTORES Y TRAMOS DEL MUNICIPIO.	\$ 480.000.000,00	MIN. DEL INTERIOR	EN REVISIÓN
CICLO RUTA PARA MUNICIPIOS	\$ 6.250.000.000	ICCU	EN FORMULACIÓN
VÍA LONGITUDINAL	\$ 40.000.000.000	ICCU	EN FORMULACIÓN

ADICIÓN CONVENIO NO. ICCU - 621 - 2018 CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BLOQUES B, C Y RESTAURANTE DE PREESCOLAR DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA PARA LA IED PABLO VI DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA".	\$ 1.500.000.000,00	ICCU	SUSCRITO
CONSTRUCCIÓN DEL PATINODROMO FASE I EN EL CENTRO RECREO DEPORTIVO LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE SOPÓ-CUNDINAMARCA.	\$ 2.041.765.164,00	MINISTERIO DEL DEPORTE	SUSCRITO
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK	\$ 1.069.240.897,00	ICCU	SUSCRITO
AUNAR ESFUERZOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DE LA	\$ 730.250.287,00	ICCU	SUSCRITO

ESCUELA DE LA VEREDA MEUSA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA			
<b>TOTAL, INVERSIÓN</b>	<b>\$126.787.229.338,00</b>		

**Año 2022.**

<b>TOTAL, PROYECTOS 2022</b>			
<b>CÓDIGO DEL PROYECTO</b>	<b>VALOR DEL PROYECTO</b>	<b>PRESENTADO A</b>	<b>ESTADO ejecución, ejecutado) (En</b>
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA.	\$ 5.875.569.317,88	MINISTERIO DEL DEPORTE	REVISADO
ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 3 DEL MUNICIPIO DE SOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	\$ 1.371.000.000,00	MINISTERIO DEL INTERIOR	VIABILIZADO
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA.	\$ 9.673.315.739,00	DPS	RADICADO
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL BIBLIO PLANETARIO EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA.	\$ 13.332.856.983,00	MINISTERIO DE CULTURA - ART - DNP	VIABILIZADO



CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA.		MINISTERIO DE JUSTICIA	VIABILIZADO
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR MEDIO DE ESTABILIZACIÓN QUÍMICA DE LA VÍA VEREDAL MEUSA - LA VIOLETA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ.	\$ 6.055.363.018,00	EJÉRCITO NACIONAL	VIABILIZADO
CONSTRUCCIÓN DE LA ALAMEDA BRICEÑO- SOPÓ.	\$ 5.500.000.000,00	MINISTERIO DE TRANSPORTE	FORMULACIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO ACUÁTICO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA.	\$ 17.000.000.000,00	MINISTERIO DEL DEPORTE	FORMULACIÓN
MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA IED PABLO VI SEDE ESCUELA RURAL CENTRO ALTO SECTOR COMUNEROS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	\$ 1.007.681.052,00	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO - ICCU	VIABILIZADO
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CIUDAD DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA.	\$ 5.650.093.411,00	ICCU	VIABILIZADO
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MERCENARIO A LA VEREDA PIEDRA HERRADA SECTOR APOSENTOS DE YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ.	\$ 216.159.258,00	ICCU	VIABILIZADO
CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II SKATE PARK EN EL COMPLEJO RECREO DEPORTIVO LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA.	\$ 837.784.306,00	ICCU	VIABILIZADO
PLACA PARA CANCHA MÚLTIPLE, UNA GRADERÍA Y CUBIERTA PARA EL	\$ 1.445.705.787	INDEPORTES	AJUSTES

29

POLIDEPORTIVO DE CAROLINA ALTA.			
PLACA PARA CANCHA MÚLTIPLE, UNA GRADERÍA Y CUBIERTA PARA EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SAN AGUSTÍN.	\$ 2.179.823.013	INDEPORTES	AJUSTES
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ROSALES 1 EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA.	\$ 364.271.266,00 \$ 320.000.000,00	IPYBAC ICCU	EJECUTADO VIABILIZADO
ADICIÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE FASE II EN LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PABLO VI DEL MUNICIPIO DE SOPÓ.	\$ 2.152.000.000,00	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO - ICCU	VIABILIZADO
CONSTRUCCIÓN DE CICLORRUTA Y SENDERO PEATONAL BRICEÑO SOPÓ EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA.	\$ 6.800.000.000,00	ICCU	SE PRESENTÓ AL ICCU PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS, SIN EMBARGO, SE EJECUTARÁ CON RECURSOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTITO
MEJORAMIENTO DE LA VÍA REGIONAL LONGITUDINAL SOPÓ – TOCANCIPÁ.	\$ 8.000.000.000,00	ICCU	FORMULACIÓN
<b>TOTAL, INVERSIÓN</b>	<b>\$ 88.767.912.728,80</b>		

#### Año 2023.

TOTAL, PROYECTOS 2023				
Nombre del proyecto	CÓDIGO DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	PRESENTADO A	ESTADO (En ejecución, ejecutado)
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA"		\$ 6.123.950.221,00	MINDEPORTE	EN EJECUCIÓN

**6. RELACIÓN DE SENTENCIAS Y DEMANDAS, JUICIOS Y DEUDAS JURÍDICAS (aplica exclusivamente para la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación)**

N/A

**7. CONTRATACIÓN (aplica exclusivamente para la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación)**

Modalidad	Objetos contractuales	N° de contratos en proceso	N° de contratos ejecutados	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**8. PLANES DE MEJORAMIENTO A CARGO DE LA ENTIDAD (aplica exclusivamente para la Oficina Asesora de Planeación Estratégica)**

N/A

**9. TABLAS DE RETENCIÓN, INVENTARIOS Y TRANSFERENCIA DOCUMENTAL (aplica exclusivamente para la Secretaría de Desarrollo Institucional – Archivo Municipal)**

N/A

**10.COMITÉS Y/O JUNTAS QUE LIDERA SU DEPENDENCIA**

Acto administrativo que conforma la junta y/o comité	Nombre del comité	Integrantes
N/A	N/A	N/A

**11.INFORMES QUE SE RINDEN DESDE SU DEPENDENCIA**

Tipo de informe	Periodicidad	URL	¿Qué se reporta?
Indicador de de Producción Obras Civiles	Trimestral	<a href="https://formularios.dane.gov.co/ipoc/">https://formularios.dane.gov.co/ipoc/</a>	Estado actual del proyecto Fecha de terminación Valor presupuesto total Valor ejecutado Cantidad total de obra a ejecutar Valor presupuesto total a ejecutar de la Sub Obra

12. EJECUCIONES PRESUPUESTALES (aplica exclusivamente para la Secretaría de Hacienda)

N/A

13. BIENES MUEBLES E INMUEBLES (aplica exclusivamente para la Secretaría de Desarrollo Institucional - Almacén)

N/A

14. OBRAS PÚBLICAS (aplica sólo para obras públicas)

AÑO 2020

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA AÑO 2020							
NO. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	ADICIONES	VALOR EJECUTADO	MODALIDAD	ESTADO	TERMINACION
SA-2020-0362	CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MERCENARIO A LA VEREDA SAN GABRIEL SECTOR EL MANZANO, MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	\$225.268.789,00	NO	\$225.266.037,00	Selección Abreviada a Menor Cuantía	TERMINADO	3/11/2020
SA-2020-0390	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO ALTO SECTOR	\$215.645.391,00	\$29.498.718,00	\$245.144.109,00	Selección Abreviada a Menor Cuantía	TERMINADO	22/09/2020

	COMUNEROS AL SECTOR SOTO Y SECTOR SANTUARIO, MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMA RCA						
SA- 2020- 0555	MANTENIMIE NTO, MEJORAMIE NTO Y REHABILITAC IÓN DEL CENTRO DE INTEGRACI ÓN CULTURAL C.I.C. SOPÓ, CUNDINAMA RCA, EN CUMPLIMIE NTO DEL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023	\$245.755. 688,00	-	-	Selección Abreviad a Menor Cuantía	CONTRA TADO	-
SA- 2020- 0556	MANTENIMIE NTO, ADECUACION , MEJORAMIE NTO Y REHABILITAC IÓN DE LAS INFRAESTRU CTURAS EDUCATIVAS, CUNDINAMA RCA, EN CUMPLIMIE NTO DEL PLAN DE DESARROLLO "SOPO ES	\$244.333. 552,00	NO	-	Selección Abreviad a Menor Cuantía	CONTRA TADO	-



	NUESTRO TIEMPO 2020-2023"						
SA- 2020- 0562	MANTENIMIE NTO DE LAS AREAS ESPECÍFICAS DEL LAGO UBICADO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO LA TRINIDAD, INCLUYENDO CERRAMIENT O Y LA INTERVENC IÓN EN EL SALÓN COMUNAL DE SAN AGUSTIN PARA LA TERMINACIÓ N DE OBRAS INCONCLUSA S EN EL PRIMER PISO Y CULMINACIÓ N DE LA AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO PISO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ.	\$243.965. 527	-	-	Selección Abreviad a Menor Cuantía	CONTRA TADO	-
L-2019- 0383	CONSTRUCCI ON DE LA NUEVA SEDE DEL COLEGIO	\$15.432.1 83.191	1.499.999 .862	16:932.18 3.053	Licitación Pública	SUSPEN DIDO	-

	PABLO VI, FASE 1, EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ.						
--	---	--	--	--	--	--	--

## AÑO 2021

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA AÑO 2021								
No.	NO. DE CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	ADICIONES	VALOR EJECUTADO	MODALIDAD	ESTADO	TERMINACIÓN
1	L-2019-0383	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL COLEGIO PABLO VI, FASE I, EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ	\$ 15.432.183.191,00	\$ 1.499.999.862,43 \$ 3.215.977.342	\$ 18.085.007.548,83	LICITACIÓN	PENDIENTE POR LIQUIDAR	27/12/2021
2	SA-2020-0556	MANTENIMIENTO, ADECUACION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023"	\$ 244.333.552,00	\$ 0,00	\$ 244.333.552,00	MENOR CUANTÍA	LIQUIDADO	29/07/2021
3	SA-2020-0555	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL C.I.C. SOPÓ, CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023"	\$ 245.755.688,00	\$ 0,00	\$ 245.755.359,00	MENOR CUANTÍA	LIQUIDADO	18/06/2021
4	SA-2020-0562	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ESPECÍFICAS DEL LAGO UBICADO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO LA TRINIDAD, INCLUYENDO CERRAMIENTO Y LA INTERVENCIÓN EN EL SALÓN COMUNAL DE SAN AGUSTIN PARA LA TERMINACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS EN EL PRIMER PISO Y CULMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO PISO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	\$ 243.965.527,00	\$ 0,00	\$ 243.965.527,00	MENOR CUANTÍA	LIQUIDADO	13/07/2021
5	SA-2021-0407	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL C.I.C. EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA FASE II, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023"	\$ 253.568.648,00	\$ 0,00	\$ 253.568.631,00	MENOR CUANTÍA	LIQUIDADO	16/09/2021
6		MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO CASA DE BOLÍVAR, RED DE BIBLIOTECAS, CONCHA ACÚSTICA, CAMPO DE VOLEIBOL ARENA Y CENTRO DÍA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2023"	\$ 235.760.322,00	\$ 0,00	\$ 0,00	MENOR CUANTÍA	LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	
7	L-2021-0422	CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN EL COMPLEJO RECREO DEPORTIVO LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023", EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 407 de 2020 SUSCRITOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y EL ICCU"	\$ 994.641.248,00	\$ 0,00	\$ 251.518.940,00	LICITACIÓN	SUSPENDIDO	20/03/2022

8	L-2021-0427	CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO FASE 1 EN EL COMPLEJO RECREO DEPORTIVO LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE SOPO CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPO ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023", EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No COID-1237-2020 SUSCRITOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y MINDEPORTE	\$ 1.863.910.158,00	\$ 0,00	\$ 433.718.970,60	LICITACIÓN	EN EJECUCIÓN	6/02/2022
9	L-2021-0423	CONSTRUCCIÓN DE PLACA PARA CANCHA MULTIPLE UNA GRADERIA Y CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO VEREDA MEUSA EN EL MUNICIPIO DE SOPO CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPO ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023", EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 241 de 2020 SUSCRITOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y EL ICCU"	\$ 672.371.263	\$ 336.116.600,00	\$ 441.080.862,00	LICITACIÓN	EN EJECUCIÓN	15/02/2022
10	L-2021-0561	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL COLEGIO PABLO VI, FASE II, EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 246 de 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y EL ICCU" EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPO ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023"	\$ 6.977.915.705,00	\$ 0,00	\$ -	LICITACIÓN	EN EJECUCIÓN	19/10/2022
11		CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO BRICEÑO SECTOR CERRO FUERTE EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 575 de 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y EL ICCU" EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPO ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023"	\$ 1.499.146.984,00	\$ 0,00	\$ -	LICITACIÓN	LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	
12	D-CS-2021-0001	CONVENIO SOLIDARIO PARA COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE HATO GRANDE PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL.	\$ 24.530.750,00	\$ 0,00	\$ 24.530.750,00	CONVENIO	TERMINADO	15/05/2021
13	D-CS-2021-0002	CONVENIO SOLIDARIO PARA COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PUEBLO VIEJO PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL.	\$ 14.444.700,00	\$ 0,00	\$ 14.444.700,00	CONVENIO	TERMINADO	15/06/2021
14	D-CS-2021-0003	CONVENIO SOLIDARIO PARA COMPLEMENTAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BARRIO LA CAROLINA SECTOR SAN AGUSTIN PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL.	\$ 15.558.422,00	\$ 0,00	\$ 15.558.422,00	CONVENIO	TERMINADO	12/11/2021

**CONTRATOS DE OBRA PUBLICA AÑO 2022**

<b>N o</b>	<b>NO. DE CON TRATO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VALOR CONTRA TO</b>	<b>ADICIO NES</b>	<b>VALOR EJECUTA DO</b>	<b>MODA LIDAD</b>	<b>ESTAD O</b>	<b>TERMIN ACIÓN</b>
1	L- 2021- 0422	CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK EN EL COMPLEJO RECREO DEPORTIVO LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023", EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 407 de 2020 SUSCRITOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y EL ICCU"	\$ 994.641.2 48,00	\$ 486.592. 424,00	\$ 1.481.233 .672,00	LICITA CIÓN	LIQUID ADO	20/11/20 22
2	L- 2021- 0427	CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO FASE 1 EN EL COMPLEJO RECREO DEPORTIVO LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO	\$ 1.863.910 .158,00	\$ 0,00	\$ 1.863.891 .228,89	LICITA CIÓN	LIQUID ADO	06/06/20 22

		"SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023", EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINI STRATIVO No COID-1237- 2020 SUSCRITOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y MINDEPORTE						
3	L- 2021- 0423	CONSTRUCCI ÓN DE PLACA PARA CANCHA MÚLTIPLE UNA GRADERÍA Y CUBIERTA PARA POLIDEPORTI VO VEREDA MEUSA EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMAR CA, EN CUMPLIMIEN TO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023", EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINI STRATIVO No 241 de 2020 SUSCRITOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y EL ICCU"	\$ 672.371.2 63	\$ 336.116. 600,00	\$ 1.008.487 .863,00	LICITA CIÓN	LIQUID ADO	15/02/20 22



4	L-2021-0561	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL COLEGIO PABLO VI, FASE II, EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 246 de 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y EL ICCU" EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023	\$ 6.977.915.705,00	\$ 0,00	\$ 5.527.165.487,88	LICITACIÓN	SUSPENDIDO	16/01/2023
5	L-2021-0569	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO BRICEÑO SECTOR CERRO FUERTE EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 575 de 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y EL ICCU" EN CUMPLIMIENTO AL PLAN	\$ 1.499.146.984,00	\$ 0,00	\$ 1.081.830.343,32	LICITACIÓN	SUSPENDIDO	17/01/2023

		DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023"						
6	SA- 2021- 0570	MANTENIMIE NTO, MEJORAMIE NTO Y REHABILITAC IÓN DE LA RED DE BIBLIOTECAS , CONCHA ACÚSTICA, CAMPO DE VOLEIBOL ARENA, INSTITUCION ES EDUCATIVAS Y CENTRO DE INTEGRACIÓ N CULTURAL C.I.C DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMAR CA, EN CUMPLIMIE NTO DEL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2023"	\$ 235.760.3 22,00	\$ 43.971,4 94,00	\$279.730. 582,00	SELECC IÓN ABREVI ADA MENOR CUANTÍ A	LIQUID ADO	04/07/20 22
7	SA- 2022- 0469	CONSTRUCCI ÓN DE DOS SALONES COMUNALES EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMAR CA, EN CUMPLIMIE NTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO	\$ 278.777.0 50,00	\$ 0,00	\$ 223.007.2 91,00	SELECC IÓN ABREVI ADA MENOR CUANTÍ A	SUSPEN DIDO	11/02/20 23

		TIEMPO 2020-2023.						
8	D-CV- 2022- 0010	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRA TIVOS Y FINANCIEROS PARA QUE SE EFECTÚE EL MANTENIMIE NTO, MEJORAMIEN TO Y/O CONSTRUCCI ÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOPÓ EN EL DEPARTAMEN TO DE CUNDINAMAR CA.	\$ 6.055.363 .018,40	\$ 0,00	\$ 5.686.710 .754,66	CONTR ATACIÓ N DIRECT A	EN EJECUC IÓN	30/08/20 23
9	D-CS- 2022- 0003	CONVENIO SOLIDARIO PARA COMPLEMENT AR ESFUERZOS INSTITUCION ALES, COMUNITARI OS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y LA JUNTA DE	\$ 15.997.19 5,00	\$ 0,00	\$ 15.997.19 5,00	CONTR ATACIÓ N DIRECT A	LIQUID ADO	14/12/20 22

		ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CHUSCAL PARA EL MANTENIMIE NTO Y/O MEJORAMIE NTO DEL SALON COMUNAL.						
1 0	D-CS- 2022- 0004	CONVENIO SOLIDARIO PARA COMPLEMENT AR ESFUERZOS INSTITUCION ALES, COMUNITARI OS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN GABRIEL PARA EL MANTENIMIE NTO Y/O MEJORAMIE NTO DEL SALON COMUNAL.	\$ 14.504.15 0,00	\$ 0,00	\$ 14.504.15 0,00	CONTR ATACIO N DIRECT A	LIQUID ADO	14/12/20 22
1 1	D-CS- 2022- 0006	CONVENIO SOLIDARIO PARA COMPLEMENT AR ESFUERZOS INSTITUCION ALES, COMUNITARI OS, ECONÓMICOS	\$ 12.031.91 4,00	\$ 0,00	\$ 12.031.91 4,00	CONTR ATACIO N DIRECT A	LIQUID ADO	14/12/20 22

		Y SOCIALES PARA EJECUTAR ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE MEUSA PARA EL MANTENIMIE NTO Y/O MEJORAMIE NTO DEL SALON COMUNAL.						
1 2	D-CS- 2022- 0005	CONVENIO SOLIDARIO PARA COMPLEMENT AR ESFUERZOS INSTITUCION ALES, COMUNITARI OS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BELLAVISTA SECTOR EL HOYITO PARA EL MANTENIMIE NTO Y/O MEJORAMIE NTO DEL SALON COMUNAL.	\$ 13.065.47 4,00	\$ 0,00	\$ 13.065.47 4,00	CONTR ATACIO N DIRECT A	LIQUID ADO	14/12/20 22



1 3	D-CS- 2022- 0002	CONVENIO SOLIDARIO PARA COMPLEMENT AR ESFUERZOS INSTITUCION ALES, COMUNITARI OS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CAROLINA PARA EL MANTENIMIE NTO Y/O MEJORAMIE NTO DEL SALON COMUNAL.	\$ 17.831.00 8,00	\$ 0,00	\$ 17.831.00 7,00	CONTR ATACIO N DIRECT A	LIQUID ADO	14/12/20 22
1 4	D-CS- 2022- 0001	CONVENIO SOLIDARIO PARA COMPLEMENT AR ESFUERZOS INSTITUCION ALES, COMUNITARI OS, ECONÓMICOS Y SOCIALES PARA EJECUTAR ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACI ON LA CAROLINA PARA EL	\$ 22.726.55 9,00	\$ 0,00	\$ 22.726.55 9,00	CONTR ATACIO N DIRECT A	LIQUID ADO	14/12/20 22

		MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

## AÑO 2023.

Objeto de la obra	Nombre o razón social del contratista	Nombre o razón social del interventor	Estado		Valor ejecutado
			Ejecutado	En proceso	
"CONSTRUCCIÓN DE LA CICLO RUTA Y SENDEROS PEATONALES EN EL TRAMO BRICEÑO – SOPÓ EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023."	Consortio San Lorenzo	CONSORCIO VIAS SOPÓ		X	\$6,838,054,428.00
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ROSALES 1 EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1037 de 2022 SUSCRITOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y EL ICCU	CONSORCIO PARQUE ROSALES	GKAIROS SAS		X	\$307,731,481.00
CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN EL SECTOR DE MEUSA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020 - 2023	CONSORCIO MEUSA 2023	N/A	X		\$148,556,728.00
MEJORAMIENTO DE LA VÍA PUEBLO VIEJO – CACIQUE DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023".	GR CONSTRUCCIÓN	N/A	X		\$293,898,149.00
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA: MINICARGADOR, RETROEXCAVADORA TIPO BOBCAT E42, CILINDRO Y CAMIÓN (TIPO CAMA BAJA) CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO	EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SERCO SAS		X		\$32,389,506.00

MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ.					
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SECTOR VEREDA EL MIRADOR MUNICIPIO DE SOPÓ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023	C&C MURO DE CONTENCIÓN 0001-2023	N/A		X	\$319,979,379.00
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNAL EN EL ÁREA DE RURAL DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023".	C&C CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES SAS	N/A	X		\$211,634,955.00
CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE DOS SALONES COMUNALES EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023"	C&C SAS	N/A	X		\$ 324,050,985.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES Y URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020 - 2023	OSCAR URIBE RAMIREZ	N/A		X	\$76,096,533.00
CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN EL COMPLEJO RECREO DEPORTIVO LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE SOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO COID 916-2023 SUSCRITOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y EL MINISTERIO DE DEPORTE	CONSORCIO DEPORTIVO SOPÓ	CONSORCIO INTER ATLETISMO		X	\$6,123,513,014.00
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL MEJORAMIENTO, Y MANTENIMIENTO	MOTO MART SA	N/A		X	\$619,990,000.00

REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SOPÓ					
OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS EN EL SECTOR DE CENTRO ALTO - SAN FELIPE Y SECTOR RIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023	ECOBRAS CIVILES SAS	N/A		X	\$ 64,531,256.00
CONSTRUCCIÓN DE SKATE PARK FASE 2 EN EL COMPLEJO RECREO DEPORTIVO LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE SOPÓ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1045 de 2022 SUSCRITOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y EL ICCU	CONSORCIO SKATE PARK II	CONSORCIO SKATE PARK SOPÓ		X	\$809,704,664.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y HABITAD DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL E INTERÉS PRIORITARIO PROMOVIDOS Y DESARROLLADOS EN LOS PROGRAMAS ADELANTADOS POR EL MUNICIPIO DE SOPÓ, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023	INTERCON MVN SAS	N/A		X	\$ 374,889,224.00
CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE JARDÍN DEL NORTE Y EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SOPÓ 2023	N/A		X	\$ 296,517,571.00
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO 2020-2023	CONSORCIO ADECUACION ES EP	N/A		X	\$133,673,258.00

## 15.REGLEMENTOS Y MANUALES (cuando aplique)

Denominación de reglamento y/o manual	Descripción	Mecanismo de adopción	Acto administrativo de adopción	Fecha de adopción o vigencia
	N/A	N/A	N/A	N/A

No se adoptó ningún manual en el periodo de la presente administración sin embargo se hace la recomendación de implementar los manuales de mantenimiento que se encuentran en los archivos de ejecución de los contratos de las obras ejecutadas en el presente periodo.

## 16. CONCEPTO GENERAL

<b>MATRIZ DOFA</b>
<b>Fortalezas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de Calidad y Ambiental con que cuenta el Municipio como herramienta organizacional en todos los procesos.</li> <li>- Capital humano, operativo, técnico y profesional comprometido y conocedor de las condiciones del Municipio.</li> <li>- Avance en el cumplimiento de metas proyectadas en el Plan de desarrollo "SOPÓ ES NUESTRO TIEMPO" para la vigencia.</li> <li>- Gestión de recursos para el desarrollo de proyectos de infraestructura educativa, deportiva, vial, espacio público, ante los entes del orden Nacional y Departamental.</li> <li>- Trabajo en equipo de Gobierno en cabeza del señor alcalde para realizar gestión de recursos ante los diferentes entes.</li> <li>- Contar con cronogramas para el desarrollo de las actividades operativas.</li> </ul>
<b>Oportunidades</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortalecimiento con equipos de cómputo y software mejorando la capacidad institucional de la secretaría de Infraestructura.</li> <li>- Fortalecimiento de las herramientas y equipos menores de trabajo para el personal operativo con el fin de tener una mejor calidad en las actividades de mantenimiento</li> </ul>
<b>Debilidades</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limitación financiera en recursos propios para el cumplimiento de las metas proyectadas.</li> <li>- Personal operativo del área insuficiente, especialmente en mano de obra para realizar trabajos menores de mantenimiento de infraestructura.</li> <li>- Personal administrativo profesional y especializado.</li> <li>- Carencia de maquinaria para el mantenimiento vial y mantenimiento oportuno de la existente.</li> </ul>
<b>Amenazas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Condiciones climáticas extremas que restrinjan el desarrollo de las actividades propias de la dependencia.</li> <li>- Disminución y restricción de actividades por efectos de la pandemia Covid-19.</li> <li>- Limitación financiera en recursos propios para el cumplimiento de las metas proyectadas.</li> </ul>

## 17. RECOMENDACIONES GENERALES



- Aumentar el parque automotor para el mantenimiento vial del Municipio.
- Realizar la contratación y/o tener en cuenta de los estudios y diseños entregados para los diferentes equipamientos requeridos por el desarrollo local.
- Continuar con el fortalecimiento de la cuadrilla de la gente.
- Culminación de los megaproyectos que se dejan en ejecución de la obra.
- Garantizar la contratación de los insumos de ferretería, contrato de granular, combustible, mantenimiento de maquinaria.
- Fortalecimiento del personal administrativo especializado para el apoyo de la supervisión de los contratos y demás actividades que se ejecutan en la secretaría.

### **17.1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO REPORTADO COMO OBRA INCONCLUSA**

Se suscribió el proceso contractual L-2019-580 cuyo objeto es "Adecuación y canalización del vallado adyacente al Colegio Pablo VI del Municipio de Sopo Cundinamarca" por un valor de \$1.083.046.048 y ejecutado \$1.082.986.070 el cual se liquidó el día 31 de diciembre de 2019; este contrato fue revisado e incluido por la Contraloría de Cundinamarca en el Informe definitivo de Auditoria Gubernamental con enfoque integral, modalidad especial.

Igualmente, el contrato CM-2019-0581 Cuyo objeto es interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la adecuación y canalización del vallado adyacente al colegio pablo VI del municipio de Sopó – Cundinamarca por valor de \$76.343.200, liquidado el 31/12/2019.


Se identifican las siguientes inexactitudes:

I. Se invierten recursos públicos en predios que no están a nombre del Municipio de Sopó.

II. Se identifica que la franja en la cual se invirtieron lo recursos públicos está conformada, en parte, por la compensación "en terreno" por PLUSVALÍA autorizada mediante resolución 273 de 2019 al señor Señor Héctor Calderón y aunque se eleva a escritura ésta fue devuelta sin registrar por la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS y en parte por la escritura con la cual el urbanizador del Conjunto Cerro Fuerte entregaba las zonas de cesión resultantes de las obligaciones de la licencia de urbanismo y que igualmente fue devuelta por parte de Registro de Instrumentos públicos.

IV. Se identifica que el área recibida como plusvalía estaba sobrepuesta con el área entregada por cesión de la Urbanización Cerro Fuerte como área de cesión obligatoria. Una vez implantada la topografía con elementos de precisión se encuentra que el área realmente compensada por plusvalía corresponde a 912.68 m2 y no a 3.248 m2 como se establece en la resolución de compensación.


V. Con respecto a la escritura de entrega de la zona de cesión y de la franja ambiental que resultan del proceso de licenciamiento de la urbanización cerro Fuerte se identifica que inexactitudes de las áreas registradas en estos actos administrativos, sin que puedan ser corregidos, ampliados, revalidados por no encontrarse vigentes.

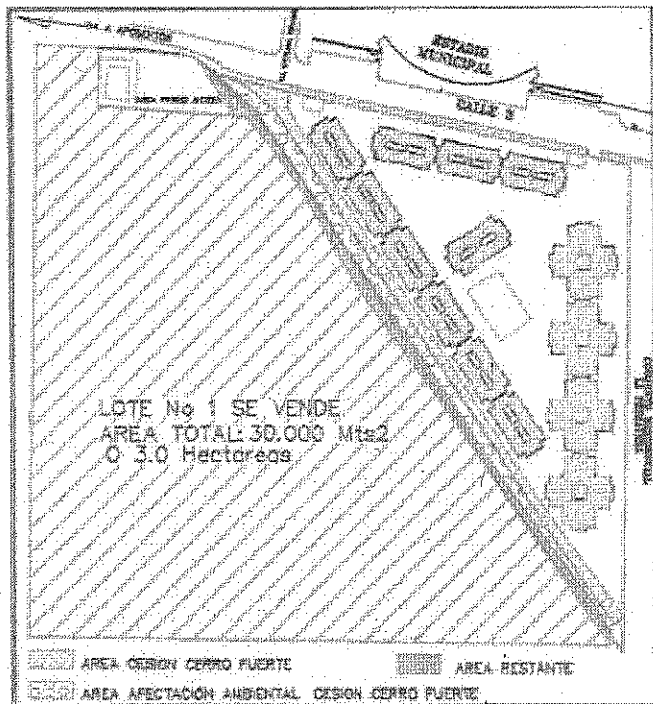

Las franjas de terreno sobre las que se construyen las obras de canalización corresponden a: la achurada en amarillo (denominada Área de cesión Cerro Fuerte), el área en verde (denominada afectación ambiental) que hace parte de la cesión de Cerro Fuerte y lo denominado área restante que pertenece al señor Héctor Calderón, sin embargo, presuntamente lo ofrecido en compensación por el señor Calderón es lo correspondiente a las suma de las dos áreas de cesión de cerro fuerte más lo denominado área restante.

VI. Finalmente sobre estas áreas, que no son de propiedad del municipio, se invirtieron los recursos del contrato L-2019-0580 para la ADECUACION Y CANALIZACION DEL VALLADO ADYACENTE AL COLEGIO PABLO SEXTO DEL MUNICIPIO DE SOPO CUNDINAMARCA disponiendo \$1.083.046.048 y de su interventoría por valor de \$ 76.346.200, quedando recibidos y liquidados en la vigencia 2019.

Esta obra colinda por el costado occidental de la construcción del Nuevo Colegio Público Pablo VI que tenía diseñada la descarga de aguas lluvias al vallado natural al ser la mejor alternativa de conexión; pero al ser canalizado con el contrato L-2019-580 se elevó el nivel de fondo que existía y esto produce modificaciones en el manejo de las aguas lluvias de la institución educativa.

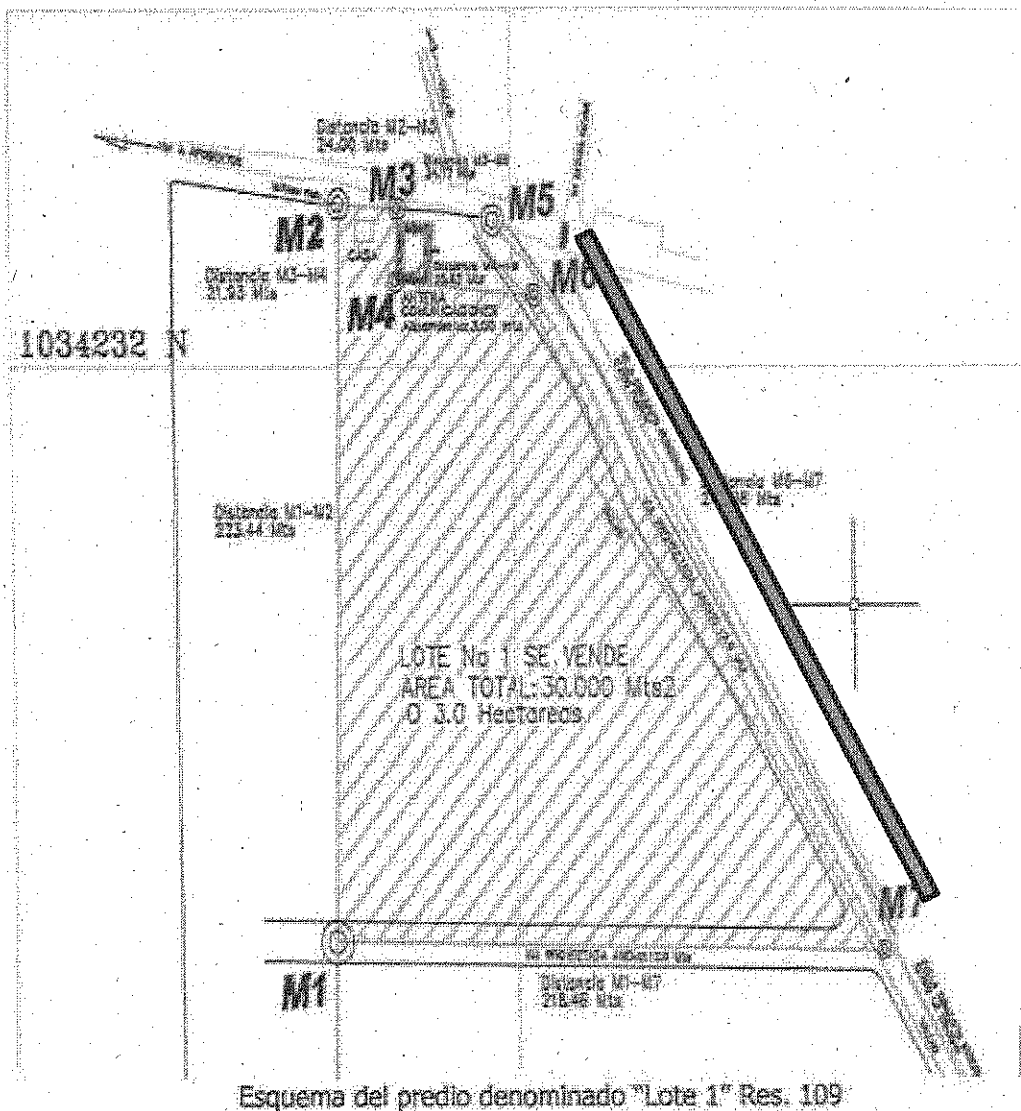

- a) El área achurada en rojo corresponde al predio donde se construyó el nuevo Colegio Pablo VI comprendido entre mojones M1, M2, M3, M4, M6, M7
- b) Zona azul corresponde a área antigua vallado y a parte del área donde se ejecutó el contrato L-2019-0580 para la ADECUACION Y CANALIZACION DEL VALLADO ADYACENTE AL COLEGIO PABLO SEXTO DEL MUNICIPIO DE SOPO CUNDINAMARCA

De otro lado la obra de canalización del vallado consistió en la instalación de tubería modificando las cotas del vallado por lo que el sistema de captación se dejó funcionando por rebose y que superaba ampliamente el nivel natural del vallado canalizado y en esta zona se generaba un represamiento del sistema natural que no fue intervenido.

El seguimiento realizado parece indicar que una gran parte de las aguas que circulan por el sistema natural de lluvias no estaban ingresando por la red de lluvias instalada, entre otras razones, por el elevado nivel de la tubería, por las obras de captación, igualmente, fueron

construidas con una cota superior y por qué en la ejecución de la obra de canalización se instaló una capa de rajón que estimula la circulación concentración de las aguas.

### **ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:**

La secretaría de Infraestructura el 26 de febrero de 2020 mediante oficio con radicado SIOP-0094-20 dirigido a Javier Eduardo Jiménez Forero de la Oficina Asesora de planeación estratégica y con asunto Información para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, informa que entre las problemáticas encontradas en la secretaría se encontraba:

- Inconsistencia de titularidad del acceso al predio donde se construye la nueva sede del colegio Pablo VI.
- Inconsistencia de la titularidad de la franja de terreno del vallado"

En enero del 2020 se identifica el estado de avance de la construcción de la vía que en la totalidad de su perfil tiene instalado el rajón y la subbase, esta última expuesta a la intemperie, se procede a solicitar al contratista e interventor implementar un mecanismo de protección de los materiales instalados, estos proponen la aplicación de un riego CRL1 en concentración del 30% diluido, su ofrecimiento incluye la recomendación de terminar totalmente la estructura de la vía "ya que los materiales granulares se deterioran **rápidamente** al estar sometidos a los efectos del clima y del tránsito" una vez analizada la proposición realizada por el contratista y que representa una protección del material a un plazo extremadamente corto, además, de que el uso de este insumo implicaría la pérdida de parte del granular instalado y se afectaría notablemente su espesor por cuanto al momento de continuar con las actividades de construcción de la vía se debe retirar el material que haya absorbido el riego.

La Secretaría de Infraestructura, el 19 de marzo de 2020 envió oficio con radicado SIOP-0140-2020 a la Secretaría de Urbanismo y desarrollo territorial, en el cual se comunica que el área realmente compensada son 912.68 m<sup>2</sup> por lo cual faltarían 2.335,92 m<sup>2</sup> por compensar por el señor Héctor José Antonio Calderón Villar. Se da traslado de la información para que se procediera a realizar las acciones pertinentes e iniciar las acciones del respectivo recaudo de lo adeudado por concepto de plusvalía.

La Secretaría de Infraestructura, el 06 de marzo de 2020 entregó informe con radicado 2020-SIOP-0099 del estado actual del contrato L-2019-0383 cuyo objeto es "Construcción de la nueva sede del colegio Pablo VI, Fase I, en el municipio de Sopó" a la Contraloría Departamental, en el cual se indicó:

"b. Es importante referir que por el costado oriental de la obra del colegio se tenía planeada la construcción de una vía que además fue incorporada en el diseño de la infraestructura educativa y por ésta vía se plantea el acceso de los estudiantes y de las rutas que los transportaran, sin embargo aunque se realizó la inversión de recursos en adelantar algunas actividades referentes a la construcción de dicha vía, ésta franja de



101

terreno no está en la actualidad a nombre del municipio y se analiza si existe una sobre posición de ésta área con una cesión del proyecto Urbanístico denominado Cerro Fuerte”

En el segundo semestre de 2020, la Secretaría de Infraestructura presentó en el Concejo Municipal de Sopó, el proyecto para la terminación Fase I y construcción Fase II del Mega Colegio Pablo VI en el municipio de Sopó, Cundinamarca. En dicho documento en el literal b. se indica:

“... las actividades correspondientes a canalización y construcción de vía por donde se tiene el acceso principal a la nueva institución educativa y que geográficamente se localiza entre la obra en ejecución y la urbanización Cerro Fuerte, éste último y el cesionario Efraín Calderón, simultáneamente, se encontraban suscribiendo escrituras a favor del municipio de Sopó a finales de 2019; ambas fueron devueltas sin la respectiva inscripción de Registro de Instrumentos públicos de Zipaquirá, detectándose por parte de la administración municipal, además, una sobre posición de las áreas.”

La contraloría de Cundinamarca en el pre informe técnico, con alcance al informe definitivo de auditoría gubernamental con enfoque integral, modalidad especial de vigencia auditada 2019; respecto al contrato de obra pública L-2019-058 del 5 de noviembre de 2019 indica en la columna correspondiente a respuesta sujeto de control:

“1) no se ha terminado el proceso de obtener la propiedad de la franja de terreno de cesiones de la Urbanización Cerro Fuerte sobre la cual se construyeron parte de las obras.  
2) se debe subsanar la omisión de la anterior administración Municipal y presentar al honorable Concejo Municipal el proyecto de acuerdo para solicitarle la autorización de adquirir por compensación de plusvalía la otra franja de terreno sobre la cual se construyeron las obras de este contrato.

3) se debe definir si la obligación de la construcción de la vía le corresponde a la Alcaldía de Sopó o lo que presuntamente analizamos desde la Secretaria de Urbanismo e Infraestructura que es a los promotores del Plan Parcial.”

4) Mediante oficio N. 2021-DA-0029 de fecha 27 de enero de 2021, se remite informe a la subdirección de infraestructura y tránsito de la Contraloría de Cundinamarca, de las obras inconclusas resultado del contrato de obra civil N. L-2019-508, el objeto Adecuación y canalización del vallado adyacente al colegio Pablo VI del Municipio de Sopo – Cundinamarca, por un valor de \$1.083.046.048, reportada como obra inconclusa a corte de agosto de 2020. En este informe se hace total claridad que los predios en donde se ejecutaron las obras no estaban ni están en la actualidad a nombre del Municipio.

5) En la actualidad la escritura para legalización de las áreas de cesión al Municipio del conjunto cerro fuerte, la cual fue radicada ante la oficina de registro el día 22 de diciembre de 2020, fue nuevamente devuelta y sin registrarse. Estas áreas corresponden a una parte

del área que fue intervenida por el contrato de obra civil N. L-2019-508. Se anexa informe de aclaración de escritura y registro).

6) La Secretaría de Urbanismo y desarrollo territorial, mediante informe remitido por la Secretaría de Infraestructura en donde se aclaran las áreas correspondientes a la cesión de Cerro fuerte y cesión por compensación de plusvalía del predio la armenia de arriba de propiedad del señor Héctor Calderón, solicito ante la oficina de instrumentos públicos la devolución de la escritura N.1487 del 28 de diciembre de 2019 de la Notaria Única Guatavita, con radicación 2020-1908, fue devuelta sin registrar.

Teniendo en cuenta, lo anterior la secretaria de urbanismo remitió a la secretaria jurídica del Municipio, el informe correspondiente con el fin de considerar que procesos se deben derivar por el incumplimiento de lo establecido en los Decreto 080 de 2003 y 118 de 2016.

La Secretaría de Urbanismo y desarrollo territorial, mediante oficio N. SPTU-0455-2020, de fecha 19 de marzo de 2020, remitido a su despacho y al del señor Alcalde, solicitó nombrar un delegado o apoderado para que se hiciera parte del proceso 2018-0075 el cual cursa en el juzgado promiscuo municipal de Sopo, que corresponde al proceso de restitución del inmueble La Armenia de Arriba, en el cual el Municipio lleva a cabo el proceso de construcción del Colegio Pablo VI, en este proceso el demandante es el señor Claudio Bernaid Calderón Pouliot y el demandado es el señor Héctor José Alfonso Calderón Villar. Mediante Oficio N.2020-SJC-0201 del 15 de abril de 2020, se nos informa que fue asignado para estudio al Dr. Hugo Palacios quien funge como defensor externo adscrito al despacho que usted preside.

Mediante oficio SPTU-0562-2020 de fecha 28 de mayo de 2020, la secretaria de urbanismo y desarrollo territorial, le comunica que no se encontró ningún acto administrativo, ni información alguna, relacionada con la declaración a utilidad pública o interés social. Se informa en este mismo oficio que mediante certificación N. CMS-CERT-023-2020 de fecha 14 de abril de 2020, el concejo Municipal de Sopo evidencia que no existe un Acuerdo Municipal donde la corporación autorice u otorgue permiso al Alcalde Municipal de la vigencia 2016-2019, para la compra del predio denominado "La Armenia de Arriba", con matrícula catastral N. 00-00-0002-0730-000 para la construcción del Nuevo Colegio Pablo VI.

La secretaria de Infraestructura el 1 de junio de 2020 mediante oficio con radicado SIOP-0210-2020 dirigido a Daniel Alejandro Marín V. de la Oficina Asesora jurídica y de contratación y con asunto Respuesta rad. 0248 - 2020, se informa en el numeral 2:

"- En el mes de abril el Honorable concejo Municipal mediante certificación N. CMS-CERT-023-2020, certificó que una vez revisados los archivos en el Concejo Municipal de Sopo, se evidencia que NO existe un Acuerdo Municipal donde la corporación autorice u otorgue permiso al Alcalde Municipal de la vigencia 2016- 2019, para la compra del predio denominado "La Armenia de Arriba", con matrícula catastral N. 00-00-0002-0730-000 para la construcción del Nuevo Colegio Pablo VI; y en los archivos documentales referentes al diseños y construcción de esta infraestructura NO reposa documentación concerniente a este aspecto."

102


La secretaria de Infraestructura dentro del proceso constructivo del Colegio implemento las siguientes medidas de mitigación.

- i. Por los problemas ocasionados por la filtración de aguas del vallado al predio del Nuevo Colegio Pablo VI del vallado y de los predios colindantes se procedió a instalar un sistema de bombeo y filtros perimetrales dentro de la institución educativa que permitan abatir el aumento del nivel freático
- ii. la sección de vallado que no fue canalizada fue recubierta con una capa de arcilla que impermeabiliza la zona del vallado expuesta al agua con lo cual se impide el ingreso del agua de vallado hacia el colegio y además se sube la cota de fondo del vallado a la de la estructura de captación construida con el contrato referido anteriormente, esta no es una obra definitiva, debe ser permanentemente limpiada la arcilla para garantizar que el agua corra y una vez se legalice la titularidad de los terrenos se deben construir las obras que arroje el diseño hidráulico.
- iii. Se construyó un tanque de almacenamiento de aguas lluvias dentro de las nuevas instalaciones del Colegio Pablo VI y su respectivo sistema de bombeo para ser usada en el riego de zonas verdes

**RECOMENDACIONES, respecto de este contrato:**

- a. Todo parece indicar que la franja de terreno prometida en cesión para compensar una plusvalía es menor a la autorizada en la resolución de plusvalía y se debe definir con claridad a que área corresponde y si el señor Héctor Calderón debería por este concepto al Municipio de Sopó.
- b. Se deben realizar las acciones urbanísticas para obtener la propiedad de la franja de terreno de cesiones de la Urbanización Cerro Fuerte, sobre la cual se construyeron parte de las obras, igual suerte se presenta con la franja de terreno cedido por el señor Héctor Calderón, en ambos casos argumentan su decisión en que no existe claridad o son contradictorias las áreas que se pretenden escriturar.
- c. Se deben realizar los trámites urbanísticos y legales para obtener la propiedad sobre las dos franjas de terreno en los cuales se invirtieron los recursos.
- d. También, se debe realizar estudio hidráulico que analice las zonas aferentes al vallado y a la tubería instalada para determinar su funcionabilidad y las alternativas que solucionan las problemáticas hidráulicas detectadas.
- e. Finalmente, y luego de subsanada la titularidad de las franjas de terreno, se requiere hacer el diseño de la vía y se sugiere no continuar con la canalización del cuerpo de agua y replantear el perfil vial para dejar un canal abierto y una vía con las secciones que demande el desarrollo local.
- f. Se debe verificar si la construcción de la vía es una obligación que le corresponde a los promotores del Plan parcial Pionono.


**FIRMA:**

  
\_\_\_\_\_  
**Secretario (a) de Despacho**

\_\_\_\_\_  
**Delegado empalme gobierno entrante**

\_\_\_\_\_  
**Testigo 1**

\_\_\_\_\_  
**Testigo 2**

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Octavio Baney**  
**Jefe oficina de control interno**
